CR-L1157

Segundo Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad

Préstamo: 6061/OC-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 12/11/2026

N/A PMR

Objetivo

El objetivo general de este segundo Programa es contribuir a un suministro eléctrico más confiable, eficiente y sostenible. Los objetivos específicos son: (i) restablecer la disponibilidad operativa y eficiencia de la PHVG; (ii) mejorar la confiabilidad de la red de transmisión; y (iii) incrementar la eficiencia del parque de alumbrado público gestionado por el ICE.

Ambiental y social

Categoría
B

Riesgo
Sustancial

Desempeño
Satisfactorio

Líder de Equipo BID

EDWIN ORLANDO MEJIA REYES

Equipo Unidad ejecutora

Prestatario
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD

Organismo ejecutor
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD

Hitos del proyecto

Aprobación	Efectividad	Elegibilidad
31/OCT/2025	09/APR/2026	06/OCT/2026
Primer desembolso	**Último desembolso**	**Extensión: 0 meses**
	-	09/APR/2032 (Actual)

Plazo de ejecución

Tiempo total 72 meses

Transcurrido — Pendiente

7 meses — 65 meses

09/APR/2026 — **09/APR/2032**


Vigencia legal — Plazo último desembolso vigente

Evolución

Desempeño PMR — Satisfactorio — Alerta — Problema

2025

Desembolsos y Proyecciones — Proyección original — Monto desembolsado

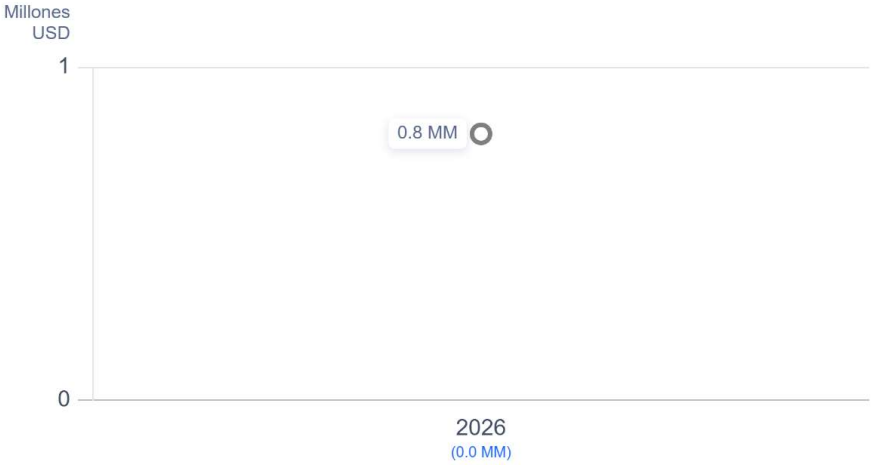

Información financiera

Saldos actuales (MM USD)

	Original	Cancelado	Ajustado	Vigente
BID	200	0	0	200
Local	0	0	115,1	115,1
Cofinanciación	0	0	0	0

Avance financiero (monto BID)

Realizado — Pendiente

0 % — **100 %**

0 USD — 200.000.000 USD

Desembolsos

Último desembolso realizado	Próximo desembolso proyectado	Mínimo a justificar para nuevo anticipo
	31/DEC/2026	0 USD

Avance por componente (monto BID) — Justificado — Pendiente

Sin información

CR-L1157

Segundo Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad

Préstamo: 6061/OC-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 12/11/2026

N/A PMR

Información financiera complementaria

Contrapartida local

Monto: 115.080.000 (USD)

Justificado	Pendiente
0 %	**100 %**
0 USD	115.080.000 USD

PARI PASSU

Desvío -63.48% = 0 USD

	BID	Local
Contractual	63.5%	36.5%
Actual	0%	0%

Desembolsos del año (MM USD)



Proyección anual **USD 800.000** Desembolsado **0% = USD 0** Pendiente: **100.00% = USD 800.000**

Anticipos

Último anticipo realizado

Monto	Fecha	Plan 0
0 USD	-	-

Justificado a la fecha (USD)

Última justificación	Fecha	Saldo de anticipo	% a justificar	Mínimo para nuevo desembolso
0	-	0	0 %	0

Habilitado

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS (EFAS)

Último presentado

Año de vencimiento	Firma Auditora	Vencimiento
-	-	-

Estado	Fecha de presentación	Dictamen
-	-	-

Próximo a presentar

Año de vencimiento	Firma Auditora	Vencimiento
2027	-	30/ABR/2027

Estado

Obligatorio

CR-L1157

Segundo Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad

Préstamo: 6061/OC-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 12/11/2026

N/A PMR

Acuerdos vigentes (0)

Sin información

No hay acuerdos vigentes

CR-L1157

Segundo Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad

Préstamo: 6061/OC-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 12/11/2026

N/A PMR

Riesgos

3	7	7	2
Severidad BAJO	Severidad MEDIA BAJA	Severidad MEDIA ALTA	Severidad ALTO

Alcance y planificación

- Si el proceso de contratación anticipada de transformadores de potencia y reactores, llevado a cabo por el organismo ejecutor, resulta en la adjudicación a un proveedor de un país no elegible conforme a las políticas del Banco, será necesario identificar otros equipos a financiar y lanzar un nuevo proceso de adquisición conforme las políticas del Banco, lo cual podría retrasar la finalización del componente 2 en aproximadamente 12 meses.
- Si se producen disrupciones significativas en las cadenas de suministro globales, podrían surgir sobrecostos y/o retrasos en la entrega de equipos para los tres componentes del programa, lo que generaría retrasos en la ejecución superiores a 6 meses y posibles incrementos del presupuesto del programa superiores a un 15%.
- Si durante la ejecución de los contratos de obras, bienes y/o servicios, la instalación y puesta en operación de los equipos y componentes no se realiza conforme a lo planificado y/o con los criterios de calidad establecidos en el cartel, podría requerirse una extensión del plazo de desembolso del Programa superior a 12 meses.
- Si no se preparan oportunamente especificaciones técnicas robustas ni se realiza un agrupamiento adecuado de las adquisiciones, se podrían presentar licitaciones desiertas y/o con atrasos, lo que ocasionaría demoras de más de 12 meses y sobrecostos significativos.
- Si debido a un eventual incumplimiento del adjudicatario en la entrega de un bien o servicio dentro de los márgenes de calidad establecidos (contractuales o de la normativa internacional aplicable), podría ocurrir que el ICE no pueda recibir o aceptar el bien pactado, lo que generaría demoras de más de 12 meses en la ejecución del Programa.
- Si se reciben ofertas que no cumplan con los requisitos indicados en los documentos de licitación, se podrían presentar licitaciones infructuosas, lo que ocasionaría demoras de más de 12 meses y sobrecostos significativos.

Entorno Económico-Financiero

- Si se imponen restricciones fiscales o se limita la asignación de crédito presupuestario, la disponibilidad de recursos para inversión podría verse afectada, lo que ocasionaría retrasos en el plan de ejecución y renovación de los equipos superiores a 6 meses.
- Si se producen fluctuaciones significativas en el tipo de cambio y la inflación, podrían generarse aumentos considerables en los costos de mano de obra, materiales, equipos y suministros, lo que impactaría los presupuestos iniciales de las obras planificadas en más de un 25%.

Capacidad para gestionar el proyecto

- Si no se mantiene una estructura organizacional ejecutora adecuada, con roles y responsabilidades claramente definidos en el Manual Operativo del programa (MOP), la ejecución del programa podría verse afectada, lo que resultaría en retrasos en el cronograma del primer año y en la ruta crítica superiores a 6 meses.

Complejidad técnica y operativa

- Si la complejidad de las definiciones técnicas para las obras de modernización de la central Ventanas-Garita no se abordan conforme a lo programado en el cronograma de la licitación, podrían surgir retrasos en los procesos de compras y contrataciones planificadas, lo que impactaría en el cronograma de ejecución de la modernización en más de 6 meses

Diseño técnico

- Si la complejidad de las definiciones técnicas para las obras de modernización de la central Ventanas-Garita no se abordan oportunamente, podrían surgir retrasos en los procesos de compras y contrataciones planificadas, lo que impactaría en el cronograma de ejecución de la operación en más de 6 meses.

CR-L1157

Segundo Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad

Préstamo: 6061/OC-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 12/11/2026

N/A PMR

Riesgos

3	7	7	2
Severidad BAJO	Severidad MEDIA BAJA	Severidad MEDIA ALTA	Severidad ALTO

Planificación

- Si durante la ejecución de los contratos de obras, bienes y/o servicios, la instalación y puesta en operación de los equipos y componentes no se realiza de manera adecuada y oportuna, podría requerirse una extensión del plazo de desembolso del Programa superior a 12 meses.
- Si los recientes aranceles causan disrupciones significativas en las cadenas de suministro globales, podrían surgir sobrecostos y/o retrasos en la entrega de equipos para los tres componentes del programa, lo que generaría retrasos en la ejecución superiores a 6 meses y posibles incrementos del presupuesto del programa superiores a un 15%.
- Si el proceso de contratación anticipada de transformadores de potencia y reactores, llevado a cabo por el organismo ejecutor, resulta en la adjudicación a un proveedor de un país no elegible conforme a las políticas del Banco, será necesario identificar otros equipos a financiar y lanzar un nuevo proceso de adquisición conforme las políticas del Banco, lo cual podría retrasar la finalización del componente 2 en aproximadamente 12 meses.
- Si no se preparan oportunamente especificaciones técnicas robustas ni se realiza un adecuado agrupamiento de las adquisiciones, se podrían producir licitaciones desiertas o con retrasos, lo que generaría demoras superiores a 12 meses y sobrecostos significativos.

Entorno macroeconómico

- Si se producen fluctuaciones significativas en el tipo de cambio y la inflación, podrían generarse variaciones considerables en los costos de mano de obra, materiales, equipos y suministros, lo que impactaría los presupuestos iniciales de las obras planificadas en más de un 15% respecto de las estimaciones originalmente establecidas
- Si se imponen restricciones fiscales o se limita la asignación de crédito presupuestario, la disponibilidad de recursos para inversión podría verse afectada, lo que ocasionaría retrasos en el plan de ejecución y renovación de los equipos superiores a 6 meses.

Estructura Organizativa

- Si no se establece una estructura organizacional ejecutora adecuada a tiempo, con roles y responsabilidades claramente definidos, la ejecución de las actividades del programa podría verse afectadas, lo que resultaría en retrasos en el cronograma del primer año y en la ruta crítica superiores a 6 meses.

CR-L1157

Segundo Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad

Préstamo: 6061/OC-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 12/11/2026

N/A PMR

Adquisiciones

Clasificación Plan de Adquisiciones

0.44

Estado Actual

Borrador

Fecha de última no objeción al plan

07/OCT/2026

Procesos con fechas expiradas

3 procesos por USD 17.480.388

% Compras realizadas

34%

Composición del plan de adquisiciones

Montos totales según estado del proceso y fuente (USD)

Monto BID Aprobado Vigente	**$ 200.000.000**
Monto del plan de adquisiciones	**$ 145.417.173,0**
Procesos contratados	**$ 7.116.359**
Contratos en ejecución	$ 7.116.359
Contratos finalizados	$ 0
Procesos pendientes	**$ 138.300.814,0**
En proceso	$ 79.611.399,0
Previsto	$ 58.689.415
Monto Aporte Local	**$ 115.080.000**
Monto del plan de adquisiciones	**$ 0**
Monto sin asignar en el plan de adquisiciones	**$ 115.080.000**
Monto Cofinanciamiento	**$ 0**

Avance de los procesos de adquisiciones por producto de la matriz de resultados

Porcentajes del costo por producto — Contratado — Pendiente — Sin asignar en el plan

	Contratado	Pendiente
Componente 1	35%	65%
Casa de máquinas modernizada.	55%	45%
Obras de captación de agua modernizadas.	95%	
Estudios técnicos de proyectos de inversión desarrollados.	100%	
Componente 2	67%	33%
Transformadores de potencia y reactores instalados.	67%	33%
Componente 3	69%	31%
Luminarias LED instaladas.	69%	31%

CR-L1157

Segundo Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad

Préstamo: 6061/OC-CR


Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 12/11/2026

N/A PMR

Supervisión

Proyectado vs finalizado

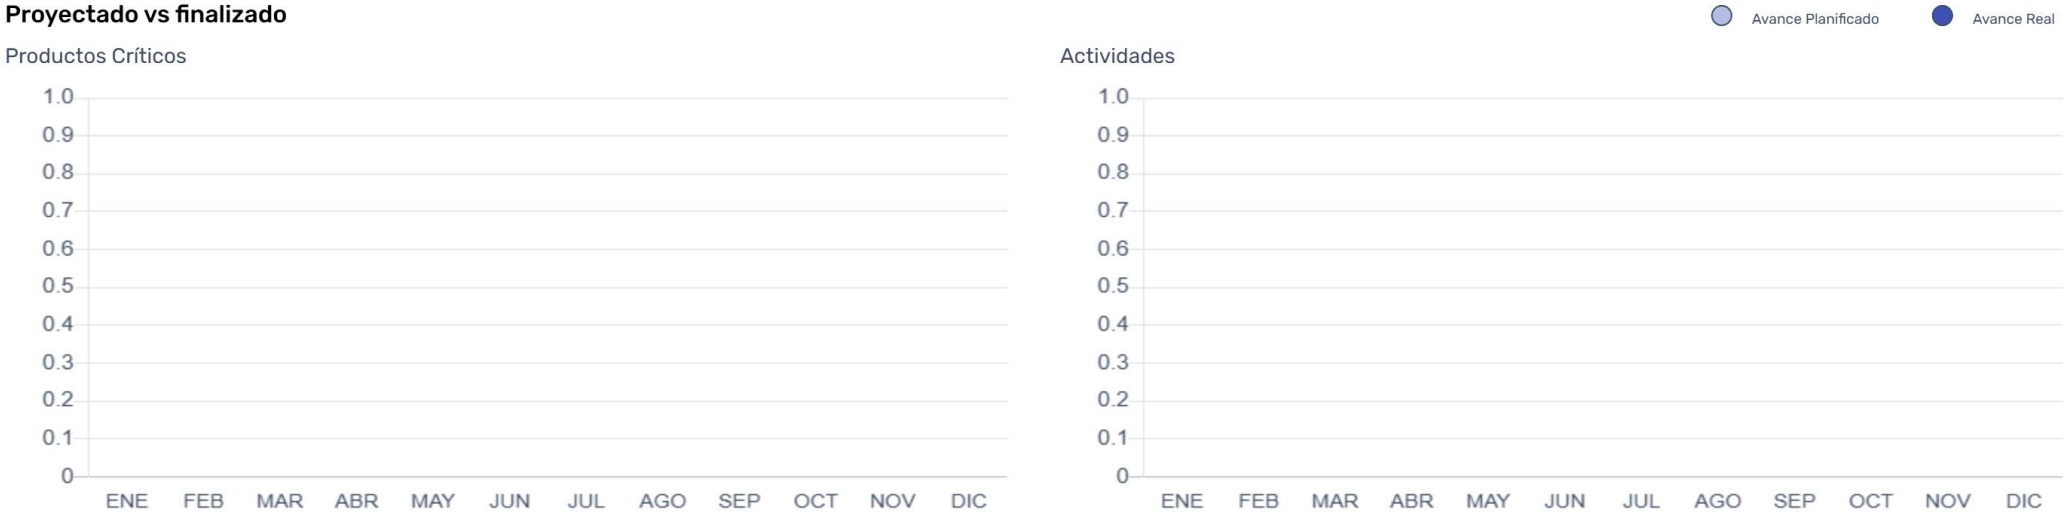

Recursos transaccionales para supervisión

