CR-L1032

Programa de Infraestructura de Transporte (PIT)

Préstamo: 3072/CH-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

2.20 PMR

Objetivo

Contribuir al desarrollo del sector transporte a través de la mejora de la infraestructura vial y portuaria, lo que beneficiará las condiciones de movilidad de las personas y los bienes, facilitando el flujo de comercio y la integración económica regional de Costa Rica.

Ambiental y social

Categoría
B

Riesgo
Alto

Desempeño
Parcialmente Satisfactorio

Líder de Equipo BID

MARIANO ANSALDO

Equipo Unidad ejecutora

Prestatario

REPUBLICA DE COSTA RICA

Organismo ejecutor

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

Hitos del proyecto

Aprobación	Efectividad	Elegibilidad
13/NOV/2013	13/NOV/2014	18/MAY/2016
Primer desembolso	**Último desembolso**	**Extensión: 0 meses**
17/DEC/2020	-	13/NOV/2026 (Actual)

Plazo de ejecución

Tiempo total 144 meses

Transcurrido — Pendiente


144 meses	0 meses
13/NOV/2014	**13/NOV/2026**
Vigencia legal	Plazo último desembolso vigente

Evolución

Desempeño PMR — Satisfactorio · Alerta · Problema

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
✓	✗	✓	✓	✓	!	!	✗	!	!	!	!

Desembolsos y Proyecciones — Proyección original · Monto desembolsado

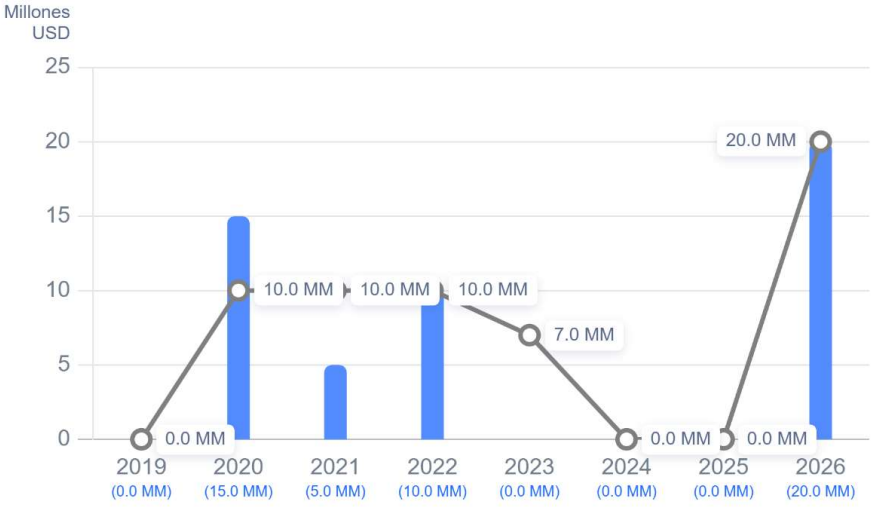

Información financiera

Saldos actuales (MM USD)

	Original	Cancelado	Ajustado	Vigente
BID	450	0	0	50
Local	0	0	0	0
Cofinanciación	0	0	0	0

Avance financiero (monto BID)

Realizado — Pendiente

100 %	**0 %**
50.000.000 USD	0 USD

Desembolsos

Último desembolso realizado	Próximo desembolso proyectado	Mínimo a justificar para nuevo anticipo
10/SEP/2026	N/A	16.069.258,9 USD

Avance por componente (monto BID) — Justificado · Pendiente

OBRAS CIVILES	$ 29.913.426,3	**$ 20.086.573,7**

CR-L1032

Programa de Infraestructura de Transporte (PIT)

Préstamo: 3072/CH-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

2.20 PMR

Información financiera complementaria

Contrapartida local

Monto: 0 (USD)

Justificado	Pendiente
0 %	**0 %**
0 USD	0 USD

PARI PASSU

Desvío 0% = 0 USD

	BID	Local
Contractual	100%	0%
Actual	100%	0%

Desembolsos del año (MM USD)



Anticipos

Último anticipo realizado

Monto	Fecha	Plan 120
20.000.000 USD	10/SEP/2026	08/ENE/2027

Justificado a la fecha (USD)

Última justificación	Fecha	Saldo de anticipo	% a justificar	Mínimo para nuevo desembolso
12.377.795,1	09/SEP/2026	20.086.573,7	80 %	16.069.258,9

No Habilitado

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS (EFAS)

Último presentado

Año de vencimiento	Firma Auditora	Vencimiento
2026	Deloitte & Touche S.A	30/ABR/2026
Estado	**Fecha de presentación**	**Dictamen**
Publicado	30/ABR/2026	Limpio

Próximo a presentar

Año de vencimiento	Firma Auditora	Vencimiento
2027	-	13/MAR/2027
Estado		
Obligatorio		

CR-L1032

Programa de Infraestructura de Transporte (PIT)

Préstamo: 3072/CH-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

2.20 PMR

Acuerdos vigentes (0)

Sin información

No hay acuerdos vigentes

CR-L1032

Programa de Infraestructura de Transporte (PIT)

Préstamo: 3072/CH-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

2.20 PMR

Riesgos

9	4	5	6
Severidad BAJO	Severidad MEDIA BAJA	Severidad MEDIA ALTA	Severidad ALTO

Entorno Económico-Financiero

- Baja capacidad de ejecución de las empresas constructoras puede generar atrasos en la ejecución de las obras, lo que reduce la ejecucion financiera anual del programa en mas de un 20%
- Baja capacidad financiera de las empresas constructoras puede generar atrasos en la ejecución de las obras, lo que reduce la ejecucion financiera anual del programa en mas de un 20%
- Atrasos en la ejecución de las inversiones en el sector portuario de CR atrasa el logro de objetivos específicos del sector en mas de 12 meses
- Inestabilidad macroeconómica derivada de la situación fiscal deficitaria y el aumento de la deuda del gobierno genera restricciones presupuestales que reducen los montos a desembolsar en al menos 20%
- Actos fraudulentos o corruptos generan atrasos sobre las obras, atrasando su entrega en mas de 12 meses
- Si se reciben ofertas económicas que superen en más del 20% el valor de referencia, podría ocurrir un recorte en el alcance de los productos, afectando al cumplimiento de los objetivos de desarrollo
- Si no se priorizan oportunamente el uso de los recursos remanentes y no se devengan antes de la fecha de último desembolso, entonces parte de los fondos del Programa podrían quedar sin ejecutar, lo que podría obligar a cancelar recursos y reducir la eficiencia financiera de la operación

Alcance y planificación

- Si se presentan atrasos en la ejecución de la RN-35 y no se logran alinear la ejecución financiera con el plazo del Programa , entonces podría requerirse una extensión de plazo superior a 6 meses, o en su defecto, producirse la cancelación de recursos no ejecutados, lo que podría afectar la eficiencia financiera y el logro de resultados del Programa.

Capacidad para operar y mantener los productos del proyecto

- Si no se aseguran mecanismos de mantenimiento y sostenibilidad de la inversión una vez cerrada la operación, entonces la sostenibilidad de los resultados del Programa podría verse comprometida, lo que podría generar un incumplimiento de las cláusulas contractuales asociadas a mantenimiento y afectar la permanencia de los beneficios logrados.

Complejidad técnica y operativa

- Si la gestión socioambiental de las intervenciones pendientes no se implementa de manera oportuna y adecuada, entonces podrían surgir reclamaciones, oposición comunitaria o nuevas obligaciones correctivas, lo que podría retrasar el cierre técnico y financiero del Programa.

Diseño técnico

- Si no se define e implementa una estrategia para la medición de los resultados del tramo Barranca-Limonal y La Angostura entonces no se contará con evidencia suficiente para evaluar su contribución a los indicadores del Programa, lo que podría afectar la demostración del logro de los objetivos de desarrollo

Diseño Técnico

- Si no se define e implementa una estrategia para la medición de los resultados del tramo Barranca-Limonal y La Angostura entonces no se contará con evidencia suficiente para evaluar su contribución a los indicadores del Programa, lo que podría afectar la demostración del logro de los objetivos de desarrollo

CR-L1032

Programa de Infraestructura de Transporte (PIT)

Préstamo: 3072/CH-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

2.20 PMR

Riesgos

9	4	5	6
Severidad BAJO	Severidad MEDIA BAJA	Severidad MEDIA ALTA	Severidad ALTO

Entorno Político

- Modificación del plan de inversiones del programa posterior a la aprobación legislativa reduce el impacto de la operación y afecta el logro de los objetivos
- Si el Gobierno de Costa Rica no logra cumplir con las condiciones previas para la utilización de los recursos de cofinanciamiento, podría ocurrir un retraso en la orden de inicio, afectando el cronograma y el cumplimiento de metas.
- Si el OE no inicia oportunamente las obras en el Tramo Barranca-Limonal y La Angostura con recursos de contrapartida, entonces el producto no estará concluido al momento del cierre del Programa, lo que podría impedir demostrar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo planteados.

Entorno Institucional

- Si no se aseguran mecanismos de mantenimiento y sostenibilidad de la inversión una vez cerrada la operación, entonces la sostenibilidad de los resultados del Programa podría verse comprometida, lo que podría generar un incumplimiento de las cláusulas contractuales asociadas a mantenimiento y afectar la permanencia de los beneficios logrados.
- Limitada capacidad de gestión pública y cambios o rotación del personal por razones subjetivas generan atrasos en entrega de las obras de al menos 12 meses

Entorno Legal

- Los atrasos en la liberacion del derecho de via genera incremento en el costo de las obras viales de al menos 20%
- Los atrasos en la liberacion del derecho de via genera atrasos de las obras viales reduciendo la ejecucion financiera anual del programa en mas de un 20%

Salvaguardias Ambientales y Sociales

- Si la gestión socioambiental de las intervenciones pendientes no se implementa de manera oportuna y adecuada, entonces podrían surgir reclamaciones, oposición comunitaria o nuevas obligaciones correctivas, lo que podría retrasar el cierre técnico y financiero del Programa.
- Gestión socioambiental inadecuada, genera impactos y externalidades negativas a los beneficiarios, afectando el logro de los objetivos del programa

Estabilidad política

- Si el OE no inicia oportunamente las obras en el Tramo Barranca-Limonal y La Angostura con recursos de contrapartida, entonces el producto no estará concluido al momento del cierre del Programa, lo que podría impedir demostrar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo planteados.

Estado de derecho

- Si no se aseguran mecanismos de mantenimiento y sostenibilidad de la inversión una vez cerrada la operación, entonces la sostenibilidad de los resultados del Programa podría verse comprometida, lo que podría generar un incumplimiento de las cláusulas contractuales asociadas a mantenimiento y afectar la permanencia de los beneficios logrados.

Planificación

- Si se presentan atrasos en la ejecución de la RN-35 y no se logran alinear la ejecución financiera con el plazo del Programa , entonces podría requerirse una extensión de plazo superior a 6 meses, o en su defecto, producirse la cancelación de recursos no ejecutados, lo que podría afectar la eficiencia financiera y el logro de resultados del Programa.

CR-L1032

Programa de Infraestructura de Transporte (PIT)

Préstamo: 3072/CH-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

2.20 PMR

Adquisiciones

Clasificación Plan de Adquisiciones

0

Estado Actual

-

Fecha de última no objeción al plan

-

Procesos con fechas expiradas

0 procesos por USD 0

% Compras realizadas

0%

Composición del plan de adquisiciones

Montos totales según estado del proceso y fuente (USD)

Monto BID Aprobado Vigente	**$ 0**
Monto del plan de adquisiciones	**$ 0**
Procesos contratados	**$ 0**
Contratos en ejecución	$ 0
Contratos finalizados	$ 0
Procesos pendientes	**$ 0**
En proceso	$ 0
Previsto	$ 0
Monto Aporte Local	**$ 0**
Monto del plan de adquisiciones	**$ 0**
Monto sin asignar en el plan de adquisiciones	**$ 0**
Monto Cofinanciamiento	**$ 0**

Avance de los procesos de adquisiciones por producto de la matriz de resultados

Porcentajes del costo por producto — Contratado — Pendiente — Sin asignar en el plan

Sin información por producto

El proyecto no cuenta con información de interfaz Fiduciaria.

CR-L1032

Programa de Infraestructura de Transporte (PIT)

Préstamo: 3072/CH-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

2.20 PMR

Supervisión

Proyectado vs finalizado

Avance Planificado Avance Real

Productos Críticos

Actividades

Recursos transaccionales para supervisión

Total Gastado

USD 20.129

Total Comprometido

USD 20.422

Total Disponible

USD -25.152
