CR-L1139

Programa de Infraestructura Vial y promoción de Asociaciones Público-Privadas (APP)

Préstamo: 4864/OC-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

2.85 PMR

Objetivo

Contribuir a la competitividad del país mediante la mejora y ampliación ambientalmente sostenible de la Red Vial de Alta Capacidad (RVAC) en el GAM, y apoyar el desarrollo de proyectos de infraestructura vial a través de modelos de Asociaciones Público-Privadas (APP) como mecanismo complementario para su financiamiento y gestión. Los objetivos específicos son: (i) disminuir los costos de operación vehicular del flujo de transporte de carga que circula por la RVAC en el GAM; (ii) disminuir tiempos de viaje de los vehículos que circulan por la RVAC en el GAM; (iii) minimizar...

Ambiental y social

Categoría
B

Riesgo
Alto

Desempeño
Parcialmente Insatisfactorio

Líder de Equipo BID

MARIANO ANSALDO

Equipo Unidad ejecutora

Prestatario

REPUBLICA DE COSTA RICA

Organismo ejecutor

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

Hitos del proyecto

Aprobación	Efectividad	Elegibilidad
20/SEP/2019	29/SEP/2020	17/DEC/2020
Primer desembolso	**Último desembolso**	**Extensión: 24 meses**
28/JUN/2021	-	29/SEP/2027 (Actual)

Plazo de ejecución

Tiempo total 84 meses

Transcurrido — Pendiente

74 meses
29/SEP/2020
Vigencia legal


10 meses
29/SEP/2027
Plazo último desembolso vigente

Evolución

Desempeño PMR — Satisfactorio — Alerta — Problema

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Desembolsos y Proyecciones — Proyección original — Monto desembolsado

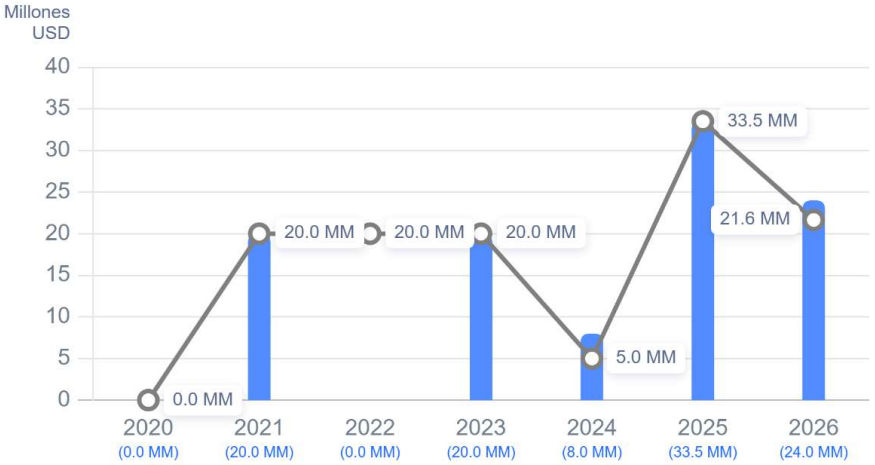

Información financiera

Saldos actuales (MM USD)

	Original	Cancelado	Ajustado	Vigente
BID	125	0	0	125
Local	53	0	0	53
Cofinanciación	0	0	0	0

Avance financiero (monto BID)

Realizado — Pendiente

84 %
105.500.000 USD

16 %
19.500.000 USD

Desembolsos

Último desembolso realizado	Próximo desembolso proyectado	Mínimo a justificar para nuevo anticipo
21/OCT/2026	31/MAR/2027	11.071.192,2 USD

Avance por componente (monto BID) — Justificado — Pendiente

	Justificado	Pendiente
Adm, Gestión y Auditoria	$ 2.217.180,8	**$ 1.562.177,5**
Infraestructura.	$ 83.774.026,3	**$ 34.186.615,4**
Desarrollo de capacidades institucionales	$ 1.056.805,9	**$ 2.203.194,1**

CR-L1139

Programa de Infraestructura Vial y promoción de Asociaciones Público-Privadas (APP)

Préstamo: 4864/OC-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

2.85 PMR

Información financiera complementaria

Contrapartida local

Monto: 53.000.000 (USD)

Justificado	Pendiente
-33 %	**133 %**
-17.647.917,2 USD	70.647.917,2 USD

PARI PASSU

Desvío 29.78% = 44.742.096,3 USD

	BID	Local
Contractual	70.2%	29.8%
Actual	100%	0%

Desembolsos del año (MM USD)



Proyección anual **USD 24.000.000** Desembolsado **100% = USD 24.000.000** Pendiente: **0.00% = USD 0**

Anticipos

Último anticipo realizado

Monto	Fecha	Plan 180
14.000.000 USD	21/OCT/2026	19/ABR/2027

Justificado a la fecha (USD)

Última justificación	Fecha	Saldo de anticipo	% a justificar	Mínimo para nuevo desembolso
4.750.710,4	20/OCT/2026	18.451.987,1	60 %	11.071.192,2

No Habilitado

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS (EFAS)

Último presentado

Año de vencimiento	Firma Auditora	Vencimiento
2026	Deloitte & Touche S.A	30/ABR/2026

Estado	Fecha de presentación	Dictamen
Publicado	30/ABR/2026	Limpio

Próximo a presentar

Año de vencimiento	Firma Auditora	Vencimiento
2027	Deloitte & Touche S.A	30/ABR/2027

Estado

Planificado

CR-L1139

Programa de Infraestructura Vial y promoción de Asociaciones Público-Privadas (APP)

Préstamo: 4864/OC-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

2.85 PMR

Acuerdos vigentes (1)

Origen del acuerdo	Tema crítico	Descripción del acuerdo	Seguimiento BID	Vencimiento	Último comentario
Revisión de Cartera	Ejecución de productos claves/Ruta crítica	El OE comunicará formalmente al MH/ DGGDP y al Banco el proyecto escogido para la estructuración del 2ndo proyecto APP antes del 31 de agosto de 2026, considerando las necesidades de recurso humano requerida para su revisión	MARIANO ANSALDO	31/AGO/2026	

CR-L1139

Programa de Infraestructura Vial y promoción de Asociaciones Público-Privadas (APP)

Préstamo: 4864/OC-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

2.85 PMR

Riesgos

4	2	5	21
Severidad BAJO	Severidad MEDIA BAJA	Severidad MEDIA ALTA	Severidad ALTO

Bienes y Servicios

- Si no se establecen adecuadamente criterios de penalización ante atrasos en los contratos, pueden presentarse atrasos en el inicio de la ejecución del contrato.
- Atrasos en el cronograma de obras debido a imprevistos o eventos compensables que pueden ocasionar atrasos en la fecha de ultimo desembolso del Programa.
- Si persisten atrasos en la adquisición de predios, particularmente en el Intercambio Naranjo, así como en la reubicación de servicios y procesos de licitación del Producto 1.02 OBIS Ruta 1, entonces puede retrasarse la formalización contractual o el inicio de obras, causando extensiones de plazo, mayores costos y afectación en la ejecución del programa.
- Si la activación del ingeniero FIDIC se da de manera tardía en los contratos, se podría presentar riesgo de demoras en la ejecución de las obras originadas por la falta de solución oportuna de conflictos.
- Si ocurren los imprevistos técnicos usuales, se presentarán atrasos durante la ejecución de obras.
- Si no se actualizan oportunamente las herramientas de gestión y monitoreo, o si existe una coordinación insuficiente entre las unidades ejecutoras responsables del programa, entonces pueden presentarse demoras en la toma de decisiones y en la ejecución de actividades críticas, causando ineficiencias y retrasos en la implementación del programa.

Alcance y planificación

- Si no se acuerda con el Banco una medición complementaria del impacto atribuible a la operación, puede mantenerse una brecha entre la matriz de resultados vigente y las obras efectivamente financiadas, causando dificultades para evidenciar el logro real de los objetivos de desarrollo.
- Si se presentan atrasos durante la ejecución del producto 1.02 IC El Coyol, debido a condiciones climáticas adversas, bajo rendimiento y/o mala planificación del contratista, demoras ocasionadas por las autoridades, y cambios en el alcance/requerimientos, entonces no se concluirá la obra dentro del plazo establecido, lo que afectará la efectividad del Programa y podría requerir una nueva extensión de plazo.
- Si persisten atrasos en la adquisición de predios, particularmente en el Intercambio Naranjo, así como en la reubicación de servicios y procesos de licitación del Producto 1.02 OBIS Ruta 1, entonces puede retrasarse la formalización contractual o el inicio de obras, causando extensiones de plazo, mayores costos y afectación en la ejecución del programa.
- Si el OE no cumple con el compromiso de ejecutar, con fuente de contrapartida y dentro del plazo de ejecución de la operación, el producto 1.02, que corresponde a las obras que dejarán de ser financiadas con recursos de la operación y pasaran a conformar el Proyecto Integral San José – San Ramón, por cambios de interés, entonces se comprometerá la efectividad a nivel de resultados y de productos.
- Si no se actualizan oportunamente las herramientas de gestión y monitoreo, o si existe una coordinación insuficiente entre las unidades ejecutoras responsables del programa, entonces pueden presentarse demoras en la toma de decisiones y en la ejecución de actividades críticas, causando ineficiencias y retrasos en la implementación del programa.

Entorno Económico-Financiero

- Si existen incumplimientos con la revisión del presupuesto base, podrían no presentarse ofertas, o las ofertas presentadas podrían exceder el presupuesto disponible.

CR-L1139

Programa de Infraestructura Vial y promoción de Asociaciones Público-Privadas (APP)

Préstamo: 4864/OC-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

2.85 PMR

Riesgos

4	2	5	21
Severidad BAJO	Severidad MEDIA BAJA	Severidad MEDIA ALTA	Severidad ALTO

Entorno Económico-Financiero

- Si no se incorp precios en el DDL de acuerdo a la políticora en la clausula de escalamiento dea de adquisiciones, podría presentarse un aumento de costos.
- Si se presentan imprevistos en la gestion financiera, se puede presentar un riesgo de retrasos en la rendición de cuentas y elaboración de los Estados Financieros del Programa, debido a la coordinación interinstitucional entre la UEP y la UAP.
- Si existen incumplimientos con la revisión del presupuesto base, existe Riesgo de recibir ofertas anormalmente bajas (ofertas ruinosas) y/o retrasos en la ejecución de las obras por problemas financieros del contratista (Contratos cuyos presupuestos no cubren los costos de la obra).

Entorno Legal

- Si existe una valoración débil de la supervisora en temas FIDIC, se pueden presentar debilidades en la defensa de los intereses de la Administración frente a los contratistas.
- Si existe una ineficiencia o debilidad en la gestión de reclamaciones, podrían presentarse resultados negativos contrarios a la administración, incluso en casos en los que podrían haberse defendido contractualmente, lo que podría generar impactos financieros no previstos o comprometer recursos del Proyecto.
- Si existe un incumplimiento en los plazos licitatorios, podrían presentarse atrasos en la formalización del contrato.

Entorno empresarial y socio-cultural

- Si surgen imprevistos en la gestión socioambiental asociados a las obras - como quejas no resueltas, falta de incumplimiento de obras de compensación, o demoras en atender solicitudes de información- entonces podrían generarse pasivos ambientales afectando la calidad de las obras, así como poniendo en riesgo el cumplimiento de las políticas y salvaguardas del Banco
- Si las acciones acordadas en los planes de atención de quejas no resuelven efectivamente los impactos reportados, puede persistir la conflictividad con comunidades y afectados, causando nuevas medidas correctivas, mayor exposición reputacional y posibles retrasos.

Entorno Social

- Si surgen imprevistos en la gestión socioambiental asociados a las obras - como quejas no resueltas, falta de incumplimiento de obras de compensación, o demoras en atender solicitudes de información- entonces podrían generarse pasivos ambientales afectando la calidad de las obras, así como poniendo en riesgo el cumplimiento de las políticas y salvaguardas del Banco
- Si las acciones acordadas en los planes de atención de quejas no resuelven efectivamente los impactos reportados, puede persistir la conflictividad con comunidades y afectados, causando nuevas medidas correctivas, mayor exposición reputacional y posibles retrasos.

Entorno Institucional

- Retrasos en la ejecución por las protestas que se presenten en los procesos de licitación, usando el régimen recursivo de la legislación nacional de Costa Rica (Objeciones al DDL y/o Apelaciones a la adjudicación, amboas presentadas ante la CGR).

CR-L1139

Programa de Infraestructura Vial y promoción de Asociaciones Público-Privadas (APP)

Préstamo: 4864/OC-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

2.85 PMR

Riesgos

4	2	5	21
Severidad BAJO	Severidad MEDIA BAJA	Severidad MEDIA ALTA	Severidad ALTO

Planificación

- Si ocurren imprevistos en materia ambiental y social se pueden dar atrasos en el inicio y cronograma de las obras por las gestiones socioambientales.
- Si no se presenta un plan de acción debido a la no intervención de la Ruta No. 1 (OBIS) se puede llegar a requerir una extensión en el plazo del préstamo, o incurrir en la cancelación de los fondos vinculados a estas obras.
- Si el OE no cumple con el compromiso de ejecutar, con fuente de contrapartida y dentro del plazo de ejecución de la operación, el producto 1.02, que corresponde a las obras que dejarán de ser financiadas con recursos de la operación y pasaran a conformar el Proyecto Integral San José – San Ramón, por cambios de interés, entonces se comprometerá la efectividad a nivel de resultados y de productos.
- Si se presentan atrasos durante la ejecución del producto 1.02 IC El Coyol, debido a condiciones climáticas adversas, bajo rendimiento y/o mala planificación del contratista, demoras ocasionadas por las autoridades, y cambios en el alcance/requerimientos, entonces no se concluirá la obra dentro del plazo establecido, lo que afectará la efectividad del Programa y podría requerir una nueva extensión de plazo.
- Si no se acuerda con el Banco una medición complementaria del impacto atribuible a la operación, puede mantenerse una brecha entre la matriz de resultados vigente y las obras efectivamente financiadas, causando dificultades para evidenciar el logro real de los objetivos de desarrollo.

Legislación y regulación

- Si existe una valoración débil de la supervisora en temas FIDIC, se pueden presentar debilidades en la defensa de los intereses de la Administración frente a los contratistas.

Mecanismo de ejecución

- Si las entidades responsables del Componente 2 no acuerdan oportunamente el alcance, incluyendo la definición del segundo proyecto APP, ni disponen del personal requerido para la ejecución de las actividades ajustadas, entonces los productos del componente no se implementarán a tiempo, causando retrasos en la ejecución y afectación en el logro de resultados institucionales.

Sistema de Gobernanza

- Si las entidades responsables del Componente 2 no acuerdan oportunamente el alcance, incluyendo la definición del segundo proyecto APP, ni disponen del personal requerido para la ejecución de las actividades ajustadas, entonces los productos del componente no se implementarán a tiempo, causando retrasos en la ejecución y afectación en el logro de resultados institucionales.

CR-L1139

Programa de Infraestructura Vial y promoción de Asociaciones Público-Privadas (APP)

Préstamo: 4864/OC-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

2.85 PMR

Adquisiciones

Clasificación Plan de Adquisiciones

1

Estado Actual

Borrador

Fecha de última no objeción al plan

02/SEP/2026

Procesos con fechas expiradas

0 procesos por USD 0

% Compras realizadas

100%

Composición del plan de adquisiciones

Montos totales según estado del proceso y fuente (USD)

Monto BID Aprobado Vigente	**$ 125.000.000**
Monto del plan de adquisiciones	**$ 93.699.901,9**
Procesos contratados	**$ 93.419.901,9**
Contratos en ejecución	$ 93.419.901,9
Contratos finalizados	$ 0
Procesos pendientes	**$ 280.000**
En proceso	$ 280.000
Previsto	$ 0
Monto Aporte Local	**$ 53.000.000**
Monto del plan de adquisiciones	**$ 2.250.000**
Monto sin asignar en el plan de adquisiciones	**$ 50.750.000**
Monto Cofinanciamiento	**$ 0**

Avance de los procesos de adquisiciones por producto de la matriz de resultados

Porcentajes del costo por producto — Contratado — Pendiente — Sin asignar en el plan

Componente 1	24%	74%
Intercambios Taras – La Lima construidos (Fuente BID).	100%	
Lote #4 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambios San Ramón, Naranjo, Grecia y El Coyol (Fuente BID y Contrapartida).	63%	37%
Estudios para la Nueva Vía San Carlos (Fuente BID)	100%	
LOTE #2 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Estaciones de peaje reconstruidas (Río Segundo - Naranjo) (Fuente Contrapartida).	20%	80%

Componente 2	6186220000%	
Diseño de Obras Urbanas Complementarias (OUC): Elaboración de tres diseños finales de: (i) parque metropolitano de Alajuela; (ii) parque lineal de Taras-La Lima; y (iii) circuito recreativo de occidente en San Ramón realizados (Fuente BID)	12372440000%	
Evaluación impacto fiscal de garantías en los dos proyectos de APPs realizado (Fuente Contrapartida)	100%	

Componente 3	100%	
Administración, gestión y auditoría (Fuente BID).	100%	

CR-L1139

Programa de Infraestructura Vial y promoción de Asociaciones Público-Privadas (APP)

Préstamo: 4864/OC-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

2.85 PMR

Supervisión

Proyectado vs finalizado

Avance Planificado Avance Real

Productos Críticos

Actividades

Recursos transaccionales para supervisión

Total Gastado

USD 27.341

Total Comprometido

USD 46.128

Total Disponible

USD -11.377
