CR-L1151

Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: conectividad resiliente

Préstamo: 5823/OC-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

2.90 PMR

Objetivo

Mejorar la competitividad de los sectores productivos agrícola y turístico de la Región Huetar Norte. El objetivo específico es mejorar las condiciones de circulación entre las zonas norte y centro del país de forma segura, sostenible y resiliente al cambio climático, incorporando en su diseño la perspectiva de género.

Ambiental y social

Categoría
A

Riesgo
Alto

Desempeño
Satisfactorio

Líder de Equipo BID

MARIANO ANSALDO

Equipo Unidad ejecutora

Prestatario

REPUBLICA DE COSTA RICA

Organismo ejecutor

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

Hitos del proyecto

Aprobación	Efectividad	Elegibilidad
15/NOV/2023	10/JAN/2024	08/JUL/2024
Primer desembolso	**Último desembolso**	**Extensión: 0 meses**
23/JUN/2025	-	10/JAN/2029 (Actual)

Plazo de ejecución

Tiempo total 60 meses

Transcurrido — Pendiente

34 meses
10/JAN/2024
Vigencia legal


26 meses
10/JAN/2029
Plazo último desembolso vigente

Evolución

Desempeño PMR — Satisfactorio — Alerta — Problema

2023 — 2024 — 2025

Desembolsos y Proyecciones — Proyección original — Monto desembolsado

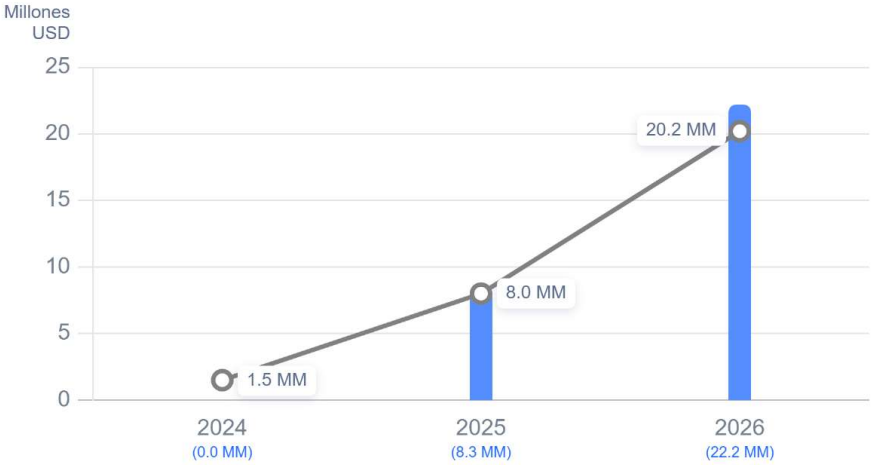

Información financiera

Saldos actuales (MM USD)

	Original	Cancelado	Ajustado	Vigente
BID	225	0	0	225
Local	0	0	0	0
Cofinanciación	110	0	0	110

Avance financiero (monto BID)

Realizado — Pendiente

14 %
30.554.567,7 USD

86 %
194.445.432,3 USD

Desembolsos

Último desembolso realizado	Próximo desembolso proyectado	Mínimo a justificar para nuevo anticipo
30/SEP/2026	30/JUN/2027	13.954.571,8 USD

Avance por componente (monto BID) — Justificado — Pendiente

Administración	$ 1.372.062,3	**$ 4.627.937,7**
Intervenciones en la RN-35	$ 11.739.290,7	**$ 207.260.709,3**

CR-L1151

Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: conectividad resiliente

Préstamo: 5823/OC-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

2.90 PMR

Información financiera complementaria

Contrapartida local

Monto: 0 (USD)

Justificado	Pendiente
0 %	**0 %**
0 USD	0 USD

PARI PASSU

Desvío -100% = 0 USD

	BID	Local
Contractual	100%	0%
Actual	0%	0%

Desembolsos del año (MM USD)



Anticipos

Último anticipo realizado

Monto	Fecha	Plan 60
17.300.000 USD	30/SEP/2026	29/NOV/2026

Justificado a la fecha (USD)

Última justificación	Fecha	Saldo de anticipo	% a justificar	Mínimo para nuevo desembolso
5.197.193,3	22/SEP/2026	17.443.214,7	80 %	13.954.571,8

No Habilitado

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS (EFAS)

Último presentado

Año de vencimiento	Firma Auditora	Vencimiento
2026	Deloitte & Touche S.A	30/ABR/2026

Estado	Fecha de presentación	Dictamen
Publicado	28/ABR/2026	Limpio

Próximo a presentar

Año de vencimiento	Firma Auditora	Vencimiento
2027	Deloitte & Touche S.A	30/ABR/2027

Estado

Planificado

CR-L1151

Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: conectividad resiliente

Préstamo: 5823/OC-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

2.90 PMR

Acuerdos vigentes (0)

Sin información

No hay acuerdos vigentes

CR-L1151

Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: conectividad resiliente

Préstamo: 5823/OC-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

2.90 PMR

Riesgos

0	3	3	14
Severidad BAJO	Severidad MEDIA BAJA	Severidad MEDIA ALTA	Severidad ALTO

Complejidad técnica y operativa

- Si, debido a la priorización de otras actividades y a una preparación insuficiente para la época lluviosa, el Contratista no implementa oportunamente el manejo temporal de aguas en excavaciones, taludes y escombreras, pueden ocurrir erosión, inestabilidad, arrastre de sedimentos o daños que causen retrasos, reprocesos, afectaciones ambientales, sobrecostos y riesgos de seguridad.
- Si la ejecución financiera no es consistente con el avance temporal, podría requerirse reprogramación del programa o extensión de plazos
- Si, debido a plazos insuficientes, investigaciones de campo incompletas y fallas en el aseguramiento de la calidad del Contratista, los entregables de diseño o los informes de calidad se presentan tarde, incompletos o con errores, puede ocurrir un ciclo prolongado de revisión y reproceso que cause atrasos en aprobaciones, construcción, relaciones valoradas y plazo contractual.

Entorno Económico-Financiero

- Si los proyectos no logran ejecutar el alcance planificado por limitaciones presupuestarias o técnicas, se ponen en riesgo los objetivos estratégicos del Programa y los compromisos establecidos en el contrato de préstamo, afectando la credibilidad institucional y la disponibilidad de financiamiento futuro
- Recibir ofertas por encima del presupuesto estimado podría invalidar los procesos para replantear los alcances de los trabajos o la adición de recursos
- Si la ejecución financiera no es consistente con el avance temporal, podría requerirse reprogramación del programa o extensión de plazos

Entorno Legal

- No contar con el derecho de vía liberado en tiempo, conforme lo establecido en el plan de acción y definición de Unidades Funcionales, podría ocasionar afectaciones en el plazo estimado de obra y/o sobrecostos por modificación de diseño y cronograma de actividades.
- Si no se gestiona a los interesados del proyecto de manera oportuna y adecuada, puede presentarse oposición al proyecto por parte de la comunidad y/o diferentes actores, lo que afectaría el desarrollo y flujo del proyecto de acuerdo con lo planificado

Entorno macroeconómico

- Si los proyectos no logran ejecutar el alcance planificado por limitaciones presupuestarias o técnicas, se ponen en riesgo los objetivos estratégicos del Programa y los compromisos establecidos en el contrato de préstamo, afectando la credibilidad institucional y la disponibilidad de financiamiento futuro
- Si la ejecución financiera no es consistente con el avance temporal, podría requerirse reprogramación del programa o extensión de plazos

Entorno empresarial y socio-cultural

- No contar con los planes y permisos ambientales vigentes y actualizados podría ocasionar una demora en el inicio de las obras, impactando negativamente en la imagen del MOPT

Entorno Político

- No contar con el compromiso formal por parte del Ministerio de Hacienda para la disposición de recursos para finalizar las obras en Barranca – Limonal – Angostura de acuerdo con el Modificatorio No. 1 a los Contratos de Préstamos Nos. 3071/OC-CR y 3072/CH-CR, impediría el uso de los fondos de la Operación CR-L-1151 asignados al contrato de obra de Punta Sur

CR-L1151

Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: conectividad resiliente

Préstamo: 5823/OC-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

2.90 PMR

Riesgos

0	3	3	14
Severidad BAJO	Severidad MEDIA BAJA	Severidad MEDIA ALTA	Severidad ALTO

Estructura Organizativa

- Si no se cuenta con la unidad de administración y gestión de los contratos FIDIC previo a la adjudicación de los contratos de obra, se demoraría el inicio de las obras y dificultaraía la implementación de los procesos internos según los contratos para la rendición de cuentas
- si se producen cuellos de botella en las adquisiciones clave por limitaciones de la UEP para elaboración/validación de documentos de licitación, evaluación de ofertas y apelaciones de oferentes, podría generarse falta de confianza, baja participación de oferentes y/o protestas a los procesos, retrasando el cronograma y el cumplimiento de metas.

Legislación y regulación

- Si no se gestiona a los interesados del proyecto de manera oportuna y adecuada, puede presentarse oposición al proyecto por parte de la comunidad y/o diferentes actores, lo que afectaría el desarrollo y flujo del proyecto de acuerdo con lo planificado
- No contar con el derecho de vía liberado en tiempo, conforme lo establecido en el plan de acción y definición de Unidades Funcionales, podría ocasionar afectaciones en el plazo estimado de obra y/o sobrecostos por modificación de diseño y cronograma de actividades.

Entorno Social

- No contar con los planes y permisos ambientales vigentes y actualizados podría ocasionar una demora en el inicio de las obras, impactando negativamente en la imagen del MOPT

Estado de derecho

- Si por la magnitud y complejidad de las obras los procesos de precalificación no son exitosos, podría haber un número bajo de empresas oferentes y que firmas cuestionadas (no sancionadas) participen en los procesos, impactando en el cronograma, las metas y/o la calidad de productos del programa.

Integridad

- Si por la magnitud y complejidad de las obras los procesos de precalificación no son exitosos, podría haber un número bajo de empresas oferentes y que firmas cuestionadas (no sancionadas) participen en los procesos, impactando en el cronograma, las metas y/o la calidad de productos del programa.

Recursos Humanos

- Si no se implementa en tiempo y en forma un sistema digital para la gestión documental y procesal del Programa, las actividades, procesos, procedimientos y rendición de cuentas se dificultaría la ejecución de los mismos y se extenderían los plazos

CR-L1151

Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: conectividad resiliente

Préstamo: 5823/OC-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

2.90 PMR

Adquisiciones

Clasificación Plan de Adquisiciones

0.95

Estado Actual

Borrador

Fecha de última no objeción al plan

13/OCT/2026

Procesos con fechas expiradas

3 procesos por USD 102.000

% Compras realizadas

85%


Composición del plan de adquisiciones

Montos totales según estado del proceso y fuente (USD)

Monto BID Aprobado Vigente	**$ 225.000.000**
Monto del plan de adquisiciones	**$ 72.059.528,9**
Procesos contratados	**$ 71.213.848,9**
Contratos en ejecución	$ 70.447.048,9
Contratos finalizados	$ 766.800
Procesos pendientes	**$ 845.680**
En proceso	$ 0
Previsto	$ 845.680
Monto Aporte Local	**$ 0**
Monto del plan de adquisiciones	**$ 0**
Monto sin asignar en el plan de adquisiciones	**$ 0**
Monto Cofinanciamiento	**$ 0**

Avance de los procesos de adquisiciones por producto de la matriz de resultados

Porcentajes del costo por producto — Contratado — Pendiente — Sin asignar en el plan

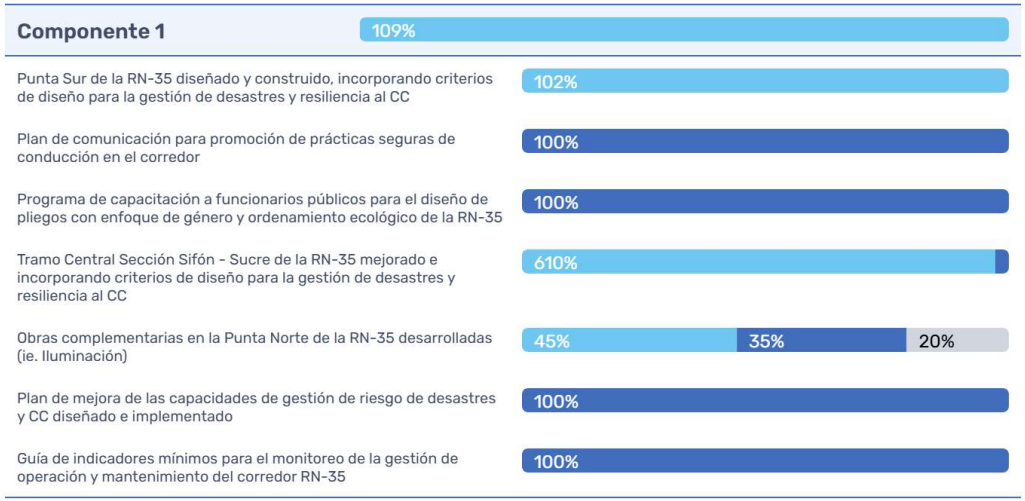



CR-L1151

Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana: conectividad resiliente

Préstamo: 5823/OC-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

2.90 PMR

Supervisión

Proyectado vs finalizado

Avance Planificado Avance Real

Productos Críticos

Actividades

Recursos transaccionales para supervisión

Total Gastado

USD 12.368

Total Comprometido

USD 51.422

Total Disponible

USD -8.780
