CR-L1157

# Segundo Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad

**Préstamo: 6061/OC-CR**

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

**N/A PMR**

## Objetivo

El objetivo general de este segundo Programa es contribuir a un suministro eléctrico más confiable, eficiente y sostenible. Los objetivos específicos son: (i) restablecer la disponibilidad operativa y eficiencia de la PHVG; (ii) mejorar la confiabilidad de la red de transmisión; y (iii) incrementar la eficiencia del parque de alumbrado público gestionado por el ICE.

## Ambiental y social

**Categoría**
B

**Riesgo**
Sustancial

**Desempeño**
Satisfactorio

## Líder de Equipo BID

EDWIN ORLANDO MEJIA REYES

## Equipo Unidad ejecutora

**Prestatario**
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD

**Organismo ejecutor**
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD

## Hitos del proyecto

| Aprobación | Efectividad | Elegibilidad |
|---|---|---|
| 31/OCT/2025 | 09/APR/2026 | 06/OCT/2026 |
| **Primer desembolso** | **Último desembolso** | **Extensión: 0 meses** |
| | - | 09/APR/2032 (Actual) |

## Plazo de ejecución

Tiempo total 72 meses

Transcurrido — Pendiente

7 meses — 65 meses

**09/APR/2026** — **09/APR/2032**


Vigencia legal — Plazo último desembolso vigente

## Evolución

Desempeño PMR — Satisfactorio — Alerta — Problema

2025

Desembolsos y Proyecciones — Proyección original — Monto desembolsado

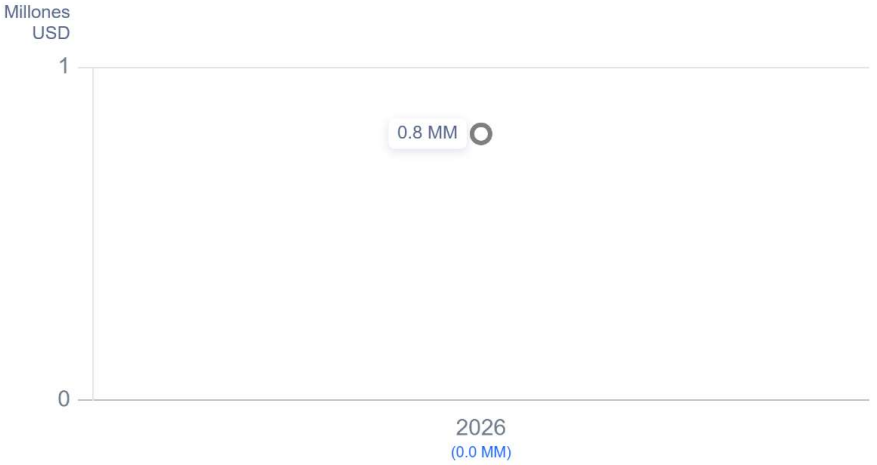


## Información financiera

Saldos actuales (MM USD)

| | Original | Cancelado | Ajustado | Vigente |
|---|---|---|---|---|
| **BID** | 200 | 0 | 0 | 200 |
| **Local** | 0 | 0 | 115,1 | 115,1 |
| **Cofinanciación** | 0 | 0 | 0 | 0 |

Avance financiero (monto BID)

Realizado — Pendiente

**0 %** — **100 %**

0 USD — 200.000.000 USD

Desembolsos

| Último desembolso realizado | Próximo desembolso proyectado | Mínimo a justificar para nuevo anticipo |
|---|---|---|
| | 31/DEC/2026 | 0 USD |

Avance por componente (monto BID) — Justificado — Pendiente

**Sin información**

CR-L1157

# Segundo Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad

**Préstamo: 6061/OC-CR**

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

**N/A PMR**

## Información financiera complementaria

### Contrapartida local

Monto: 115.080.000 (USD)

| Justificado | Pendiente |
|---|---|
| **0 %** | **100 %** |
| 0 USD | 115.080.000 USD |

### PARI PASSU

Desvío -63.48% = 0 USD

| | BID | Local |
|---|---|---|
| **Contractual** | 63.5% | 36.5% |
| **Actual** | 0% | 0% |

### Desembolsos del año (MM USD)




Proyección anual **USD 800.000** Desembolsado **0% = USD 0** Pendiente: **100.00% = USD 800.000**

### Anticipos

Último anticipo realizado

| Monto | Fecha | Plan 0 |
|---|---|---|
| 0 USD | - | - |

Justificado a la fecha (USD)

| Última justificación | Fecha | Saldo de anticipo | % a justificar | Mínimo para nuevo desembolso |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 0 % | 0 |

Habilitado

### ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS (EFAS)

Último presentado

| Año de vencimiento | Firma Auditora | Vencimiento |
|---|---|---|
| - | - | - |

| Estado | Fecha de presentación | Dictamen |
|---|---|---|
| - | - | - |

Próximo a presentar

| Año de vencimiento | Firma Auditora | Vencimiento |
|---|---|---|
| 2027 | - | 30/ABR/2027 |

Estado

Obligatorio

CR-L1157

# Segundo Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad

**Préstamo: 6061/OC-CR**

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

**N/A PMR**

## Acuerdos vigentes (0)

**Sin información**

No hay acuerdos vigentes

CR-L1157

# Segundo Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad

**Préstamo: 6061/OC-CR**

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

**N/A PMR**

## Riesgos

| 3 | 7 | 7 | 2 |
|---|---|---|---|
| Severidad BAJO | Severidad MEDIA BAJA | Severidad MEDIA ALTA | Severidad ALTO |

### Alcance y planificación

- Si el proceso de contratación anticipada de transformadores de potencia y reactores, llevado a cabo por el organismo ejecutor, resulta en la adjudicación a un proveedor de un país no elegible conforme a las políticas del Banco, será necesario identificar otros equipos a financiar y lanzar un nuevo proceso de adquisición conforme las políticas del Banco, lo cual podría retrasar la finalización del componente 2 en aproximadamente 12 meses.
- Si se producen disrupciones significativas en las cadenas de suministro globales, podrían surgir sobrecostos y/o retrasos en la entrega de equipos para los tres componentes del programa, lo que generaría retrasos en la ejecución superiores a 6 meses y posibles incrementos del presupuesto del programa superiores a un 15%.
- Si durante la ejecución de los contratos de obras, bienes y/o servicios, la instalación y puesta en operación de los equipos y componentes no se realiza conforme a lo planificado y/o con los criterios de calidad establecidos en el cartel, podría requerirse una extensión del plazo de desembolso del Programa superior a 12 meses.
- Si no se preparan oportunamente especificaciones técnicas robustas ni se realiza un agrupamiento adecuado de las adquisiciones, se podrían presentar licitaciones desiertas y/o con atrasos, lo que ocasionaría demoras de más de 12 meses y sobrecostos significativos.
- Si debido a un eventual incumplimiento del adjudicatario en la entrega de un bien o servicio dentro de los márgenes de calidad establecidos (contractuales o de la normativa internacional aplicable), podría ocurrir que el ICE no pueda recibir o aceptar el bien pactado, lo que generaría demoras de más de 12 meses en la ejecución del Programa.
- Si se reciben ofertas que no cumplan con los requisitos indicados en los documentos de licitación, se podrían presentar licitaciones infructuosas, lo que ocasionaría demoras de más de 12 meses y sobrecostos significativos.

### Entorno Económico-Financiero

- Si se imponen restricciones fiscales o se limita la asignación de crédito presupuestario, la disponibilidad de recursos para inversión podría verse afectada, lo que ocasionaría retrasos en el plan de ejecución y renovación de los equipos superiores a 6 meses.
- Si se producen fluctuaciones significativas en el tipo de cambio y la inflación, podrían generarse aumentos considerables en los costos de mano de obra, materiales, equipos y suministros, lo que impactaría los presupuestos iniciales de las obras planificadas en más de un 25%.

### Capacidad para gestionar el proyecto

- Si no se mantiene una estructura organizacional ejecutora adecuada, con roles y responsabilidades claramente definidos en el Manual Operativo del programa (MOP), la ejecución del programa podría verse afectada, lo que resultaría en retrasos en el cronograma del primer año y en la ruta crítica superiores a 6 meses.

### Complejidad técnica y operativa

- Si la complejidad de las definiciones técnicas para las obras de modernización de la central Ventanas-Garita no se abordan conforme a lo programado en el cronograma de la licitación, podrían surgir retrasos en los procesos de compras y contrataciones planificadas, lo que impactaría en el cronograma de ejecución de la modernización en más de 6 meses

### Diseño técnico

- Si la complejidad de las definiciones técnicas para las obras de modernización de la central Ventanas-Garita no se abordan oportunamente, podrían surgir retrasos en los procesos de compras y contrataciones planificadas, lo que impactaría en el cronograma de ejecución de la operación en más de 6 meses.

CR-L1157

# Segundo Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad

**Préstamo: 6061/OC-CR**

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

**N/A PMR**

## Riesgos

| 3 | 7 | 7 | 2 |
|---|---|---|---|
| Severidad BAJO | Severidad MEDIA BAJA | Severidad MEDIA ALTA | Severidad ALTO |

### Planificación

- Si durante la ejecución de los contratos de obras, bienes y/o servicios, la instalación y puesta en operación de los equipos y componentes no se realiza de manera adecuada y oportuna, podría requerirse una extensión del plazo de desembolso del Programa superior a 12 meses.
- Si los recientes aranceles causan disrupciones significativas en las cadenas de suministro globales, podrían surgir sobrecostos y/o retrasos en la entrega de equipos para los tres componentes del programa, lo que generaría retrasos en la ejecución superiores a 6 meses y posibles incrementos del presupuesto del programa superiores a un 15%.
- Si el proceso de contratación anticipada de transformadores de potencia y reactores, llevado a cabo por el organismo ejecutor, resulta en la adjudicación a un proveedor de un país no elegible conforme a las políticas del Banco, será necesario identificar otros equipos a financiar y lanzar un nuevo proceso de adquisición conforme las políticas del Banco, lo cual podría retrasar la finalización del componente 2 en aproximadamente 12 meses.
- Si no se preparan oportunamente especificaciones técnicas robustas ni se realiza un adecuado agrupamiento de las adquisiciones, se podrían producir licitaciones desiertas o con retrasos, lo que generaría demoras superiores a 12 meses y sobrecostos significativos.

### Entorno macroeconómico

- Si se producen fluctuaciones significativas en el tipo de cambio y la inflación, podrían generarse variaciones considerables en los costos de mano de obra, materiales, equipos y suministros, lo que impactaría los presupuestos iniciales de las obras planificadas en más de un 15% respecto de las estimaciones originalmente establecidas
- Si se imponen restricciones fiscales o se limita la asignación de crédito presupuestario, la disponibilidad de recursos para inversión podría verse afectada, lo que ocasionaría retrasos en el plan de ejecución y renovación de los equipos superiores a 6 meses.

### Estructura Organizativa

- Si no se establece una estructura organizacional ejecutora adecuada a tiempo, con roles y responsabilidades claramente definidos, la ejecución de las actividades del programa podría verse afectadas, lo que resultaría en retrasos en el cronograma del primer año y en la ruta crítica superiores a 6 meses.

CR-L1157

# Segundo Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad

**Préstamo: 6061/OC-CR**

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

**N/A PMR**

## Adquisiciones

### Clasificación Plan de Adquisiciones

**0.41**

**Estado Actual**

Aprobado

**Fecha de última no objeción al plan**

07/OCT/2026

**Procesos con fechas expiradas**

4 procesos por USD 22.202.212

**% Compras realizadas**

25%

### Composición del plan de adquisiciones

Montos totales según estado del proceso y fuente (USD)

| | |
|---|---|
| **Monto BID Aprobado Vigente** | **$ 200.000.000** |
| Monto del plan de adquisiciones | **$ 145.417.173,0** |
| Procesos contratados | **$ 2.394.535** |
| Contratos en ejecución | $ 2.394.535 |
| Contratos finalizados | $ 0 |
| Procesos pendientes | **$ 143.022.638,0** |
| En proceso | $ 79.611.399,0 |
| Previsto | $ 63.411.239 |
| **Monto Aporte Local** | **$ 115.080.000** |
| Monto del plan de adquisiciones | **$ 0** |
| Monto sin asignar en el plan de adquisiciones | **$ 115.080.000** |
| **Monto Cofinanciamiento** | **$ 0** |

### Avance de los procesos de adquisiciones por producto de la matriz de resultados

Porcentajes del costo por producto — Contratado — Pendiente — Sin asignar en el plan

| | Contratado | Pendiente |
|---|---|---|
| **Componente 1** | 35% | 65% |
| Casa de máquinas modernizada. | 55% | 45% |
| Obras de captación de agua modernizadas. | 95% | |
| Estudios técnicos de proyectos de inversión desarrollados. | 100% | |
| **Componente 2** | 74% | 26% |
| Transformadores de potencia y reactores instalados. | 74% | 26% |
| **Componente 3** | 69% | 31% |
| Luminarias LED instaladas. | 69% | 31% |

CR-L1157

# Segundo Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad

**Préstamo: 6061/OC-CR**

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

**N/A PMR**

## Supervisión

### Proyectado vs finalizado

Avance Planificado  Avance Real

Productos Críticos




Actividades




### Recursos transaccionales para supervisión

Total Gastado
USD 11.981

Total Comprometido
USD 48.182

Total Disponible
USD -11.703

