PMR Operational Report

Operation Number	CR-L1139	**Chief of Operations Validation Date**	
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2026	**Division Chief Validation Date**	
Last Update	10/05/26	**Country Representative Validation Date**	
PMR Validation Stage	Completed by Team Leader		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Road Infrastructure Program and promotion of Public-Private Partnerships (PPP)	**Loan Number**	4864/OC-CR
Executing Agency	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE	**Sector/Subsector**	TRANSPORT-MAJOR HIGHWAYS
Team Leader	ANSALDO, MARIANO PEDRO	**Overall Stage**	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	**Country**	Costa Rica
Lending Instrument	Investment Loan	**PMR required**	YES
Borrower	REPUBLICA DE COSTA RICA	**Convergence related Operation(s)**	

Events Data

Supervision	
Signature	03/18/20
Ratification	
Legal Effectiveness	09/29/20
Total Eligibility	12/17/20
Partial Eligibility	12/17/20
First Disbursement	06/28/21
Original Disbursement Expiration	09/29/25
Current Disbursement Expiration	09/29/27

Preparation

On pipeline	11/09/18
Start date	03/11/19
PP Approved	06/20/19
PCR Approved	08/22/19
ERM	03/25/19
DLP Approved by OPC	08/30/19
Negotiation	09/03/19
Operation Approved	09/20/19

Objective

To contribute to the country's competitiveness through the environmentally sustainable improvement of the High-capacity Road Network (RVAC) in the GMA and to support the development of road infrastructure projects through public-private partnerships (PPPs) as an additional mechanism for their financing and management. The specific objectives are to: (i) lower vehicle operating costs for the flow of freight transportation on the RVAC in the GMA; (ii) shorten travel times for vehicles on the RVAC in the GMA; (iii) minimize emissions generated by transportation in the GMA; and (iv) improve the technical and institutional capacity of the Government of Costa Rica to develop road projects via PPP mechanisms

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B
Risk	High
Safeguard Performance Rating	Partially Unsatisfactory
Safeguard Performance Rating - Rationale	La clasificación se mantiene en parcialmente insatisfactoria, pese a que el OE durante esta misión ha cumplido con acciones como: (i) Presentación del Plan de Reasentamiento de ruta 2. (ii) Presentación de actualización de 2 de los PGAS de Ruta 1 (3 intercambios), se mantiene un retraso en la implementación de acciones contenidas en los planes de acción acordados con los reclamantes para la gestión de 2 quejas gestionadas desde el protocolo y la presentación de la actualización del PGAS de Coyol.

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval	

	Total Cost and Source					Available Funds (US$)			
Operations	**Original IDB**	**Current IDB**	**Local Counterpart**	**Co-Financing / Country**	**Total Original Cost**	**Current IDB**	**Disb. Amount to Date**	**% Disbursed**	**Undisbursed Amount**
CR-L1139	125,000,000	125,000,000	53,000,000	0	178,000,000	125,000,000	91,500,000	73.20%	33,500,000
Aggregated	**125,000,000**	**125,000,000**	**53,000,000**	**0**	**178,000,000**	**125,000,000**	**91,500,000**	**73.20%**	**33,500,000**

Development Effectiveness Matrix


Economic Analysis

Undefined	No
Cost benefit analysis	Yes
Cost effectiveness analysis	No
General economic analysis (Economic rate of return)	No

Evaluation

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Undefined	Yes
Random assignment	No
Non-experimental method	No
Ex-post cost benefit analysis	No
Ex-post cost effectiveness analysis	No
Before/after or With/without comparison	No

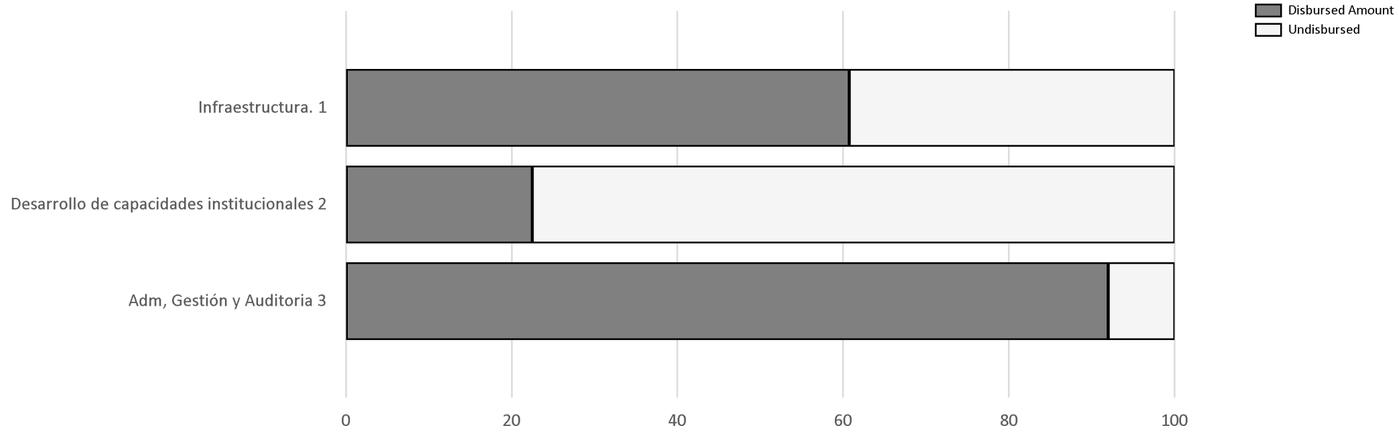

Printed on: October 14, 2026 4:57:00 PM

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Mejora de la competitividad del país.

Observation: El Índice de Conectividad Vial, ha sido incorporado en el Informe de Competitividad Global a partir del año 2018, y se prevé que será medido y registrado en los informes de los años subsiguientes. Su escala varía entre 0 y 100 (excelente) y mide la velocidad promedio y la rectitud de en la infraestructura vial a través de dos elementos: (i) medida de la velocidad de itinerarios de conducción que conectan las diez o más ciudades más grandes que representan al menos el 15% del ingreso económico de la población total; y (ii) medida de rectitud de las carreteras, por medio de la relación de la suma de las distancias de conducción entre las ciudades separadas a más de 20 km entre sí, y la distancia medida en línea recta entre ambos puntos. Para la determinación de estos componentes se utilizan las API de Google Directions y Open Street Map.

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		EOP 2027
1.0	Índice de Conectividad Vial	Puntuación	42.3	2018	2025	P	44
						A	-

Details

Means of Verification: Valor registrado en el componente 2.01 Road connectivity del Pilar de Infraestructura del Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial.

Observations: Se establecen porcentajes de reducción de tiempo de 5,5% y 24,5% en los respectivos tramos; porcentajes que, al ponderarlos por su longitud, se establece que se estaría ahorrando un 6,1% del tiempo de recorrido. Dado que los tramos viales son trascendentales en la circulación del GAM, se considera que la mejora en su capacidad impactará significativamente a la mejora en la conectividad; por lo que se proyecta que el índice de conectividad vial mejorará conservadoramente en un 4%.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): Yes

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: DISMINUIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR DEL FLUJO DE TRANSPORTE DE CARGA QUE CIRCULA POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2025	EOP 2027
0.0	Costos de operación vehicular ponderado en los sitios de las OBIS en el tramo San José – San Ramón.	US$ millones	39.07	2020	P	34.76	34.76
					A	-	-

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito en el corredor vial, intersecciones e intercambios. Estudio de costos de operación mediante la modelación de los flujos de tránsito. Ver POD EEO#1, páginas 30-31, y 83-84 respectivamente. En el primer indicador considera solo las OBIS calculadas.

Observations: Los valores de línea base de base y meta fueron establecidos a partir de los resultados obtenidos en el Análisis Económico del Proyecto (EEO#1). El procedimiento de cálculo utilizado se incluye en el Plan de Monitoreo y Evaluación (EER#2).

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	Indigenous people-related	No	Afrodescendats-related	No	Persons with disabilities-related	No	LGBTQ+ individuals-related	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2025	EOP 2027
0.1	Costos de operación vehicular ponderado del transporte en el tramo Taras – La Lima.	US$ millones	24.05	2020	P	11.93	11.93
					A	-	-

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito en el corredor vial, intersecciones e intercambios. Estudio de costos de operación mediante la modelación de los flujos de tránsito. En el primer indicador considera solo las OBIS analizadas en la Evaluación Económica del Proyecto. Estudios a realizarse por consultores.

Observations: Los valores de línea base de base y meta fueron establecidos a partir de los resultados obtenidos en el Análisis Económico del Proyecto (EEO#1). El procedimiento de cálculo utilizado se incluye en el Plan de Monitoreo y Evaluación (EER#2).

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	Indigenous people-related	No	Afrodescendats-related	No	Persons with disabilities-related	No	LGBTQ+ individuals-related	No
IF Contribution									

Specific Development Objectives Nbr. 1: DISMINUIR LOS TIEMPOS DE VIAJE DE LOS VEHÍCULOS QUE CIRCULAN POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2025	EOP 2027
1.0	Tiempo de viaje promedio de los vehículos que circulan por el tramo San José - San Ramón en la hora de mayor congestión	Minutos	75.6	2020	P	56.1	56.1
					A	-	-

Details

Means of Verification: Pronósticos de tiempos de recorrido en los diferentes tramos que conforman los corredores viales; determinados a partir de consultas en la plataforma Google Cloud.

Observations: Los valores de línea base de base y meta fueron establecidos a partir de los resultados obtenidos en el Análisis Económico del Proyecto (EEO#1). El procedimiento de cálculo utilizado se incluye en el Plan de Monitoreo y Evaluación (EER#2).

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	Indigenous people-related	No	Afrodescendats-related	No	Persons with disabilities-related	No	LGBTQ+ individuals-related	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2025	EOP 2027
1.1	Tiempo de viaje promedio de los vehículos circulan por el tramo Taras – La Lima en la hora de mayor congestión	Minutos	10.8	2020	P	4.9	4.9
					A	-	-

Details

Means of Verification: Pronósticos de tiempos de recorrido en los diferentes tramos que conforman los corredores viales; determinados a partir de consultas en la plataforma Google Cloud.

Observations: Los valores de línea base de base y meta fueron establecidos a partir de los resultados obtenidos en el Análisis Económico del Proyecto (EEO#1). El procedimiento de cálculo utilizado se incluye en el Plan de Monitoreo y Evaluación (EER#2).

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	Indigenous people-related	No	Afrodescendats-related	No	Persons with disabilities-related	No	LGBTQ+ individuals-related	No
IF Contribution									

Specific Development Objectives Nbr. 2: MINIMIZAR LAS EMISIONES GENERADAS POR EL TRANSPORTE EN LA GAM.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2025	EOP 2027
2.0	Sumario de toneladas retenidas (ahorro) de emisiones de CO2 generadas por los vehículos que circulan en el tramo San José – San Ramón.	Toneladas	0	2020	P	11,449	11,449
					A	-	-

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito en el corredor vial, intersecciones e intercambios. Estudio de costos de operación mediante la modelación de los flujos de tránsito. Ver POD, EEO#1 página 86 respectivamente. Considera solo las OBIS calculadas.

Observations: Los valores de línea base de base y meta fueron establecidos a partir de los resultados obtenidos en el Análisis Económico del Proyecto (EEO#1). El procedimiento de cálculo utilizado se incluye en el Plan de Monitoreo y Evaluación (EER#2).

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2025	EOP 2027
2.1	Sumario de toneladas retenidas (ahorro) de emisiones de CO2 generadas por los vehículos que circulan en el tramo Taras – La Lima.	Toneladas	0	2020	P	3,820	3,820
					A	-	-

Details

Means of Verification: Estudio de tránsito en el corredor vial, intersecciones e intercambios. Estudio de costos de operación mediante la modelación de los flujos de tránsito. Ver POD, EEO#1, página 22 y 30.

Observations: Los valores de línea base de base y meta fueron establecidos a partir de los resultados obtenidos en el Análisis Económico del Proyecto (EEO#1). El procedimiento de cálculo utilizado se incluye en el Plan de Monitoreo y Evaluación (EER#2).

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

Specific Development Objectives Nbr. 3: MEJORAR LA CAPACIDAD TÉCNICA E INSTITUCIONAL DEL GDCR PARA DESARROLLAR PROYECTOS VIALES MEDIANTE ESQUEMAS DE APP.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2025	EOP 2027
3.0	Proyectos de Obras Viales Contratadas bajo la modalidad de APP	Proyectos	0	2020	P	1	1
					A	-	-

Details

Means of Verification: Contrato de APP

Observations: Se entiende por “diseño integral” al conjunto de documentos con los niveles de aprobación requeridos en cada caso para respaldar el inicio del proceso de licitación de un contrato bajo modalidad APP según la normativa nacional vigente. (EER#2).

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

RESULTS MATRIX

OUTPUTS PHYSICAL PROGRESS

Component Nbr. 1: Infraestructura.

1.1

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
Intercambios Taras – La Lima construidos (Fuente BID).	Km	P	0	0	0	2.5	1.1	0	-	-	3.6
		P (a)	0	0	0	0	0	1.05	0	0	3.6
		A	0	0	0	0	2.55	1.05	0	-	3.6

Details

Means of Verification: Se verificará la ejecución mediante Informes de Avance de obra elaborados por la Supervisión y aprobados por el OE.

Gender-related		**Indigenous people-related**		**Afrodescendats-related**		**Persons with disabilities-related**		**LGBTQ+ individuals-related**	
IF Contribution				**Strategic Alignment**					

Milestone				**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**EOP 2027**
	Intercambio Taras construido (Fuente BID)	km	P	0	0	0	0	0.85	0	-	-	0.85
			P (a)	0	0	0	0	-	0	0	0	0.85
			A	0	0	0	0	0.85	0	0	-	0.85
	Tramo Central construido (Fuente BID)	km	P	0	0	0	1.7	0	0	-	-	1.7
			P (a)	0	0	0	0	1.7	0	0	0	1.7
			A	0	0	0	0	1.7	0	0	-	1.7
	Intercambio La Lima construido (Fuente BID)	km	P	0	0	0	0.8	0.25	0	-	-	1.05
			P (a)	0	0	0	0	0	1.05	0	0	1.05
			A	0	0	0	0	0	1.05	0	-	1.05

Disaggregation			**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Low-carbon and/or resiliency measures included in design (km)	P	0	0	0	2.5	1.1
		P (a)	0	0	0	2.5	1.1
		A	0	0	-	-	-

1.2

2025	2026	2027	EOP 2027
0	-	-	3.6
0	-	-	3.6
-	-	-	0

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
LOTE #1 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Puentes e Intercambio construidos (Fuente Contrapartida).	Km	P	0	0	2.82	0	0	0	-	-	2.82
		P (a)	0	0	2.82	0.62	0	0	0	0	2.82
		A	0	0	2.2	0.62	0	0	0	-	2.82

Details

Means of Verification: Se verificará la ejecución mediante Informes de Avance de obra elaborados por la Supervisión y aprobados por el OE.

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

Milestone				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
	Puente Río Ciruelas construido (Fuente Contrapartida)	km	P	0	0	0.85	0	0	0	-	-	0.85
			P (a)	0	0	0.85	0	0	0	0	0	0.85
			A	0	0	0.85	0	0	0	0	-	0.85
	Puente Río Alajuela construido (Fuente Contrapartida)	km	P	0	0	0.75	0	0	0	-	-	0.75
			P (a)	0	0	0.75	0	0	0	0	0	0.75
			A	0	0	0.75	0	0	0	0	-	0.75
	Puente Río Segundo construido (Fuente Contrapartida)	km	P	0	0	0.6	0	0	0	-	-	0.6
			P (a)	0	0	0.6	0	0	0	0	0	0.6
			A	0	0	0.6	0	0	0	0	-	0.6
	Paso Inferior Firestone construido (Fuente Contrapartida)	km	P	0	0	0.62	0	0	0	-	-	0.62
			P (a)	0	0	0.62	0.62	0	0	0	0	0.62
			A	0	0	0	0.62	0	0	0	-	0.62

Disaggregation			2020	2021	2022	2023	2024
	Low-carbon and/or resiliency measures included in design (km)	P	0	0	2.82	0	0
		P (a)	0	0	2.82	0	0
		A	0	0	-	-	-

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
1.3	LOTE #2 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Conector Barreal y rampas Castella construido (Fuente Contrapartida).	Km	P	0	0	0.6	0	0	0	-	-	0.6
			P (a)	0	0	0.6	0	0	0	0	0	0.6
			A	0	0	0.6	0	0	0	0	-	0.6

Details

Means of Verification:

Gender-related		**Indigenous people-related**		**Afrodescendats-related**		**Persons with disabilities-related**		**LGBTQ+ individuals-related**	
IF Contribution				**Strategic Alignment**					

Disaggregation			2020	2021	2022	2023	2024
	Low-carbon and/or resiliency measures included in design (km)	P	0	0	0.6	0	0
		P (a)	0	0	0.6	0	0
		A	0	0	-	-	-

2025	2026	2027	EOP 2027
0	-	-	2.82
0	-	-	2.82
-	-	-	0

2025	2026	2027	EOP 2027
0	-	-	0.6
0	-	-	0.6
-	-	-	0

	Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
1.4	LOTE #2 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambio circunvalación y Puente Río Torres construidos (Fuente Contrapartida).	Km	P	0	0	0	0	0.55	0	-	-	0.55
			P (a)	0	0	0	0	0	0	0	0.55	0.55
			A	0	0	0	0	0	0	0	-	0

Details

Means of Verification: Se verificará la ejecución mediante Informes de Avance de obra elaborados por la Supervisión y aprobados por el OE.

Gender-related		**Indigenous people-related**		**Afrodescendats-related**		**Persons with disabilities-related**		**LGBTQ+ individuals-related**	
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

	Disaggregation		**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Low-carbon and/or resiliency measures included in design (km)	P	0	0	0	0	0.55
		P (a)	0	0	0	0	0.55
		A	0	0	-	-	-

1.5												

2025	2026	2027	EOP 2027
0	-	-	0.55
0	-	-	0.55
-	-	-	0

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
LOTE #2 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Estaciones de peaje reconstruidas (Río Segundo - Naranjo) (Fuente Contrapartida).	m2	P	0	0	0	25,000	0	0	-	-	25,000
		P (a)	0	0	0	-	0	0	0	25,000	25,000
		A	0	0	0	0	0	0	0	-	0

Details

Means of Verification: Se verificará la ejecución mediante Informes de Avance de obra elaborados por la Supervisión y aprobados por el OE.

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
1.6	Lote #4 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambios San Ramón, Naranjo, Grecia y El Coyol (Fuente BID y Contrapartida).	Km	P	0	0	0	0	0	3.2	-	-	3.2
			P (a)	0	0	0	0	0	0	0	3.88	3.88
			A	0	0	0	0	0	0	0	-	0

Details

Means of Verification: Informes semestrales, actas de recepción de obras.

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

Milestone				**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**EOP 2027**
	Intercambio río Segundo construido (Fuente BID y Contrapartida).	km	P	0	0	0	0	0	0.9	-	-	0.9
			P (a)	0	0	0	0	0	0	0	0.9	0.9
			A	0	0	0	0	0	0	0	-	0
	Intercambio Grecia construido construído (Fuente BID y Contrapartida).	km	P	0	0	0	0	0	0.7	-	-	0.7
			P (a)	0	0	0	0	0	0	0	0.7	0.7
			A	0	0	0	0	0	0	0	-	0
	Intercambio Naranjo construido (Fuente BID y Contrapartida).	km	P	0	0	0	0	0	0.5	-	-	0.5
			P (a)	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5
			A	0	0	0	0	0	0	0	-	0
	Intercambio San Ramón construido (Fuente BID y Contrapartida).	km	P	0	0	0	0	0	0.5	-	-	0.5
			P (a)	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5
			A	0	0	0	0	0	0	0	-	0
	Puente Juan Pablo Segundo construido (Fuente BID y Contrapartida).	km	P	0	0	0	0	0	0.6	-	-	0.6
			P (a)	0	0	0	0	0	0	0	0.6	0.6
			A	0	0	0	0	0	0	0	-	0
	Intercambio El Coyol construido (Fuente BID y Contrapartida).	km	P	-	-	-	-	-	-	-	-	0
			P (a)	-	-	-	-	-	-	0	0.68	0.68
			A	0	0	0	0	0	0	0	-	0

Disaggregation		**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Low-carbon and/or resiliency measures included in design (km)	P	0	0	0	0	0
	P (a)	0	0	0	0	0
	A	0	0	-	-	-

2025	2026	2027	EOP 2027
3.2	-	-	3.2
3.2	-	-	3.2
-	-	-	0

1.7

Component Nbr. 2: Desarrollo de capacidades institucionales

2.1

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
Estudios para la Nueva Vía San Carlos (Fuente BID)	Estudio	P	0	0	1	0	0	0	-	-	1
		P (a)	0	0	1	1	0	0	0	0	1
		A	0	0	0	1	0	0	0	-	1

Details

Means of Verification: Se verificará mediante la aprobación del Informe Final por parte del OE.

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
Fortalecimiento Institucional General + SICOMI realizado (Fuente BID)	# of agencies	P	0	0	0	1	0	0	-	-	1
		P (a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	-	0

Details

Means of Verification: Actas de recepción del Plan.

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

2.1

2.2

2.3

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
Diseño de Obras Urbanas Complementarias (OUC): Elaboración de tres diseños finales de: (i) parque metropolitano de Alajuela; (ii) parque lineal de Taras-La Lima; y (iii) circuito recreativo de occidente en San Ramón realizados (Fuente BID)	Diseños	P	0	0	0	1	2	0	-	-	3
		P (a)	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		A	0	0	0	0	0	0	0	-	0

Details

Means of Verification: Informes semestrales, actas de recepción de obras.

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
Estudios de Estructuración integral en al menos dos proyectos APP realizados (Fuente BID).	Estudio	P	0	0	2	0	0	0	-	-	2
		P (a)	0	0	0	0	0	1	1	1	2
		A	0	0	0	0	0	0	0	-	0

Details

Means of Verification: Actas de recepción de los estudios.

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
Estudio de Apoyo al plan de descarbonización realizado (Fuente Contrapartida)	Estudio	P	0	0	1	0	0	0	-	-	1

2.4

2.5

Estudio de Apoyo al plan de descarbonización realizado (Fuente Contrapartida)	Estudio	P (a)	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		A	0	0	0	0	0	0	0	-	0

Details

Means of Verification: Actas de recepción de consultoría.

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
Evaluación impacto fiscal de garantías en los dos proyectos de APPs realizado (Fuente Contrapartida)	Estudio	P	0	0	0	0	1	0	-	-	1
		P (a)	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		A	0	0	0	0	0	0	0	-	0

Details

Means of Verification: Se verificará mediante la aprobación del Informe Final por parte del OE.

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
Supervisión continua de la distribución de la matriz de riesgos de los 2 APPs realizada (Fuente Contrapartida)	Estudio	P	0	0	0	1	0	0	-	-	1
		P (a)	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		A	0	0	0	0	0	0	0	-	0

Details

Means of Verification: Se verificará mediante la aprobación del Informe Final por parte del OE.

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

2.6

2.7

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
Política de Género Institucional del MOPT actualizada, validada y oficializada (Fuente Contrapartida)	Política y plan de acción	P	0	0	1	0	0	0	-	-	1
		P (a)	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		A	0	0	0	0	0	0	0	-	0

Details

Means of Verification: Actas de recepción y documentos oficiales .

Gender-related	Yes	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
Plan de fortalecimiento de la Comisión Institucional de Género y Personas con Discapacidad realizado (Fuente Contrapartida)	Plan	P	0	0	1	0	0	0	-	-	1
		P (a)	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		A	0	0	0	0	0	0	0	-	0

Details

Means of Verification: Actas de recepción del Plan.

Gender-related	Yes	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	Yes	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

2.8

2.9

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
Actualización del PEI del CNC con elementos de enfoque de género y Personas con Discapacidad realizada (Fuente Contrapartida)	Estudio	P	0	0	1	0	0	0	-	-	1
		P (a)	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		A	0	0	0	0	0	0	0	-	0

Details

Means of Verification: Actas de recepción de los estudios.

Gender-related	Yes	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	Yes	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
Asesoría técnica para diseño urbano realizada	Estudio	P	0	0	1	0	0	0	-	-	1
		P (a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	1	-	1

Details

Means of Verification: Actas de recepción de los estudios.

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

2.10

2.11

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
Capacitación en temas APP realizada (Fuente BID).	Estudio	P	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		P (a)	-	-	-	-	-	-	0	0	1
		A	0	0	0	0	0	1	0	-	1

Details

Means of Verification: Actas de recepción y documentos oficiales

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
Asesoría técnica para el CNC realizada (Fuente BID).	Estudio	P	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		P (a)	-	-	-	-	-	-	0	0	1
		A	0	0	0	0	0	1	0	-	1

Details

Means of Verification: Actas de recepción y documentos oficiales

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

OUTPUTS FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1: Infraestructura.

Component revised cost: 329,118,558.93

| | | |

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
Intercambios Taras – La Lima construidos (Fuente BID).	Km	P	0	3,610,000	21,760,000	34,770,000	5,860,000	0	-	-	66,000,000
		P (a)	0	3,610,000	6,000,000	11,329,400	28,482,663	28,148,534.74	15,628,870.3	85,600.08	77,865,614.4
		A	0	1,299,257.79	3,257,854.1	15,924,873.73	20,550,772.15	21,118,386.25	4,346,816.42	-	66,497,960.44

Details

Means of Verification: Se verificará la ejecución mediante Informes de Avance de obra elaborados por la Supervisión y aprobados por el OE.

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
LOTE #1 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Puentes e Intercambio construidos (Fuente Contrapartida).	Km	P	4,470,000	9,810,000	10,030,000	200,000	0	0	-	-	24,510,000
		P (a)	4,470,000	9,810,000	7,348,870.26	1,559,197.18	0	0	0	0	22,950,802.82
		A	4,924,069	12,037,060.74	5,989,673.08	0	0	0	0	-	22,950,802.82

Details

Means of Verification: Se verificará la ejecución mediante Informes de Avance de obra elaborados por la Supervisión y aprobados por el OE.

Gender-related		**Indigenous people-related**		**Afrodescendats-related**		**Persons with disabilities-related**		**LGBTQ+ individuals-related**	
IF indicator					**Strategic Alignment**				

1.3

1.4

1.5

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
LOTE #2 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Conector Barreal y rampas Castella construido (Fuente Contrapartida).	Km	P	1,260,000	950,000	1,010,000	50,000	0	0	-	-	3,270,000
		P (a)	1,260,000	950,000	315,859.74	365,859.74	0	0	0	0	2,904,140.26
		A	1,105,499	1,798,641.26	0	0	0	0	0	-	2,904,140.26

Details

Means of Verification:

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	Yes	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
LOTE #2 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambio circunvalación y Puente Río Torres construidos (Fuente Contrapartida).	Km	P	0	250,000	3,470,000	12,000,000	4,760,000	0	-	-	20,480,000
		P (a)	0	250,000	608,490.11	6,365,326	0	-	0	0	1,384,022
		A	0	1,384,022	0	0	0	0	0	-	1,384,022

Details

Means of Verification: Se verificará la ejecución mediante Informes de Avance de obra elaborados por la Supervisión y aprobados por el OE.

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
LOTE #2 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Estaciones de peaje reconstruidas (Río Segundo - Naranjo) (Fuente Contrapartida).	m2	P	0	0	950,000	3,110,000	680,000	0	-	-	4,740,000
		P (a)	0	0	183,242.89	3,000,000	0	-	0	12,408,952.14	12,408,952.14
		A	0	0	0	0	0	0	0	-	0

Details

Means of Verification: Se verificará la ejecución mediante Informes de Avance de obra elaborados por la Supervisión y aprobados por el OE.

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

1.6

1.7

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
Lote #4 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambios San Ramón, Naranjo, Grecia y El Coyol (Fuente BID y Contrapartida).	Km	P	0	0	0	2,150,000	23,720,000	24,130,000	-	-	50,000,000
		P (a)	0	0	0	2,150,000	0	2,224,175.62	15,269,046.26	46,368,306.36	62,318,760
		A	0	0	0	0	999.96	680,407.42	2,612,969.02	-	3,294,376.4

Details

Means of Verification: Informes semestrales, actas de recepción de obras.

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
Estudios para la Nueva Vía San Carlos (Fuente BID)	Estudio	P	0	1,100,000	1,900,000	0	0	0	-	-	3,000,000
		P (a)	0	1,100,000	1,147,500	670,000	1,593,969.98	1,494,030	1,950,192.31	175,858.61	8,776,267.31
		A	0	0	323,833	3,727,739.58	1,702,080.55	896,563.26	9,510.77	-	6,659,727.16

Details

Means of Verification: Se verificará mediante la aprobación del Informe Final por parte del OE.

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

Component Nbr. 2: Desarrollo de capacidades institucionales

Component revised cost: 3,260,000.09

2.1	
2.1	
2.2	

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
Fortalecimiento Institucional General + SICOMI realizado (Fuente BID)	# of agencies	P	0	0	420,000	280,000	0	0	-	-	700,000
		P (a)	0	0	0	140,000	0	-	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	-	0

Details

Means of Verification: Actas de recepción del Plan.

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
Diseño de Obras Urbanas Complementarias (OUC): Elaboración de tres diseños finales de: (i) parque metropolitano de Alajuela; (ii) parque lineal de Taras-La Lima; y (iii) circuito recreativo de occidente en San Ramón realizados (Fuente BID)	Diseños	P	0	0	0	220,000	440,000	0	-	-	660,000
		P (a)	0	0	0	162,000	0	-	0	0.01	0.01
		A	0	0	0	0	0	0	0	-	0

Details

Means of Verification: Informes semestrales, actas de recepción de obras.

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
Estudios de Estructuración integral en al menos dos proyectos APP realizados (Fuente BID).	Estudio	P	0	300,000	1,700,000	0	0	0	-	-	2,000,000
		P (a)	0	300,000	0	276,040	0	894,000	2,022,742.6	253,532.4	2,500,000

2.3

2.4

Estudios de Estructuración integral en al menos dos proyectos APP realizados (Fuente BID).	Estudio	A	0	0	0	0	0	223,725	297,599	-	521,324

Details

Means of Verification: Actas de recepción de los estudios.

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
Estudio de Apoyo al plan de descarbonización realizado (Fuente Contrapartida)	Estudio	P	0	50,000	200,000	0	0	0	-	-	250,000
		P (a)	0	50,000	0	100,000	0	-	0	0.01	0.01
		A	0	0	0	0	0	0	0	-	0

Details

Means of Verification: Actas de recepción de consultoría.

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
Evaluación impacto fiscal de garantías en los dos proyectos de APPs realizado (Fuente Contrapartida)	Estudio	P	0	0	0	0	100,000	0	-	-	100,000
		P (a)	0	0	0	0	0	-	0	0.01	0.01
		A	0	0	0	0	0	0	0	-	0

Details

Means of Verification: Se verificará mediante la aprobación del Informe Final por parte del OE.

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

2.5

2.6

2.7

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
Supervisión continua de la distribución de la matriz de riesgos de los 2 APPs realizada (Fuente Contrapartida)	Estudio	P	0	0	80,000	120,000	0	0	-	-	200,000
		P (a)	0	0	0	0	0	-	0	0.01	0.01
		A	0	0	0	0	0	0	0	-	0

Details

Means of Verification: Se verificará mediante la aprobación del Informe Final por parte del OE.

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
Política de Género Institucional del MOPT actualizada, validada y oficializada (Fuente Contrapartida)	Política y plan de acción	P	0	0	30,000	0	0	0	-	-	30,000
		P (a)	0	0	0	5,000	0	-	0	0.01	0.01
		A	0	0	0	0	0	0	0	-	0

Details

Means of Verification: Actas de recepción y documentos oficiales .

Gender-related	Yes	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
Plan de fortalecimiento de la Comisión Institucional de Género y Personas con Discapacidad realizado (Fuente Contrapartida)	Plan	P	0	0	10,000	0	0	0	-	-	10,000
		P (a)	0	0	0	0	0	-	0	0.01	0.01

2.8

2.9

Plan de fortalecimiento de la Comisión Institucional de Género y Personas con Discapacidad realizado (Fuente Contrapartida)	Plan	A	0	0	0	0	0	0	0	-	0

Details

Means of Verification: Actas de recepción del Plan.

Gender-related	Yes	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	Yes	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
Actualización del PEI del CNC con elementos de enfoque de género y Personas con Discapacidad realizada (Fuente Contrapartida)	Estudio	P	0	0	20,000	0	0	0	-	-	20,000
		P (a)	0	0	20,000	0	0	-	0	0.01	0.01
		A	0	0	0	0	0	0	0	-	0

Details

Means of Verification: Actas de recepción de los estudios.

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
Asesoría técnica para diseño urbano realizada	Estudio	P	0	0	30,000	0	0	0	-	-	30,000
		P (a)	0	0	0	0	0	-	0	0.01	0.01
		A	0	0	0	0	0	0	0	-	0

Details

Means of Verification: Actas de recepción de los estudios.

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

2.10

2.11

Other Costs

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Cost
Administración, gestión y auditoría (Fuente BID).	P	-	290,000	450,000	430,000	380,000	450,000	-	-	2,000,000
	P (a)	-	290,000	450,000	430,000	380,000	649,144.2	759,174.87	1,345,374.38	3,779,358.29
	A	-	413,697.4	8,800	51,839.58	541,560.92	658,911.14	233,671.63	-	1,908,480.67

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
Capacitación en temas APP realizada (Fuente BID).	Estudio	P	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		P (a)	-	-	-	-	-	-	164,469.54	0.01	392,284.65
		A	0	0	0	0	32,780.6	195,034.5	0	-	227,815.1

Details

Means of Verification: Actas de recepción y documentos oficiales

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
Asesoría técnica para el CNC realizada (Fuente BID).	Estudio	P	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		P (a)	-	-	-	-	-	-	156,000	62,536.59	367,715.36
		A	0	0	0	19,400	79,945.45	49,833.32	0	-	149,178.77

Details

Means of Verification: Actas de recepción y documentos oficiales

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

Total Costs

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Cost
Total Cost	P	5,730,000	16,360,000	42,060,000	53,330,000	35,940,000	24,580,000	-	-	178,000,000
	P (a)	5,730,000	16,360,000	16,073,963	26,552,822.92	30,456,632.98	33,409,884.56	35,950,495.88	60,700,160.65	195,647,917.31
	A	6,029,568	16,932,679.19	9,580,160.18	19,723,852.89	22,908,139.63	23,822,860.89	7,500,566.84	-	106,497,827.62

CORPORATE INDICATORS

IF INDICATORS

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Categories	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
1	2.19 People with enhanced access to sustainable transportation infrastructure or services	# of beneficiaries		2020	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					P (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	245,442
					A	-	-	-	143,191	-	102,251	-	-	245,442

Details

Means of Verification: Evaluación Ex-Post por parte del MOPT

Observations: Dato del TPDA tomado del Anexo Evaluación Económica Ex Ante de la Propuesta de Préstamo, datos de habitantes tomado de Cuadro 8.3 Proyecciones Población 2021-2022 por Distrito (INEC,2022), y utilización de información geográfica de los proyectos de la carpeta Atlas GIS del Sharepoint TSP Costa Rica.

Change Matrix

Section	Name	Reasons	Related Documents	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System	Agreed with Execution Agency
Output	Asesoría técnica para diseño urbano realizada	Se está atendiendo el diagnóstico social, anteproyecto y elaboración de especificaciones técnicas del espacio urbano circundante al proyecto de Taras-La Lima con la contratación de paisajismo y arquitectura táctica a cargo de consultores individuales, y se programa con financiamiento de fondos del préstamo, que el OE inicie la contratación del Diseño, Construcción y equipamiento de las Obras, atendiendo al menos uno de los espacios con un alcance mayor al original. Las obras se estarían ejecutando durante el 2027.	TdRs Consultores Diseno Urbano Taras-La Lima-Gestor Social.pdf	Modify Output	Activate Output	GMORAVARGAS	9/14/2026	
Output	Asesoría técnica para diseño urbano realizada	Se está atendiendo el diagnóstico social, anteproyecto y elaboración de especificaciones técnicas del espacio urbano circundante al proyecto de Taras-La Lima con la contratación de paisajismo y arquitectura táctica a cargo de consultores individuales, y se programa con financiamiento de fondos del préstamo, que el OE inicie la contratación del Diseño, Construcción y equipamiento de las Obras, atendiendo al menos uno de los espacios con un alcance mayor al original. Las obras se estarían ejecutando durante el 2027.	20044018 – PEC Tors – 04-02-2026 – Hebel Mesen.PDF (1).pdf	Modify Output	Activate Output	GMORAVARGAS	9/14/2026	
Output	Asesoría técnica para diseño urbano realizada	Se está atendiendo el diagnóstico social, anteproyecto y elaboración de especificaciones técnicas del espacio urbano circundante al proyecto de Taras-La Lima con la contratación de paisajismo y arquitectura táctica a cargo de consultores individuales, y se programa con financiamiento de fondos del préstamo, que el OE inicie la contratación del Diseño, Construcción y equipamiento de las Obras, atendiendo al menos uno de los espacios con un alcance mayor al original. Las obras se estarían ejecutando durante el 2027.	N/A	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADRIANBAR	10/5/2026	
Output	Capacitación en temas APP realizada (Fuente BID).	Se está atendiendo el diagnóstico social, anteproyecto y elaboración de especificaciones técnicas del espacio urbano circundante al proyecto de Taras-La Lima con la contratación de paisajismo y arquitectura táctica a cargo de consultores individuales, y se programa con financiamiento de fondos del préstamo, que el OE inicie la contratación del Diseño, Construcción y equipamiento de las Obras, atendiendo al menos uno de los espacios con un alcance mayor al original. Las obras se estarían ejecutando durante el 2027.	N/A	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADRIANBAR	10/5/2026	
Output	Diseño de Obras Urbanas Complementarias (OUC): Elaboración de tres diseños finales de: (i) parque metropolitano de Alajuela; (ii) parque lineal de Taras-La Lima; y (iii) circuito recreativo de occidente en San Ramón realizados (Fuente BID)	Se está atendiendo el diagnóstico social, anteproyecto y elaboración de especificaciones técnicas del espacio urbano circundante al proyecto de Taras-La Lima con la contratación de paisajismo y arquitectura táctica a cargo de consultores individuales, y se programa con financiamiento de fondos del préstamo, que el OE inicie la contratación del Diseño, Construcción y equipamiento de las Obras, atendiendo al menos uno de los espacios con un alcance mayor al original. Las obras se estarían ejecutando durante el 2027.	20044018 – PEC Tors – 04-02-2026 – Hebel Mesen.PDF (1).pdf	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	GMORAVARGAS	9/14/2026	
Output	Diseño de Obras Urbanas Complementarias (OUC): Elaboración de tres diseños finales de: (i) parque metropolitano de Alajuela; (ii) parque lineal de Taras-La Lima; y (iii) circuito recreativo de occidente en San Ramón realizados (Fuente BID)	Se está atendiendo el diagnóstico social, anteproyecto y elaboración de especificaciones técnicas del espacio urbano circundante al proyecto de Taras-La Lima con la contratación de paisajismo y arquitectura táctica a cargo de consultores individuales, y se programa con financiamiento de fondos del préstamo, que el OE inicie la contratación del Diseño, Construcción y equipamiento de las Obras, atendiendo al menos uno de los espacios con un alcance mayor al original. Las obras se estarían ejecutando durante el 2027.	TdRs Consultores Diseno Urbano Taras-La Lima-Gestor Social.pdf	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	GMORAVARGAS	9/14/2026	
Output	Diseño de Obras Urbanas Complementarias (OUC): Elaboración de tres diseños finales de: (i) parque metropolitano de Alajuela; (ii) parque lineal de Taras-La Lima; y (iii) circuito recreativo de occidente en San Ramón realizados (Fuente BID)	Se está atendiendo el diagnóstico social, anteproyecto y elaboración de especificaciones técnicas del espacio urbano circundante al proyecto de Taras-La Lima con la contratación de paisajismo y arquitectura táctica a cargo de consultores individuales, y se programa con financiamiento de fondos del préstamo, que el OE inicie la contratación del Diseño, Construcción y equipamiento de las Obras, atendiendo al menos uno de los espacios con un alcance mayor al original. Las obras se estarían ejecutando durante el 2027.	20044018 – PEC Tors – 04-02-2026 – Hebel Mesen.PDF (1).pdf	Modify Output	Activate Output	GMORAVARGAS	9/14/2026	
Output	Diseño de Obras Urbanas Complementarias (OUC): Elaboración de tres diseños finales de: (i) parque metropolitano de Alajuela; (ii) parque lineal de Taras-La Lima; y (iii) circuito recreativo de occidente en San Ramón realizados (Fuente BID)	Se está atendiendo el diagnóstico social, anteproyecto y elaboración de especificaciones técnicas del espacio urbano circundante al proyecto de Taras-La Lima con la contratación de paisajismo y arquitectura táctica a cargo de consultores individuales, y se programa con financiamiento de fondos del préstamo, que el OE inicie la contratación del Diseño, Construcción y equipamiento de las Obras, atendiendo al menos uno de los espacios con un alcance mayor al original. Las obras se estarían ejecutando durante el 2027.	TdRs Consultores Diseno Urbano Taras-La Lima-Gestor Social.pdf	Modify Output	Activate Output	GMORAVARGAS	9/14/2026	
Output	Diseño de Obras Urbanas Complementarias (OUC): Elaboración de tres diseños finales de: (i) parque metropolitano de Alajuela; (ii) parque lineal de Taras-La Lima; y (iii) circuito recreativo de occidente en San Ramón realizados (Fuente BID)	Se está atendiendo el diagnóstico social, anteproyecto y elaboración de especificaciones técnicas del espacio urbano circundante al proyecto de Taras-La Lima con la contratación de paisajismo y arquitectura táctica a cargo de consultores individuales, y se programa con financiamiento de fondos del préstamo, que el OE inicie la contratación del Diseño, Construcción y equipamiento de las Obras, atendiendo al menos uno de los espacios con un alcance mayor al original. Las obras se estarían ejecutando durante el 2027.	N/A	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADRIANBAR	10/5/2026	

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Status of the Implementation

El Programa registra un avance temporal del 83%* y desembolsos del 73%. La diferencia responde a la ejecución en curso de obras, consultorías y procesos de justificación de gastos. La Unidad Ejecutora mantiene el seguimiento de estas actividades para cumplir las metas previstas dentro del plazo vigente de la operación.
El proyecto Taras-La Lima se encuentra en etapa final, mientras que han iniciado la etapa de construcción los intercambios Grecia y San Ramon. El intercambio El Coyol se encuentra en etapa de diseño y el intercambio Naranjo se encuentra adjudicado, sin embargo mantiene pendiente algunas expropiaciones del área de proyecto lo cual impide la firma del Contrato, se prevee tener el área liberada durante el segundo semestre del 2026. La estructuración del reciclaje de activos sobre RN-1 tramo Limonal-Liberia estaría completa para el Q1-2027.

(*Mediante oficio O-CID/CCR-493/2025, el BID aprobó una extensión de dos años al plazo de desembolsos de la operación, estableciendo como fecha prevista para el último desembolso el 29 de septiembre de 2027).

Likelihood of Achieving Development Objectives

Medium	El proyecto Integral San José – San Ramón (responsabilidad del MOPT) tiene un plazo de ejecución de obras que supera el plazo actual del programa PIV-APP, lo cual puede afectar el logro de los indicadores de costos de operación, tiempos de viaje y sumario de emisiones en ese corredor.

Lesson Learned

Category	Lesson Learned	Entered in System
Project Management Capacity, Project Design, Environmental and Social Factors	Hallazgos Se observó que la necesidad de gestionar las expropiaciones y liberar terrenos para la ejecución de obras se convirtió en un factor determinante crítico del calendario de construcción, ya que la disponibilidad de los derechos de paso no se aseguró completamente antes de comenzar la implementación. Esta situación obligó al equipo del proyecto a reprogramar las actividades de construcción, modificar las secuencias de ejecución y mantener un seguimiento continuo de los procedimientos relacionados con la propiedad, vinculando directamente el progreso de la adquisición de terrenos con la capacidad de cumplir los hitos. La evidencia indicó que, cuando el derecho de paso se obtenía a tiempo, se apoyaba el cumplimiento de los plazos, se reducía la probabilidad de retrasos y se permitía un uso más eficiente de los recursos del programa, alineándose con el objetivo de mejorar el rendimiento de la red vial de alta capacidad en el GAM. Recomendaciones En contextos similares, se sugiere institucionalizar una planificación temprana y robusta de la gestión del suelo como requisito previo para poner en marcha grandes obras civiles, incluyendo hitos claros para asegurar el derecho de paso antes de emitir avisos para proceder. Implementar acciones como mecanismos formales de coordinación con todas las entidades responsables de expropiaciones y autorizaciones socioambientales, con roles definidos, rutas de escalada y revisiones periódicas de progreso	10/2/2026
Project Management Capacity, Acquisitions and Procurement - Provider Performance and Supervision, Project Monitoring & Evaluation	Hallazgos Se observó que la ejecución simultánea de trabajos, supervisión y contratos de consultoría expuso debilidades en los mecanismos de control contractual, el seguimiento de hitos y la trazabilidad documental a lo largo del ciclo del proyecto. La necesidad de un seguimiento continuo de las obligaciones, plazos, modificaciones y entregables se hizo evidente para mantener la continuidad de la actividad y apoyar la toma de decisiones oportuna. Esta experiencia demostró que, en un programa complejo de infraestructuras viarias y APP, una gestión contractual robusta influyó directamente en la mitigación de riesgos relacionados con el tiempo, el coste y el alcance, y por tanto en el logro de los objetivos de competitividad y fortalecimiento institucional del Programa. Recomendaciones En contextos similares, se sugiere establecer herramientas de monitorización contractual, incluyendo registros estandarizados de obligaciones, hitos, cambios y aprobaciones, integrados con los sistemas de gestión y supervisión del programa. Los equipos de proyecto deben mantener registros sistemáticamente actualizados de las decisiones y variaciones contractuales, e implementar procesos de control claros que permitan la detección temprana de desviaciones y riesgos emergentes. También es recomendable asignar responsabilidades explícitas para la administración de contratos, proporcionar formación sobre gestión de contratos (incluyendo FIDIC) y programar revisiones periodicas.	10/2/2026
Intra/Inter Coordination, Project Management Capacity, Environmental and Social Factors	Hallazgos La gestión socioambiental, las consultas comunitarias y el seguimiento con las partes interesadas durante la ejecución revelaron lagunas en la información inicial de referencia y en la continuidad de los mecanismos de comunicación con las comunidades e instituciones afectadas. Como resultado, el equipo tuvo que dedicar un esfuerzo adicional para hacer seguimiento de los compromisos socioambientales, responder a consultas, coordinar entre agencias y documentar acciones para mantener el avance de los trabajos y cumplir con las salvaguardas aplicables. Esta experiencia reflejó directamente el riesgo de alto impacto ya identificado por imprevistos durante las obras (como quejas no resueltas o retrasos en la respuesta a solicitudes), confirmando que las líneas base incompletas y la comunicación no sistemática aumentaban la probabilidad de controversias y posibles responsabilidades ambientales. Recomendaciones En contextos similares, se sugiere establecer líneas de base socioambientales detalladas desde la planificación, asegurando que las condiciones existentes, los posibles impactos y compromisos estén claramente documentados y rastreables antes de que comiencen las obras. Institucionalizar canales de comunicación permanentes y bien dotados de recursos con las comunidades e instituciones relevantes, incluyendo protocolos claros para gestionar quejas. Dedicar un equipo especializado de gestión socioambiental, programar reuniones regulares de seguimiento.	10/2/2026
Project Management Capacity, Project Design, Project Monitoring & Evaluation	Hallazgos Se observó que el programa avanzaba hasta la ejecución con diseños de infraestructuras viarias que no estaban completamente optimizados o desarrollados, lo que obligó a revisiones y ajustes posteriores una vez que los trabajos ya estaban en programa. Esta situación alteró la programación de actividades, expuso lagunas en la definición inicial del alcance técnico y las decisiones clave de diseño se habían pospuesto. La experiencia demostró que cuando la definición técnica es débil, la probabilidad de modificaciones aumenta, el control de costes se vuelve más complejo y el logro de hitos programados está expuesto a riesgos evitables. Recomendaciones En contextos similares, se sugiere reforzar las fases de planificación y diseño con análisis de riesgos integrales, revisiones interdisciplinarias obligatorias y validación formal del alcance del proyecto antes de emitir avisos para proceder. La gobernanza del proyecto debe requerir que los diseños alcancen un nivel de madurez, con registros de riesgos documentados y medidas de mitigación, antes de licitar o contratar obras. Integrar puntos de control de revisión de diseño transversales (ingeniería, socioambiental, adquisiciones y finanzas) y vincular estas puertas a decisiones de aprobación y financiación, reduciendo así las modificaciones posteriores, protegiendo presupuestos y apoyando la entrega oportuna de los resultados del programa. Se recomienda formalizar estas prácticas en manuales y procedimientos.	10/2/2026

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
1	Inactive	Fiduciario: Retrasos en la ejecución por las protestas que se presenten en los procesos de licitación, usando el régimen recursivo de la legislación nacional de Costa Rica (Objeciones al DDL y/o Apelaciones a la adjudicación, ambas presentadas ante la CGR).	3 - Medium High	3 - Medium High	High	Scope and planning

Details

Associated Outputs	- LOTE #1 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Puentes e Intercambio construidos (Fuente Contrapartida). - LOTE #2 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Estaciones de peaje reconstruidas (Río Segundo - Naranjo) (Fuente Contrapartida). - Lote #4 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambios San Ramón, Naranjo, Grecia y El Coyol (Fuente BID y Contrapartida).	**Source of Risk**	Project	**Type of Impact**	- Cost - Time
Associated Outcomes	- DISMINUIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR DEL FLUJO DE TRANSPORTE DE CARGA QUE CIRCULA POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - DISMINUIR LOS TIEMPOS DE VIAJE DE LOS VEHÍCULOS QUE CIRCULAN POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - MINIMIZAR LAS EMISIONES GENERADAS POR EL TRANSPORTE EN LA GAM.	**Responsible**	MOPT	**Probability Factors**	0
Description of Impact	Fuera de la línea base, con un aumento del coste/plazo entre un 30% y un 40% o la cancelación del proyecto.				

Response Actions

	Response Description		Management Strategy		Status	
	-		-		-	
0	**Details**					
	Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	-
	Completion Date		**Funding Source**	-	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
2	Inactive	Si ocurren atrasos en las gestiones socioambientales iniciales, la orden de inicio y cronograma de las obras sufrirían atrasos.	3 - Medium High	3 - Medium High	High	Technical and operational complexity

Details

Associated Outputs	- LOTE #1 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Puentes e Intercambio construidos (Fuente Contrapartida). - LOTE #2 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Conector Barreal y rampas Castella construido (Fuente Contrapartida). - Lote #4 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambios San Ramón, Naranjo, Grecia y El Coyol (Fuente BID y Contrapartida).	**Source of Risk**	Project	**Type of Impact**	- Time
Associated Outcomes	- DISMINUIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR DEL FLUJO DE TRANSPORTE DE CARGA QUE CIRCULA POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - DISMINUIR LOS TIEMPOS DE VIAJE DE LOS VEHÍCULOS QUE CIRCULAN POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - MINIMIZAR LAS EMISIONES GENERADAS POR EL TRANSPORTE EN LA GAM.	**Responsible**	MOPT y Fideicomiso BCR	**Probability Factors**	0
Description of Impact	Fuera de la línea base, con un aumento del coste/plazo entre un 30% y un 40% o la cancelación del proyecto.				

Response Actions

	Response Description		Management Strategy		Status	
	-		-		-	
0	**Details**					
	Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	-
	Completion Date		**Funding Source**	-	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
3	Inactive	Si ocurren atrasos en los procesos de expropiaciones, los contratistas podrían solicitar ajustes a los planes de trabajo y por ende atrasarse la fecha de fin de las obras o reclamar un reconocimiento de costos adicionales.	3 - Medium High	2 - Medium Low	Medium High	Scope and planning

Details

Associated Outputs	- Intercambios Taras – La Lima construidos (Fuente BID). - LOTE #1 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Puentes e Intercambio construidos (Fuente Contrapartida). - LOTE #2 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Estaciones de peaje reconstruidas (Río Segundo - Naranjo) (Fuente Contrapartida). - LOTE #2 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambio circunvalación y Puente Río Torres construidos (Fuente Contrapartida). - Lote #4 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambios San Ramón, Naranjo, Grecia y El Coyol (Fuente BID y Contrapartida).	**Source of Risk**	Project	**Type of Impact**	- Time
Associated Outcomes	- DISMINUIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR DEL FLUJO DE TRANSPORTE DE CARGA QUE CIRCULA POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - DISMINUIR LOS TIEMPOS DE VIAJE DE LOS VEHÍCULOS QUE CIRCULAN POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - MINIMIZAR LAS EMISIONES GENERADAS POR EL TRANSPORTE EN LA GAM.	**Responsible**	MOPT	**Probability Factors**	0
Description of Impact	Fuera de la línea base, con un aumento del coste/plazo entre un 0% y un 30%.				

Response Actions

0

Response Description	Management Strategy	Status
-	-	-

Details

Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	-
Completion Date		**Funding Source**	-	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
4	Inactive	Debido a atrasos en las negociaciones para las contrataciones directas de los gestores técnico y financieros del Programa previstos, la gestión del Programa podría atrasarse ocasionando un desfase en el plazo previsto de ejecución de las obras.	2 - Medium Low	4 - High	Medium High	Project management capacity

Details

Associated Outputs	- Actualización del PEI del CNC con elementos de enfoque de género y Personas con Discapacidad realizada (Fuente Contrapartida) - Asesoría técnica para diseño urbano realizada - Estudio de Apoyo al plan de descarbonización realizado (Fuente Contrapartida) - Estudios de Estructuración integral en al menos dos proyectos APP realizados (Fuente BID). - Estudios para la Nueva Vía San Carlos (Fuente BID) - Evaluación impacto fiscal de garantías en los dos proyectos de APPs realizado (Fuente Contrapartida) - Fortalecimiento Institucional General + SICOMI realizado (Fuente BID) - LOTE #1 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Puentes e Intercambio construidos (Fuente Contrapartida). - LOTE #2 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Estaciones de peaje reconstruidas (Río Segundo - Naranjo) (Fuente Contrapartida). - LOTE #2 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambio circunvalación y Puente Río Torres construidos (Fuente Contrapartida). - Lote #4 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambios San Ramón, Naranjo, Grecia y El Coyol (Fuente BID y Contrapartida). - Plan de fortalecimiento de la Comisión Institucional de Género y Personas con Discapacidad realizado (Fuente Contrapartida) - Política de Género Institucional del MOPT actualizada, validada y oficializada (Fuente Contrapartida) - Supervisión continua de la distribución de la matriz de riesgos de los 2 APPs realizada (Fuente Contrapartida)	**Source of Risk**	Institutional capacity	**Type of Impact**	- Time
Associated Outcomes	- DISMINUIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR DEL FLUJO DE TRANSPORTE DE CARGA QUE CIRCULA POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - DISMINUIR LOS TIEMPOS DE VIAJE DE LOS VEHÍCULOS QUE CIRCULAN POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - MEJORAR LA CAPACIDAD TÉCNICA E INSTITUCIONAL DEL GDCR PARA DESARROLLAR PROYECTOS VIALES MEDIANTE ESQUEMAS DE APP. - MINIMIZAR LAS EMISIONES GENERADAS POR EL TRANSPORTE EN LA GAM.	**Responsible**	MOPT	**Probability Factors**	61 - 80%
Description of Impact	Fuera de la línea base, con un aumento del coste/plazo entre un 0% y un 30%.				

Response Actions

0	Response Description		Management Strategy		Status	
	-		-		-	
	Details					
	Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	-
	Completion Date		**Funding Source**	-	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
5	Inactive	Si ocurren los imprevistos técnicos usuales, se presentarán atrasos durante la ejecución de obras.	3 - Medium High	4 - High	High	Scope and planning

Details

Associated Outputs	- Intercambios Taras – La Lima construidos (Fuente BID). - LOTE #1 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Puentes e Intercambio construidos (Fuente Contrapartida).	**Source of Risk**	Project	**Type of Impact**	- Time
Associated Outcomes	- DISMINUIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR DEL FLUJO DE TRANSPORTE DE CARGA QUE CIRCULA POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - DISMINUIR LOS TIEMPOS DE VIAJE DE LOS VEHÍCULOS QUE CIRCULAN POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - MINIMIZAR LAS EMISIONES GENERADAS POR EL TRANSPORTE EN LA GAM.	**Responsible**	Especialista en Gestion de Proyectos	**Probability Factors**	Es muy probable que ocurra el evento 61-80%
Description of Impact	Fuera de la línea base, con un aumento del coste/plazo entre un 30% y un 40% o la cancelación del proyecto.				

Response Actions

1

Response Description	Management Strategy	Status	
Implementar un plan de acción mediante técnicas de compresión del cronograma como lo son intesificación de recursos y ejecución rápida para finalizar en la fecha acordada. / Gestión ágil en la respuesta de reclamaciones por aumento en el plazo del proyecto.	AVOID	INACTIVE	

Details

Estimated Completion Date	Contrato PEC firmado	**Budget**	56617	**Responsible**	Jefe de Equipo
Completion Date	12/31/2025	**Funding Source**	TECHNICA	**Status Description**	-

2

Response Description	Management Strategy	Status	
Dar seguimiento cercano al compromiso (sucrito por el Organismo Ejecutor, Unidad Ejecutora, Unidad Supervisora y Contratista) que define la Programación de Obra y los hitos para la puesta en operación de algunas secciones del proyecto.	MITIGATE	INACTIVE	

Details

Estimated Completion Date	Adjudicación del contrato de obra de las OBIS Ruta Nacional No. 1 San José - San Ramón	**Budget**	0	**Responsible**	Executing Agency
Completion Date	10/31/2025	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
6	Active	Si persisten atrasos en la adquisición de predios, particularmente en el Intercambio Naranjo, así como en la reubicación de servicios y procesos de licitación del Producto 1.02 OBIS Ruta 1, entonces puede retrasarse la formalización contractual o el inicio de obras, causando extensiones de plazo, mayores costos y afectación en la ejecución del programa.	4 - High	4 - High	High	Scope and planning

Details

Associated Outputs	- Lote #4 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambios San Ramón, Naranjo, Grecia y El Coyol (Fuente BID y Contrapartida).	**Source of Risk**	Project	**Type of Impact**	- Time - Scope - Cost
Associated Outcomes	- DISMINUIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR DEL FLUJO DE TRANSPORTE DE CARGA QUE CIRCULA POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - DISMINUIR LOS TIEMPOS DE VIAJE DE LOS VEHÍCULOS QUE CIRCULAN POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - MINIMIZAR LAS EMISIONES GENERADAS POR EL TRANSPORTE EN LA GAM.	**Responsible**	Organismo Ejecutor	**Probability Factors**	Actualmente se reporta: - La firma de contrato del Intercambio de Naranjo se encuentra en gestión de aprobación para su debida firma. - La formalización del contrato del Intercambio El Coyol se dio tardíamente, lo cual genera presión a la ruta crítica del Programa y actualmente se encuentra suspendida la etapa de diseño. - Ejecución escalonada de los 4 Intercambios podría generar atrasos en cuanto a la programación
Description of Impact	Fuera de la línea base, con un aumento del coste/plazo entre un 30% y un 40% o la cancelación del proyecto.				

Response Actions

1

Response Description	**Management Strategy**	**Status**	
* Al inicio del proyecto, como parte de diseño final se entregue el levantamiento de las instalaciones a reubicar y programación. * El contratista es responsable de la coordinación necesaria para la relocalización de las instalaciones. * Monitoreo por parte de la UE y la Firma Supervisora del avance en la relocalización de acuerdo con la programación. * La supervisión deberá revisar y aprobar el diseño presentado por el contratista.	AVOID	INACTIVE	

Details

Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	-
Completion Date		**Funding Source**	-	**Status Description**	-

2

Response Description	**Management Strategy**	**Status**	
Presentar un informe, antes de la firma de contrato de las obras del Producto 1.02, la disponibilidad predial para la ejecución de cada una de estas obras. En caso de que se identifiquen desviaciones deberá presentar un plan remedial, y en tema de reubicación de servicios, se deberá conformar un equipo técnico conformado por el mecanismo de ejecución del Programa, para seguimiento y con capacidad de elevar las decisiones a las autoridades competentes.	MITIGATE	ACTIVE	

Details

Estimated Completion Date	Hasta la firma de contrato de las obras del producto 1.02	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
Completion Date	12/1/2026	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
7	Active	Si no se actualizan oportunamente las herramientas de gestión y monitoreo, o si existe una coordinación insuficiente entre las unidades ejecutoras responsables del programa, entonces pueden presentarse demoras en la toma de decisiones y en la ejecución de actividades críticas, causando ineficiencias y retrasos en la implementación del programa.	3 - Medium High	3 - Medium High	High	Scope and planning

Details

Associated Outputs	- Intercambios Taras – La Lima construidos (Fuente BID). - LOTE #1 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Puentes e Intercambio construidos (Fuente Contrapartida).	**Source of Risk**	Project	**Type of Impact**	- Time
Associated Outcomes	- DISMINUIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR DEL FLUJO DE TRANSPORTE DE CARGA QUE CIRCULA POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - DISMINUIR LOS TIEMPOS DE VIAJE DE LOS VEHÍCULOS QUE CIRCULAN POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - MINIMIZAR LAS EMISIONES GENERADAS POR EL TRANSPORTE EN LA GAM.	**Responsible**	Coordinador General	**Probability Factors**	Actualmente se reporta: - Extensión aprobada, requiriendo reflejar cambios en HGM. - Incluir dentro del MANOP el arreglo organizacional entre UEP y UERS para Producto OBIS San José-San Ramón.
Description of Impact	En línea de base, con una mediana a gran reducción de las reservas de coste y/o tiempo del proyecto.				

Response Actions

1

Response Description		**Management Strategy**		**Status**	
Respetar y cumplir los procesos y sus respectivos flujos y plazos regulados en el MANOP.		AVOID		INACTIVE	
Details					
Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	-
Completion Date		**Funding Source**	-	**Status Description**	-

2

Response Description		**Management Strategy**		**Status**	
Actualizar las Herramientas de Gestión y Monitoreo establecidas en el Programa, conforme a los cambios producto de la reestructuración propuesta y acordada entre las partes, para el trámite de la extensión de la fecha de último desembolso. En el MANOP deberá quedar establecido la coordinación entre las unidades ejecutoras, así como el seguimiento de actividades críticas.		MITIGATE		ACTIVE	
Details					
Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
Completion Date	11/30/2026	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
8	Materialized	Si existen atrasos en la creación de un plan para la gestión y aprobacion de ajustes, se presentará una demora en la implementación del modelo de gestión.	2 - Medium Low	2 - Medium Low	Medium Low	Project management capacity

Details

Associated Outputs	- Actualización del PEI del CNC con elementos de enfoque de género y Personas con Discapacidad realizada (Fuente Contrapartida) - Asesoría técnica para diseño urbano realizada - Diseño de Obras Urbanas Complementarias (OUC): Elaboración de tres diseños finales de: (i) parque metropolitano de Alajuela; (ii) parque lineal de Taras-La Lima; y (iii) circuito recreativo de occidente en San Ramón realizados (Fuente BID) - Estudio de Apoyo al plan de descarbonización realizado (Fuente Contrapartida) - Estudios de Estructuración integral en al menos dos proyectos APP realizados (Fuente BID). - Estudios para la Nueva Vía San Carlos (Fuente BID) - Evaluación impacto fiscal de garantías en los dos proyectos de APPs realizado (Fuente Contrapartida) - Fortalecimiento Institucional General + SICOMI realizado (Fuente BID) - Intercambios Taras – La Lima construidos (Fuente BID). - LOTE #1 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Puentes e Intercambio construidos (Fuente Contrapartida). - LOTE #2 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Conector Barreal y rampas Castella construido (Fuente Contrapartida). - LOTE #2 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Estaciones de peaje reconstruidas (Río Segundo - Naranjo) (Fuente Contrapartida). - LOTE #2 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambio circunvalación y Puente Río Torres construidos (Fuente Contrapartida). - Lote #4 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambios San Ramón, Naranjo, Grecia y El Coyol (Fuente BID y Contrapartida). - Plan de fortalecimiento de la Comisión Institucional de Género y Personas con Discapacidad realizado (Fuente Contrapartida) - Política de Género Institucional del MOPT actualizada, validada y oficializada (Fuente Contrapartida) - Supervisión continua de la distribución de la matriz de riesgos de los 2 APPs realizada (Fuente Contrapartida)	**Source of Risk**	Institutional capacity	**Type of Impact**	- Time
Associated Outcomes	- DISMINUIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR DEL FLUJO DE TRANSPORTE DE CARGA QUE CIRCULA POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - DISMINUIR LOS TIEMPOS DE VIAJE DE LOS VEHÍCULOS QUE CIRCULAN POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - MINIMIZAR LAS EMISIONES GENERADAS POR EL TRANSPORTE EN LA GAM.	**Responsible**	Organismo Ejecutor	**Probability Factors**	41-60%
Description of Impact	Fuera de la línea base, con un aumento del coste/plazo entre un 0% y un 30%.				

Response Actions

	Response Description		Management Strategy		Status	
1	Creación de un plan para la gestión y aprobación a los ajustes del mecanismo de ejecución del programa.		AVOID		COMPLETE	
	Details					
	Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	-
	Completion Date	9/28/2021	**Funding Source**	-	**Status Description**	-

	Response Description		Management Strategy		Status	
2	Utilizar un mecanismo activo de prevención de disputas a través de las herramientas dispuestas en el contrato de obra		MITIGATE		INACTIVE	
	Details					
	Estimated Completion Date	Adjudicación del contrato de obra de las OBIS Ruta Nacional No. 1 San José - San Ramón	**Budget**	0	**Responsible**	Executing Agency
	Completion Date	10/31/2025	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
9	Active	Si existe una ineficiencia o debilidad en la gestión de reclamaciones, podrían presentarse resultados negativos contrarios a la administración, incluso en casos en los que podrían haberse defendido contractualmente, lo que podría generar impactos financieros no previstos o comprometer recursos del Proyecto.	2 - Medium Low	4 - High	Medium High	Legislation and regulation

Details

Associated Outputs	- Intercambios Taras – La Lima construidos (Fuente BID). - LOTE #1 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Puentes e Intercambio construidos (Fuente Contrapartida).	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Time - Cost
Associated Outcomes	- DISMINUIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR DEL FLUJO DE TRANSPORTE DE CARGA QUE CIRCULA POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - DISMINUIR LOS TIEMPOS DE VIAJE DE LOS VEHÍCULOS QUE CIRCULAN POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - MINIMIZAR LAS EMISIONES GENERADAS POR EL TRANSPORTE EN LA GAM.	**Responsible**	Organismo Ejecutor	**Probability Factors**	Actualmente se reporta: - Contrato para el Intercambio Taras-La Lima se encuentra en la recta final, etapa donde se elevan mayormente las controversias por las Partes. - Desempeño deficiente por parte de algunas firmas consultoras de supervisión, con respecto al manejo de temas FIDIC.
Description of Impact	Fuera de la línea base, con un aumento del coste/plazo entre un 0% y un 30%.				

Response Actions

1

Response Description		**Management Strategy**		**Status**	
Gestión eficiente en la respuesta de reclamaciones y documentación.		MITIGATE		INACTIVE	
Details					
Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	-
Completion Date		**Funding Source**	-	**Status Description**	-

2

Response Description		**Management Strategy**		**Status**	
Reforzar la labor de la Supervisión en el control y trazabilidad de reclamos antes que sean elevados como controversias ante los mecanismos de resolución alternativa de conflictos previstos en el contrato, así como de la documentación contractual.		MITIGATE		ACTIVE	
Details					
Estimated Completion Date	Hasta el cierre de la operación	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
Completion Date	9/28/2027	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

3

Response Description		**Management Strategy**		**Status**	
Dar seguimiento continuo al Producto 1.01 Intercambios Taras - La Lima (R2) y Producto 1.02 OBIS (R1), con el fin de asegurar su ejecución dentro del plazo previsto. Continuar implementando medidas de prevención de reclamos a nivel contractual, como aplicación de ajustes de precios y reforzamiento de los mecanismos de resolución alternativa de conflictos.		MITIGATE		ACTIVE	
Details					
Estimated Completion Date	Hasta el cierre de la operación	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
Completion Date	9/28/2027	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
10	Active	Si surgen imprevistos en la gestión socioambiental asociados a las obras - como quejas no resueltas, falta de incumplimiento de obras de compensación, o demoras en atender solicitudes de información- entonces podrían generarse pasivos ambientales afectando la calidad de las obras, así como poniendo en riesgo el cumplimiento de las políticas y salvaguardas del Banco	4 - High	4 - High	High	Business and social environment

Details

Associated Outputs	- Lote #4 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambios San Ramón, Naranjo, Grecia y El Coyol (Fuente BID y Contrapartida).	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Time - Quality - Cost
Associated Outcomes	- DISMINUIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR DEL FLUJO DE TRANSPORTE DE CARGA QUE CIRCULA POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - DISMINUIR LOS TIEMPOS DE VIAJE DE LOS VEHÍCULOS QUE CIRCULAN POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - MINIMIZAR LAS EMISIONES GENERADAS POR EL TRANSPORTE EN LA GAM.	**Responsible**	Organismo Ejecutor	**Probability Factors**	Actualmente se reporta: - Se mantienen 3 quejas activas bajo monitoreo del Banco (cumplimiento de planes de acción). - Se han presentado retrasos en los PGAS de las OBIS, con obligación a que estén aprobados previo al inicio de obras. - Obras por ejecutar se encuentran inmersas en puntos urbanos y de alta actividad económica como zonas francas lo cual eleva el requerimiento en la gestión socioambiental para prevenir impactos en la ejecución de las obras. - Desempeño de la operación se mantiene como Parcialmente Insatisfactorio.
Description of Impact	En línea de base, con una mediana a gran reducción de las reservas de coste y/o tiempo del proyecto.				

Response Actions

1

Response Description	**Management Strategy**	**Status**	
Dar seguimiento estricto del plan de acción acordado entre Solicitantes y el Organismo Ejecutor en la atención de las quejas recibidas por el Protocolo de Quejas Ambientales y Sociales del Banco (Registro no. 14373 y 20226), que actualmente se encuentran en fase de monitoreo.	MITIGATE	ACTIVE	

Details

Estimated Completion Date	Antes del próximo Informe Semestral	**Budget**	0	**Responsible**	Banco / Organismo Ejecutor
Completion Date	12/30/2026	**Funding Source**	ESGTRANS	**Status Description**	-

2

Response Description	**Management Strategy**	**Status**	
i) Establecimiento de equipo dedicado a la gestión socioambiental, y ii) Reuniones de seguimiento al avance en la programación de la obtención del derecho de vía y otros aspectos del programa.	AVOID	ACTIVE	

Details

Estimated Completion Date	Hasta finalización y entrega de las obras del programa	**Budget**	8244	**Responsible**	Organismo Ejecutor
Completion Date	4/2/2027	**Funding Source**	ESGTRANS	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
11	Materialized	Atrasos en el cronograma de obras debido a imprevistos o eventos compensables que pueden ocasionar atrasos en la fecha de ultimo desembolso del Programa.	4 - High	4 - High	High	Scope and planning

Details

Associated Outputs	- Intercambios Taras – La Lima construidos (Fuente BID). - LOTE #1 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Puentes e Intercambio construidos (Fuente Contrapartida).	**Source of Risk**	Project	**Type of Impact**	- Time
Associated Outcomes	- DISMINUIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR DEL FLUJO DE TRANSPORTE DE CARGA QUE CIRCULA POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - DISMINUIR LOS TIEMPOS DE VIAJE DE LOS VEHÍCULOS QUE CIRCULAN POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - MINIMIZAR LAS EMISIONES GENERADAS POR EL TRANSPORTE EN LA GAM.	**Responsible**	Especialista en Gestión de Proyectos	**Probability Factors**	Se aprobó la extensión por 24 del programa.
Description of Impact	Fuera de la línea base, con un aumento del coste/plazo entre un 30% y un 40% o la cancelación del proyecto.				

Response Actions

1

Response Description	Management Strategy	Status	
Implementar un plan de acción mediante técnicas de compresión del cronograma como lo son intesificación de recursos y ejecución rápida para finalizar en la fecha acordada. / Reuniones de seguimiento al avance en la liberación del lugar de las obras y otros aspectos del programa.	AVOID	INACTIVE	

Details

Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	-
Completion Date		**Funding Source**	-	**Status Description**	-

2

Response Description	Management Strategy	Status	
El Organismo Ejecutor debe acordar con la Agencia Ejecutora los productos a licitar con cargo al programa, y que se encuentran pendiente de definición para así evitar mayores retrasos.	MITIGATE	INACTIVE	

Details

Estimated Completion Date	Adjudicación del contrato de obra de las OBIS Ruta Nacional No. 1 San José - San Ramón	**Budget**	1000	**Responsible**	Executing Organization
Completion Date	12/31/2024	**Funding Source**	VPCTRANS	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
12	Materialized	Si existe se dan problemas con la aprobacion del directorio del Banco para que GdCR haga el trámite, se pueden dar retrasos en la ratificación de la línea CCLIP por la Asamblea Legislativa.	2 - Medium Low	2 - Medium Low	Medium Low	Political stability

Details

Associated Outputs	- Actualización del PEI del CNC con elementos de enfoque de género y Personas con Discapacidad realizada (Fuente Contrapartida) - Asesoría técnica para diseño urbano realizada - Diseño de Obras Urbanas Complementarias (OUC): Elaboración de tres diseños finales de: (i) parque metropolitano de Alajuela; (ii) parque lineal de Taras-La Lima; y (iii) circuito recreativo de occidente en San Ramón realizados (Fuente BID) - Estudio de Apoyo al plan de descarbonización realizado (Fuente Contrapartida) - Estudios de Estructuración integral en al menos dos proyectos APP realizados (Fuente BID). - Estudios para la Nueva Vía San Carlos (Fuente BID) - Evaluación impacto fiscal de garantías en los dos proyectos de APPs realizado (Fuente Contrapartida) - Fortalecimiento Institucional General + SICOMI realizado (Fuente BID) - Intercambios Taras – La Lima construidos (Fuente BID). - LOTE #1 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Puentes e Intercambio construidos (Fuente Contrapartida). - LOTE #2 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Conector Barreal y rampas Castella construido (Fuente Contrapartida). - LOTE #2 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Estaciones de peaje reconstruidas (Río Segundo - Naranjo) (Fuente Contrapartida). - LOTE #2 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambio circunvalación y Puente Río Torres construidos (Fuente Contrapartida). - Lote #4 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambios San Ramón, Naranjo, Grecia y El Coyol (Fuente BID y Contrapartida). - Plan de fortalecimiento de la Comisión Institucional de Género y Personas con Discapacidad realizado (Fuente Contrapartida) - Política de Género Institucional del MOPT actualizada, validada y oficializada (Fuente Contrapartida) - Supervisión continua de la distribución de la matriz de riesgos de los 2 APPs realizada (Fuente Contrapartida)	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Time
Associated Outcomes	- DISMINUIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR DEL FLUJO DE TRANSPORTE DE CARGA QUE CIRCULA POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - DISMINUIR LOS TIEMPOS DE VIAJE DE LOS VEHÍCULOS QUE CIRCULAN POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - MINIMIZAR LAS EMISIONES GENERADAS POR EL TRANSPORTE EN LA GAM.	**Responsible**	Organismo Ejecutor	**Probability Factors**	21 - 40%
Description of Impact	En línea de base, con una mediana a gran reducción de las reservas de coste y/o tiempo del proyecto.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	* Obtener lo más pronto posible la aprobación del Directorio del Banco, para que el GdCR haga el trámite en la Asamblea Legislativa. * Entregar información del programa a los ministerios, sectores y municipalidades beneficiadas, para que apoyen su aprobación en la Asamblea Legislativa.	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	-
Completion Date	9/28/2021	**Funding Source**	-	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
13	Inactive	Retrasos en la ejecución por las protestas que se presenten en los procesos de licitación, usando el régimen recursivo de la legislación nacional de Costa Rica (Objeciones al DDL y/o Apelaciones a la adjudicación, amboas presentadas ante la CGR).	2 - Medium Low	3 - Medium High	Medium High	Rule of law

Details

Associated Outputs	- Lote #4 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambios San Ramón, Naranjo, Grecia y El Coyol (Fuente BID y Contrapartida).	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Time
Associated Outcomes	- DISMINUIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR DEL FLUJO DE TRANSPORTE DE CARGA QUE CIRCULA POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - DISMINUIR LOS TIEMPOS DE VIAJE DE LOS VEHÍCULOS QUE CIRCULAN POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - MINIMIZAR LAS EMISIONES GENERADAS POR EL TRANSPORTE EN LA GAM.	**Responsible**	Organismo Ejecutor	**Probability Factors**	61 - 80%
Description of Impact	Fuera de la línea base, con un aumento del coste/plazo entre un 0% y un 30%.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	* Incluir el mínimo de requisitos necesarios en los DDL, utilizando criterios incluidos en licitaciones anteriores que fueron aceptadas en la CGR. * Escalonar el inicio de las licitaciones, con el objetivo de incorporar los resultados de las objeciones previas que fueron aceptadas en la CGR * Establecer un equipo dedicado a la atención inmediata a las impugnaciones * La UA coordinara el manejo de las protestas (recursos) con la UAP o la UEP-PIT de acuerdo con el componente; * Presentar a la CGR, antes de iniciar cada gran licitación la justificación técnica de los requisitos y criterios de evaluación incluidos en los DDL, así como la estrategia de adquisiciones. * Capacitación del equipo para la atención inmediata de las protestas en la UA, UAP y UEP-PIT. * Elaborar especificaciones técnicas detalladas, realizar visitas de campo para oferentes al lugar de la Obra, garantizar el tiempo necesario para responder todas las preguntas y aclaraciones de los oferentes interesados. * a todos los oferentes y entregar los resultados a la CGR en caso de apelaciones por oferentes que no tengan la oferta más baja. * Realizar una estimación de costos y mantenerla actualizados los datos al momento de la adjudicación.	MITIGATE	INACTIVE	

Details

Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	-
Completion Date		**Funding Source**	-	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
14	Inactive	Si existen incumplimientos con la revisión del presupuesto base, podrían no presentarse ofertas, o las ofertas presentadas podrían exceder el presupuesto disponible.	3 - Medium High	2 - Medium Low	Medium High	Macroeconomic environment

Details

Associated Outputs	- Lote #4 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambios San Ramón, Naranjo, Grecia y El Coyol (Fuente BID y Contrapartida).	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Scope - Cost - Time
Associated Outcomes	- DISMINUIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR DEL FLUJO DE TRANSPORTE DE CARGA QUE CIRCULA POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - DISMINUIR LOS TIEMPOS DE VIAJE DE LOS VEHÍCULOS QUE CIRCULAN POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - MINIMIZAR LAS EMISIONES GENERADAS POR EL TRANSPORTE EN LA GAM.	**Responsible**	Especialista en Adquisiciones	**Probability Factors**	0-20%
Description of Impact	En línea de base, sin impacto real o una pequeña reducción de las reservas de coste y/o tiempo del proyecto.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	Revisión del presupuesto base por un especialista sectorial, previo a lanzar la licitación.	AVOID	INACTIVE	

Details

Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	-
Completion Date		**Funding Source**	-	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
15	Inactive	Si existen incumplimientos con la revisión del presupuesto base, existe Riesgo de recibir ofertas anormalmente bajas (ofertas ruinosas) y/o retrasos en la ejecución de las obras por problemas financieros del contratista (Contratos cuyos presupuestos no cubren los costos de la obra).	1 - Low	2 - Medium Low	Low	Macroeconomic environment

Details

Associated Outputs	- Lote #4 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambios San Ramón, Naranjo, Grecia y El Coyol (Fuente BID y Contrapartida).	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Cost - Time
Associated Outcomes	- DISMINUIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR DEL FLUJO DE TRANSPORTE DE CARGA QUE CIRCULA POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - DISMINUIR LOS TIEMPOS DE VIAJE DE LOS VEHÍCULOS QUE CIRCULAN POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - MINIMIZAR LAS EMISIONES GENERADAS POR EL TRANSPORTE EN LA GAM.	**Responsible**	Especialista en Adquisiciones	**Probability Factors**	0-20 %
Description of Impact	En línea de base, sin impacto real o una pequeña reducción de las reservas de coste y/o tiempo del proyecto.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	* Revisión del presupuesto base por un especialista sectorial, previo a lanzar la licitación. * Realizar análisis de razonabilidad de la oferta económica como parte de la evaluación de las ofertas económicas. * Elaborar especificaciones técnicas detalladas, realizar visitas de campo para oferentes al lugar de la Obra, garantizar el tiempo necesario para responder todas las preguntas y aclaraciones de los oferentes. interesados. * Realizar precalificación de oferentes y/o exigir requisitos financieros actualizados. * Realizar una estimación de costos y mantenerla actualizados los datos al momento de la adjudicación.	MITIGATE	INACTIVE	

Details

Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	-
Completion Date		**Funding Source**	-	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
16	Inactive	Si existe un incumplimiento en los plazos licitatorios, podrían presentarse atrasos en la formalización del contrato.	1 - Low	4 - High	Medium Low	Legislation and regulation

Details

Associated Outputs	- Lote #4 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambios San Ramón, Naranjo, Grecia y El Coyol (Fuente BID y Contrapartida).	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Time
Associated Outcomes	- DISMINUIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR DEL FLUJO DE TRANSPORTE DE CARGA QUE CIRCULA POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - DISMINUIR LOS TIEMPOS DE VIAJE DE LOS VEHÍCULOS QUE CIRCULAN POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - MINIMIZAR LAS EMISIONES GENERADAS POR EL TRANSPORTE EN LA GAM.	**Responsible**	Especialista en Adquisiciones	**Probability Factors**	0 - 20 %
Description of Impact	En línea de base, sin impacto real o una pequeña reducción de las reservas de coste y/o tiempo del proyecto.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	* Establecer un plazo máximo para la presentación de la documentación necesaria para la firma del contrato, indicando la posibilidad de poder adjudicar al segundo lugar en caso de incumpliendo de dicho plazo.	AVOID	INACTIVE	

Details

Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	-
Completion Date		**Funding Source**	-	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
17	Inactive	Si no se establecen adecuadamente criterios de penalización ante atrasos en los contratos, pueden presentarse atrasos en el inicio de la ejecución del contrato.	3 - Medium High	2 - Medium Low	Medium High	Scope and planning

Details

Associated Outputs	- Intercambios Taras – La Lima construidos (Fuente BID). - LOTE #1 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Puentes e Intercambio construidos (Fuente Contrapartida).	**Source of Risk**	Project	**Type of Impact**	- Time
Associated Outcomes	- DISMINUIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR DEL FLUJO DE TRANSPORTE DE CARGA QUE CIRCULA POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - DISMINUIR LOS TIEMPOS DE VIAJE DE LOS VEHÍCULOS QUE CIRCULAN POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - MINIMIZAR LAS EMISIONES GENERADAS POR EL TRANSPORTE EN LA GAM.	**Responsible**	Especialista en Gestión de Proyectos	**Probability Factors**	21 - 40 %
Description of Impact	Fuera de la línea base, con un aumento del coste/plazo entre un 0% y un 30%.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status
1	* Establecer en el DDL y modelo de contrato una penalidad por el retraso en el inicio del contrato por causas imputables al contratista.	TRANSFER	INACTIVE

Details

Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	-
Completion Date		**Funding Source**	-	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
18	Inactive	Si no se incorp precios en el DDL de acuerdo a la políticora en la clausula de escalamiento dea de adquisiciones, podría presentarse un aumento de costos.	1 - Low	2 - Medium Low	Low	Macroeconomic environment

Details

Associated Outputs	- Intercambios Taras – La Lima construidos (Fuente BID). - LOTE #1 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Puentes e Intercambio construidos (Fuente Contrapartida).	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Cost
Associated Outcomes	- DISMINUIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR DEL FLUJO DE TRANSPORTE DE CARGA QUE CIRCULA POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - DISMINUIR LOS TIEMPOS DE VIAJE DE LOS VEHÍCULOS QUE CIRCULAN POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - MINIMIZAR LAS EMISIONES GENERADAS POR EL TRANSPORTE EN LA GAM.	**Responsible**	Especialista en Gestión de Proyectos	**Probability Factors**	41 - 60%
Description of Impact	Fuera de la línea base, con un aumento del coste/plazo entre un 0% y un 30%.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status
1	* Incorporar la cláusula de escalamiento de precios en el DDL, de acuerdo a la Política de adquisiciones. * Mantener una reserva para el financiamiento de los incrementos de costos.	ACCEPT	INACTIVE

Details

Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	-
Completion Date		**Funding Source**	-	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
19	Active	Si existe una valoración débil de la supervisora en temas FIDIC, se pueden presentar debilidades en la defensa de los intereses de la Administración frente a los contratistas.	4 - High	4 - High	High	Legislation and regulation

Details

Associated Outputs	- Intercambios Taras – La Lima construidos (Fuente BID). - LOTE #1 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Puentes e Intercambio construidos (Fuente Contrapartida).	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Time - Cost - Scope
Associated Outcomes	- DISMINUIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR DEL FLUJO DE TRANSPORTE DE CARGA QUE CIRCULA POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - DISMINUIR LOS TIEMPOS DE VIAJE DE LOS VEHÍCULOS QUE CIRCULAN POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - MINIMIZAR LAS EMISIONES GENERADAS POR EL TRANSPORTE EN LA GAM.	**Responsible**	Organismo Ejecutor	**Probability Factors**	Actualmente se reporta: - Desempeño deficiente por parte de algunas firmas consultoras de supervisión, con respecto al manejo de temas FIDIC. - Nuevos contratos de supervisión para los tres intercambios, y una contratación que se encuentra en proceso de aprobación del acta técnica, se proyecta tenerla activa para el inicio de ejecución de las obras del Intercambio El Coyol.
Description of Impact	En línea de base, con una mediana a gran reducción de las reservas de coste y/o tiempo del proyecto.				

Response Actions

1

Response Description	Management Strategy	Status	
i) Valorar la experiencia de la Firma Consultora en la administración de contratos FIDIC en la etapa de evaluación de ofertas. ii) Incorporar requerimientos específicos en temas FIDIC para el personal clave de la supervisión, así como que el personal administrativo cuente con experiencia en Herramientas de Gestión y Monitoreo. iii) A nivel de los Términos de Referencia herramientas a disposición de la Administración para ajustar el desempeño de la Supervisión en los contratos de obra. iv) Dar un seguimiento mensual en conjunto con el Organismo Ejecutor para monitorear desviaciones del Realizar reuniones conjuntas con la firma Supervisora y la Unidad Ejecutora para el monitoreo del desempeño de la firma supervisora.	AVOID	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	Hasta el cierre de la operación.	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
Completion Date	10/2/2026	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

2

Response Description	Management Strategy	Status	
Realizar capacitaciones en temas FIDIC así como de los mecanismos de resolución alternativa de conflictos que prevé el contrato.	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	7-Jul-25	**Budget**	10000	**Responsible**	Banco/Organismo Ejecutor
Completion Date	7/31/2025	**Funding Source**	VPSTRANS	**Status Description**	-

3

Response Description	Management Strategy	Status	
Reforzar el equipo técnico de supervisión, para el Producto 1.02 (Financiamiento BID), con analistas de la Unidad Ejecutora para mejorar la gestión y evitar cuellos de botella en el funcionamiento durante el cierre de la operación.	MITIGATE	ACTIVE	

Details

Estimated Completion Date	Hasta el cierre de la operación.	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
Completion Date	9/28/2027	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
20	Inactive	Si la activación del ingeniero FIDIC se da de manera tardía en los contratos, se podría presentar riesgo de demoras en la ejecución de las obras originadas por la falta de solución oportuna de conflictos.	1 - Low	4 - High	Medium Low	Scope and planning

Details

Associated Outputs	- Intercambios Taras – La Lima construidos (Fuente BID). - LOTE #1 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Puentes e Intercambio construidos (Fuente Contrapartida).	**Source of Risk**	Project	**Type of Impact**	- Time
Associated Outcomes	- DISMINUIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR DEL FLUJO DE TRANSPORTE DE CARGA QUE CIRCULA POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - DISMINUIR LOS TIEMPOS DE VIAJE DE LOS VEHÍCULOS QUE CIRCULAN POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - MINIMIZAR LAS EMISIONES GENERADAS POR EL TRANSPORTE EN LA GAM.	**Responsible**	Coordinador General	**Probability Factors**	0 -20 %
Description of Impact	En línea de base, con una mediana a gran reducción de las reservas de coste y/o tiempo del proyecto.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	* Utilizar contratos FIDIC en las principales licitaciones y se activara tempranamente las figuras del Ingeniero y la Comisión de Resolución de Controversias (CRC) prevista en dichos contratos, como pasos previos del arbitraje. * Con base a demanda, establecer la posibilidad que los miembros de la mesa de resolución de conflictos puedan asistir a las reuniones de construcción, en calidad de observadores.	AVOID	INACTIVE	

Details

Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	-
Completion Date		**Funding Source**	-	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
21	Inactive	De	1 - Low	1 - Low	Low	Macroeconomic environment

Details

Associated Outputs	- Actualización del PEI del CNC con elementos de enfoque de género y Personas con Discapacidad realizada (Fuente Contrapartida) - Asesoría técnica para diseño urbano realizada - Diseño de Obras Urbanas Complementarias (OUC): Elaboración de tres diseños finales de: (i) parque metropolitano de Alajuela; (ii) parque lineal de Taras-La Lima; y (iii) circuito recreativo de occidente en San Ramón realizados (Fuente BID) - Estudio de Apoyo al plan de descarbonización realizado (Fuente Contrapartida) - Estudios de Estructuración integral en al menos dos proyectos APP realizados (Fuente BID). - Estudios para la Nueva Vía San Carlos (Fuente BID) - Evaluación impacto fiscal de garantías en los dos proyectos de APPs realizado (Fuente Contrapartida) - Fortalecimiento Institucional General + SICOMI realizado (Fuente BID) - Intercambios Taras – La Lima construidos (Fuente BID). - LOTE #1 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Puentes e Intercambio construidos (Fuente Contrapartida). - LOTE #2 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Conector Barreal y rampas Castella construido (Fuente Contrapartida). - LOTE #2 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Estaciones de peaje reconstruidas (Río Segundo - Naranjo) (Fuente Contrapartida). - LOTE #2 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambio circunvalación y Puente Río Torres construidos (Fuente Contrapartida). - Lote #4 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambios San Ramón, Naranjo, Grecia y El Coyol (Fuente BID y Contrapartida). - Plan de fortalecimiento de la Comisión Institucional de Género y Personas con Discapacidad realizado (Fuente Contrapartida) - Política de Género Institucional del MOPT actualizada, validada y oficializada (Fuente Contrapartida) - Supervisión continua de la distribución de la matriz de riesgos de los 2 APPs realizada (Fuente Contrapartida)	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Time
Associated Outcomes	- DISMINUIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR DEL FLUJO DE TRANSPORTE DE CARGA QUE CIRCULA POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - DISMINUIR LOS TIEMPOS DE VIAJE DE LOS VEHÍCULOS QUE CIRCULAN POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - MEJORAR LA CAPACIDAD TÉCNICA E INSTITUCIONAL DEL GDCR PARA DESARROLLAR PROYECTOS VIALES MEDIANTE ESQUEMAS DE APP. - MINIMIZAR LAS EMISIONES GENERADAS POR EL TRANSPORTE EN LA GAM.	**Responsible**	Especialista Financiero	**Probability Factors**	0 - 20 %
Description of Impact	En línea de base, sin impacto real o una pequeña reducción de las reservas de coste y/o tiempo del proyecto.				

Response Actions

	Response Description		**Management Strategy**		**Status**	
1	*Acordar y documentar un flujo detallado de procesos que determine claramente las responsabilidades de cada unidad y establezca los plazos para la gestión de desembolsos, rendición de cuenta de uso de fondos y elaboración de los Estados Financieros del Programa. *Desarrollar un taller de capacitación en gestión financiera para ambas unidades. *Se realizarán dos visitas financieras durante el primer año de ejecución, para validar la implementación de los mecanismos de coordinación definidos y las eventuales medidas de ajuste que se consideren necesarias.		AVOID		INACTIVE	
	Details					
	Estimated Completion Date	No poder gestionar pagos a través de los recursos del préstamo	**Budget**	0	**Responsible**	Executing Organization
	Completion Date	9/24/2023	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
22	Materialized	Si no se presenta un plan de acción debido a la no intervención de la Ruta No. 1 (OBIS) se puede llegar a requerir una extensión en el plazo del préstamo, o incurrir en la cancelación de los fondos vinculados a estas obras.	1 - Low	1 - Low	Low	Scope and planning

Details

Associated Outputs	- LOTE #2 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Estaciones de peaje reconstruidas (Río Segundo - Naranjo) (Fuente Contrapartida). - LOTE #2 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambio circunvalación y Puente Río Torres construidos (Fuente Contrapartida). - Lote #4 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambios San Ramón, Naranjo, Grecia y El Coyol (Fuente BID y Contrapartida).	**Source of Risk**	Project	**Type of Impact**	- Scope - Time - Quality
Associated Outcomes	- DISMINUIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR DEL FLUJO DE TRANSPORTE DE CARGA QUE CIRCULA POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - DISMINUIR LOS TIEMPOS DE VIAJE DE LOS VEHÍCULOS QUE CIRCULAN POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - MINIMIZAR LAS EMISIONES GENERADAS POR EL TRANSPORTE EN LA GAM.	**Responsible**	MOPT	**Probability Factors**	Se aprobó la extensión por 24 del programa, además que dio lugar a la reestructuración en el Plan de Ejecución del Producto OBIS San José-San Ramón donde 9/17 OBIS serán ejecutadas por el Programa y 8/17 OBIS serán ejecutadas con otro financiamiento, en otro plazo.
Description of Impact	se puede llegar a requerir una extensión en el plazo del préstamo, o incurrir en la cancelación de los fondos vinculados a estas obras.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	Incorporar sesiones de trabajo previo a la próxima revisión de cartera para la identificacion acciones a implementar y alcanzar el plan deseado.	MITIGATE	INACTIVE	

Details

Estimated Completion Date	mayo 2024	**Budget**	0	**Responsible**	Executing Organization
Completion Date	5/31/2024	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status	
2	Obtener una definición por parte del Organismo Ejecutor de los productos a licitar con cargo al programa, y que se encuentran pendientes de definición	MITIGATE	INACTIVE	

Details

Estimated Completion Date	Adjudicación del contrato de obra de las OBIS Ruta Nacional No. 1 San José - San Ramón	**Budget**	0	**Responsible**	Executing Organization
Completion Date	12/31/2024	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
23	Active	Si el OE no cumple con el compromiso de ejecutar, con fuente de contrapartida y dentro del plazo de ejecución de la operación, el producto 1.02, que corresponde a las obras que dejarán de ser financiadas con recursos de la operación y pasaran a conformar el Proyecto Integral San José – San Ramón, por cambios de interés, entonces se comprometerá la efectividad a nivel de resultados y de productos.	4 - High	4 - High	High	Scope and planning

Details

Associated Outputs	- LOTE #2 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Estaciones de peaje reconstruidas (Río Segundo - Naranjo) (Fuente Contrapartida). - LOTE #2 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambio circunvalación y Puente Río Torres construidos (Fuente Contrapartida). - Lote #4 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambios San Ramón, Naranjo, Grecia y El Coyol (Fuente BID y Contrapartida).	**Source of Risk**	Project	**Type of Impact**	- Time - Cost - Scope
Associated Outcomes	- DISMINUIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR DEL FLUJO DE TRANSPORTE DE CARGA QUE CIRCULA POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - DISMINUIR LOS TIEMPOS DE VIAJE DE LOS VEHÍCULOS QUE CIRCULAN POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM	**Responsible**	Organismo Ejecutor	**Probability Factors**	Actualmente se reporta: - Alrededor de 8 de las 17 OBIS originalmente concebidas no serán ejecutadas a través del programa y se trasladan a un Plan de Ejecución con otro financiamiento, acordado por el Gobierno. Se prevé que estas 8 OBIS se desarrollen fuera del plazo de último desembolso (septiembre de 2027), dado que la implementación de este plan aún pasa por aprobación de la Asamblea Legislativa.
Description of Impact	Fuera de la línea base, con un aumento del coste/plazo entre un 30% y un 40% o la cancelación del proyecto.				

Response Actions

23	1	**Response Description**		**Management Strategy**		**Status**	
		La Unidad Ejecutora enviará, al Prestatario y al Banco, el documento con la propuesta para el desarrollo del Producto 1.02 y del corredor integral San José - San Ramón, con el objetivo de formalizar un compromiso entre las Partes para maximizar los resultados de los objetivos específicos del Programa.		MITIGATE		COMPLETE	
		Details					
		Estimated Completion Date	Hasta la fecha original de último desembolso.	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
		Completion Date	9/28/2025	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-
	2	**Response Description**		**Management Strategy**		**Status**	
		El Organismo Ejecutor se compromete a incorporar los recursos del fideicomiso por presupuesto nacional de forma anual, adicionalmente también valorar la viabilidad o no de un mecanismo alternativo para que los fondos del fideicomiso sean incorporados en una única vez por el presupuesto extraordinario, con una validación anual.		MITIGATE		ACTIVE	
		Details					
		Estimated Completion Date	Hasta la fecha original de último desembolso.	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
		Completion Date	9/28/2027	**Funding Source**	LOCALCOU	**Status Description**	-
	3	**Response Description**		**Management Strategy**		**Status**	
		Actualizar las HGM, en particular el MANOP para formalizar el arreglo organizativo entre la UEP, quien es el responsable ante el Banco de la gestión del Programa, pero incluyendo a la Unidad Ejecutora San José-San Ramón (UERS) quien se encargará de gestionar los recursos de contrapartida para las obras del Programa		MITIGATE		ACTIVE	
		Details					
		Estimated Completion Date	Hasta el cierre de la operación	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
		Completion Date	9/28/2027	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-
	4	**Response Description**		**Management Strategy**		**Status**	
		Incrementar el monto de Contrapartida Local para el producto 1.02, para las intervenciones a financiarse con recursos de la operación de préstamo, con el objetivo de cubrir posibles contingencias durante el ciclo de vida del proyecto, asegurando el alcance con enfoque en resultados.		MITIGATE		COMPLETE	
		Details					
		Estimated Completion Date	Hasta el cierre de la operación	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
		Completion Date	9/28/2025	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
24	Active	Si las entidades responsables del Componente 2 no acuerdan oportunamente el alcance, incluyendo la definición del segundo proyecto APP, ni disponen del personal requerido para la ejecución de las actividades ajustadas, entonces los productos del componente no se implementarán a tiempo, causando retrasos en la ejecución y afectación en el logro de resultados institucionales.	3 - Medium High	3 - Medium High	High	Execution mechanism

Details

Associated Outputs	- Estudio de Apoyo al plan de descarbonización realizado (Fuente Contrapartida) - Estudios de Estructuración integral en al menos dos proyectos APP realizados (Fuente BID). - Plan de fortalecimiento de la Comisión Institucional de Género y Personas con Discapacidad realizado (Fuente Contrapartida) - Política de Género Institucional del MOPT actualizada, validada y oficializada (Fuente Contrapartida) - Supervisión continua de la distribución de la matriz de riesgos de los 2 APPs realizada (Fuente Contrapartida)	**Source of Risk**	Institutional capacity	**Type of Impact**	- Quality - Scope - Time
Associated Outcomes	- MEJORAR LA CAPACIDAD TÉCNICA E INSTITUCIONAL DEL GDCR PARA DESARROLLAR PROYECTOS VIALES MEDIANTE ESQUEMAS DE APP.	**Responsible**	Organismo Ejecutor	**Probability Factors**	Actualmente se reporta: - Productos del Componente 2 sin ejecución o sin reportar entregable final. - Falta definición del segundo proyecto APP, así como los productos ajustados.
Description of Impact	Se puede incurrir en la cancelación de los fondos vinculados de estos productos, afectando el indicador de resultado.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	Se requieren algunas actividades como: i) definición del segundo proyecto APP, ii) presentar evidencia del cumplimiento de los productos conforme a la MR.	MITIGATE	ACTIVE	

Details

Estimated Completion Date	Hasta el cierre de la operación	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
Completion Date	9/28/2027	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status	
2	Presentar al Prestario y al Banco el Plan de Acción para las actividades propuestas en el Componente 2, diferenciando aquellas que serán financiadas con recursos del préstamo y de contrapartida local, además de las que serán desestimadas e introducidas conforme a las prioridades de las autoridades en temas de fortalecimiento institucional en temas de asociaciones público-privadas.	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	Hasta el cierre de la operación	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
Completion Date	9/28/2025	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
25	Active	Si se presentan atrasos durante la ejecución del producto 1.02 IC El Coyol, debido a condiciones climáticas adversas, bajo rendimiento y/o mala planificación del contratista, demoras ocasionadas por las autoridades, y cambios en el alcance/requerimientos, entonces no se concluirá la obra dentro del plazo establecido, lo que afectará la efectividad del Programa y podría requerir una nueva extensión de plazo.	3 - Medium High	4 - High	High	Scope and planning

Details

Associated Outputs	- Lote #4 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambios San Ramón, Naranjo, Grecia y El Coyol (Fuente BID y Contrapartida).	**Source of Risk**	Project	**Type of Impact**	- Quality - Time - Cost
Associated Outcomes	- DISMINUIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR DEL FLUJO DE TRANSPORTE DE CARGA QUE CIRCULA POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - DISMINUIR LOS TIEMPOS DE VIAJE DE LOS VEHÍCULOS QUE CIRCULAN POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - MINIMIZAR LAS EMISIONES GENERADAS POR EL TRANSPORTE EN LA GAM.	**Responsible**	Organismo Ejecutor	**Probability Factors**	61%-80%
Description of Impact	Fuera de la línea base, con un aumento del coste/plazo entre un 30% y un 40% o la cancelación del proyecto.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status
1	Dar seguimiento estratégico al avance del Producto 1.02 (IC Grecia, IC Naranjo, IC San Ramón, e IC El Coyol), para plantear medidas de contingencia que permitan ejecutar el procuto dentro del nuevo plazo propuesto para la operación.	MITIGATE	ACTIVE

Details

Estimated Completion Date	Hasta el cierre de la operación	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
Completion Date	9/28/2027	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status
2	Programar reuniones de seguimiento estratégico con el Organismo Ejecutor, con cierta periodicidad, enfocados en la conclusion de los productos para el logro de resultados. Adicionalmente se llevarán a cabo visitas de supervisión técnica a las obras consideradas como críticas, y se llevará monitoreo de las comunicaciones (modificaciones) que tramite el OE, así como el apoyo de un consultor externo para seguimiento general del Programa.	MITIGATE	ACTIVE

Details

Estimated Completion Date	Hasta el cierre de la operación	**Budget**	0	**Responsible**	Banco / Organismo Ejecutor
Completion Date	9/28/2027	**Funding Source**	VPSTRANS	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
26	Active	Si no se acuerda con el Banco una medición complementaria del impacto atribuible a la operación, puede mantenerse una brecha entre la matriz de resultados vigente y las obras efectivamente financiadas, causando dificultades para evidenciar el logro real de los objetivos de desarrollo.	3 - Medium High	3 - Medium High	High	Scope and planning

Details

Associated Outputs	- LOTE #1 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Puentes e Intercambio construidos (Fuente Contrapartida). - LOTE #2 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Conector Barreal y rampas Castella construido (Fuente Contrapartida). - LOTE #2 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Estaciones de peaje reconstruidas (Río Segundo - Naranjo) (Fuente Contrapartida). - LOTE #2 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambio circunvalación y Puente Río Torres construidos (Fuente Contrapartida). - Lote #4 Programa de OBIS en el corredor San Ramón – San José: Intercambios San Ramón, Naranjo, Grecia y El Coyol (Fuente BID y Contrapartida).	**Source of Risk**	Project	**Type of Impact**	- Scope - Quality
Associated Outcomes	- DISMINUIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR DEL FLUJO DE TRANSPORTE DE CARGA QUE CIRCULA POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - DISMINUIR LOS TIEMPOS DE VIAJE DE LOS VEHÍCULOS QUE CIRCULAN POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - MINIMIZAR LAS EMISIONES GENERADAS POR EL TRANSPORTE EN LA GAM.	**Responsible**	Banco / Organismo Ejecutor	**Probability Factors**	Se reporta: - Imposibilidad práctica para modificar la MR.
Description of Impact	Dificultad para demostrar el impacto atribuible a las obras que serán financiadas con el Programa.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	Diseñar e implementar evaluación de impacto o medición complementaria.	MITIGATE	ACTIVE	

Details

Estimated Completion Date	Hasta el cierre de la operación	**Budget**	15000	**Responsible**	Banco / Organismo Ejecutor
Completion Date	12/30/2026	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
27	Active	Si las acciones acordadas en los planes de atención de quejas no resuelven efectivamente los impactos reportados, puede persistir la conflictividad con comunidades y afectados, causando nuevas medidas correctivas, mayor exposición reputacional y posibles retrasos.	3 - Medium High	4 - High	High	Business and social environment

Details

Associated Outputs	- Intercambios Taras – La Lima construidos (Fuente BID).	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Scope - Cost - Time
Associated Outcomes	- DISMINUIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR DEL FLUJO DE TRANSPORTE DE CARGA QUE CIRCULA POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - DISMINUIR LOS TIEMPOS DE VIAJE DE LOS VEHÍCULOS QUE CIRCULAN POR LA RVAC QUE CONECTA CON LA GAM - MINIMIZAR LAS EMISIONES GENERADAS POR EL TRANSPORTE EN LA GAM.	**Responsible**	Banco / Organismo Ejecutor	**Probability Factors**	Se reporta: - Quejas activas que reportan incumplimiento del Plan de Acción. - Ausencia de línea base previo a ejecución de obras, actualmente se ha buscado reconstruir líneas base. -Para el caso de las OBIS como lecciones aprendidas se han venido levantado las líneas base.
Description of Impact	Si las acciones acordadas en los planes de acción no solucionan los impactos identificados a nivel socioambiental, generará inconformidad por parte de la comunidad, exposición reputacional y retrasos para implementación de nuevas medidas correctivas.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status
1	Contratar consultoría para fortalecer línea base socioambiental.	MITIGATE	COMPLETE

Details

Estimated Completion Date	Antes del Informe Semestral Siguiente	**Budget**	25000	**Responsible**	Banco / Organismo Ejecutor
Completion Date	10/2/2026	**Funding Source**	TECHNICA	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status
2	Contratar consultoría para reconstrucción de la línea base socioambiental, y que incluye análisis general de las soluciones que se están planteando en el marco del plan de acción acordado, o adicionales en caso de persistir las afectaciones.	MITIGATE	COMPLETE

Details

Estimated Completion Date	Hasta el cierre de la operación	**Budget**	25000	**Responsible**	Banco / Organismo Ejecutor
Completion Date	10/2/2026	**Funding Source**	TECHNICA	**Status Description**	-

MATERIALIZED RISKS

Issue ID	Issue Description
1	Retraso en la aprobación de la Ley en Asamblea Legislativa.

Details

Associated Risk	Si existen atrasos en la creación de un plan para la gestión y aprobacion de ajustes, se presentará una demora en la implementación del modelo de gestión.	**Action**	Se mantuvieron reuniones con diputados para solicitar el apoyo en el trámite del proyecto de Ley.	**Expected Completion Date**	6/30/2020
Operation Impact	Alto	**Lesson Learned**	Gestionar desde etapas tempranas con los diputados que integran la comisión que revisa el tema de contratos préstamos dentro de la Asamblea Legislativa	**Completion Date**	9/29/2020

Issue ID	Issue Description
2	Atrasos en la negociación del Contrato con la UEP y falta de acuerdo para negociar Contrato con el Fiduciario

Details

Associated Risk	Si existe se dan problemas con la aprobacion del directorio del Banco para que GdCR haga el trámite, se pueden dar retrasos en la ratificación de la línea CCLIP por la Asamblea Legislativa.	**Action**	Se realizaron modificaciones al MANOP para ajustar el mecanismo de ejecución.	**Expected Completion Date**	12/31/2020
Operation Impact	Medio Bajo	**Lesson Learned**	Gestionar de manera proactiva, tanto en comunicaciones y luego en el trabajo de manera colaborativa para la actualización del mecanismo de ejecución así como de la actualización del MANOP y del decreto de funciones del CAS	**Completion Date**	7/30/2021

Issue ID	Issue Description					
3	En el I Semestre de 2025, se realizó una Misión Administración en la operación con el objetivo que las partes acordaran la solicitud de extensión del programa.					
	Details					
	Associated Risk	Atrasos en el cronograma de obras debido a imprevistos o eventos compensables que pueden ocasionar atrasos en la fecha de ultimo desembolso del Programa.	**Action**	Desde el I Semestre de 2025, las Partes (Organismo Ejecutor, Prestatario y Banco) han acordado solicitar una extensión a la fecha de último desembolso del Programa programada para septiembre de 2025. A partir de ello se ha acordado extender el plazo de la operación por 24 meses adicionales.	**Expected Completion Date**	9/28/2025
	Operation Impact	Medio Alto	**Lesson Learned**	Gestionar de manera proactiva, mantener comunicación entre las Partes, ha permitido comprender la preocupación de los demás y con esto forjar una visión conjunta para avanzar en los trámites necesarios de cada institución. En las reuniones sostenidas la prioridad se ha mantenido en no afectar el logro de los objetivos de desarrollo propuestos en la operación y más bien maximizar la consecución de los mismos.	**Completion Date**	9/28/2025

Issue ID	Issue Description					
4	Se encuentra en trámite por parte del Organismo Ejecutor y el Prestatario ante el Banco, la solicitud de extensión de la fecha de último desembolso que entre las causas se identifica las indefiniciones para la ejecución del producto 1.02 y concretamente de lo relacionado con el Corredor Vial San José - San Ramón, y las OBIS Ruta 1.					
	Details					
	Associated Risk	Si no se presenta un plan de acción debido a la no intervención de la Ruta No. 1 (OBIS) se puede llegar a requerir una extensión en el plazo del préstamo, o incurrir en la cancelación de los fondos vinculados a estas obras.	**Action**	Desde el I Semestre de 2025, las Partes (Organismo Ejecutor, Prestatario y Banco) han acordado solicitar una extensión a la fecha de último desembolso del Programa programada para septiembre de 2025. A partir de ello se ha acordado extender el plazo de la operación por 24 meses adicionales, con el objetivo de completar las obras del Producto 1.02 OBIS Ruta 1 (Financiamiento BID), además de formalizar un compromiso por parte del Organismo Ejecutor en que se compromete a concluir las obras del Producto 1.02 OBIS Ruta 1 (Financiamiento Local).	**Expected Completion Date**	9/28/2025
	Operation Impact	Alto	**Lesson Learned**	Gestionar de manera proactiva, mantener comunicación entre las Partes, ha permitido comprender la preocupación de los demás y con esto forjar una visión conjunta para avanzar en los trámites necesarios de cada institución. En las reuniones sostenidas la prioridad se ha mantenido en no afectar el logro de los objetivos de desarrollo propuestos en la operación y más bien maximizar la consecución de los mismos.	**Completion Date**	9/28/2025

EVALUATION TRACKING

Medición de resultados y evaluación ex post de obras viales

Evaluation

Evaluation Methodology as per DEM:	N/A
Current Evaluation Methodology:	Cost-Benefit Analysis Ex Post
Stage:	Post-Intervention (Ex-Post)
Main Topic of the Intervention:	TRANSPORT
Other Topics of the Intervention:	ENVIRONMENT, CLIMATE CHANGE AND NATURAL DISASTERS
Main Topic of the Evaluation:	TRANSPORT
Other Topics of the Evaluation:	ENVIRONMENT, CLIMATE CHANGE AND NATURAL DISASTERS

Includia en el Plan de Monitoreo y Evaluación del POD.

Status of the evaluation:	Active
Expected Date of Final Evaluation Report:	10/6/2025
Responsible:	Project Team & External
Information on Responsible:	MOPT

Funding

Source of funding:	Loan
Amount in USD (Thousands):	60000
Code:	CR-L1139
Total amount in USD (Thousands) spent to date in data collection:	0

Comments

10/6/2020	
gmoravargas	

Documents

Stage	Type of document	Name	Document Description	Document Date	Document Number	Document Permissions	Document User
Pre-Internvention (Ex Ante)	Monitoring & Evaluation Plan (As per DEM)	POD CCLIP y CR-L1139 Post QRR 20 de agosto.docx	ver EER#2	8/20/2019	EZSHARE-1127813953-37	Team Members	gmoravargas
Pre-Internvention (Ex Ante)	Evaluation Report Ex-Ante (from DEM)	CR-L1139 Validacion DEM_OPC_SPD.xlsx			EZSHARE-50069516-1	Team Members	gmoravargas

Validation Process


Date	User	Role	Action	Comment	Classification	Workflow
10/05/2026	MARIANOA	Team Leader	Completed by Team Leader		Satisfactory	Progress Monitoring Report September Validation Workflow

MONITORING INDICATORS

Stage 2: After Eligibility


		Benchmark Indicator Value			
Indicator (I)	**Project Indicator Value**	**Satisfactory**	**Alert**	**Problem**	**Traffic Light**
Synthetic Indicator (SI)	2.85	2.5 <= I	2<=I<2.5	I<2	SATISFACTORY
Accumulated disbursements to country's historic disbursements	0.73	1 >= I > 0.57	0.57 >= I >=0.5	0.5 > I >= 0	SATISFACTORY
Cost Performance Index - CPI	0.93	0.80 <= I <= 2.00	0.40 <= I < 0.80	0.00 <= I < 0.40	SATISFACTORY
Cost Performance Index (annual - CPI(a)	1.12	0.80 <= I <= 2.00	0.40 <= I < 0.80	0.00 <= I < 0.40	SATISFACTORY
Schedule Performance Index - SPI	0.55	0.80 <= I <= 2.00	0.40 <= I < 0.80	0.00 <= I < 0.40	ALERT
Schedule Performance Index (annual)- SPI(a)	0.89	0.80 <= I <= 2.00	0.40 <= I < 0.80	0.00 <= I < 0.40	SATISFACTORY
Expected additional execution duration (months)	65.69	N/A	N/A	N/A	For tracking purpose only
Environmental and social safeguards performance rating	Partially Unsatisfactory	N/A	N/A	N/A	For tracking purpose only

Accumulated disbursements as proportion of the total amount

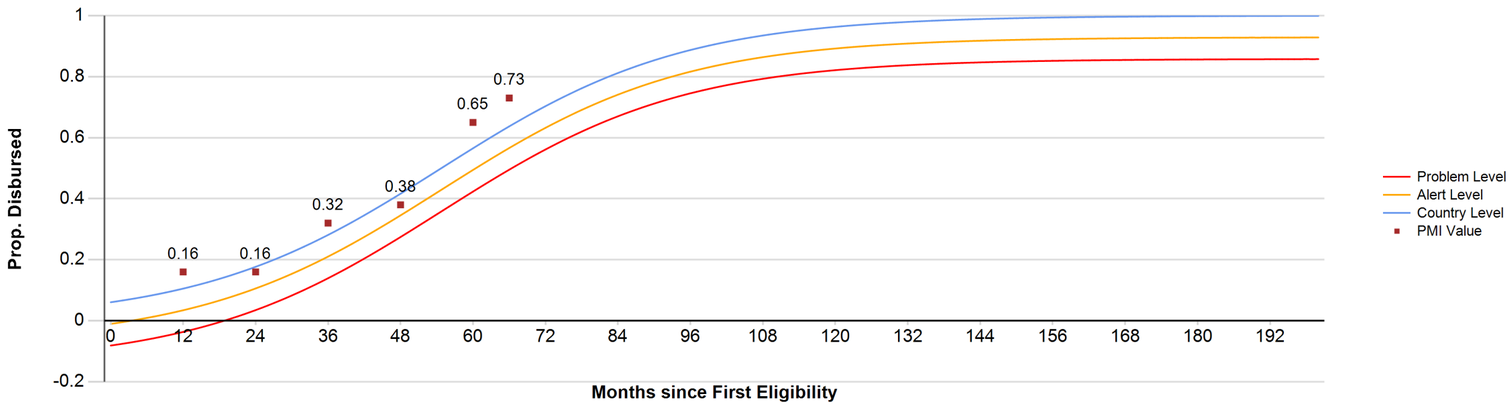


PV, AC, EV, PV(a), EV(a)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PV	5,730,000.00	21,800,000.00	63,410,000.00	116,310,000.00	151,870,000.00	176,000,000.00	176,000,000.00
AC	6,029,568.00	22,548,549.79	32,119,909.97	51,791,923.28	74,158,501.99	97,322,451.74	104,589,346.95
EV	6,029,568.00	22,548,549.79	28,126,382.12	32,183,422.00	77,663,126.01	97,156,993.87	97,186,993.87
PV(a)	5,730,000.00	22,099,568.00	38,172,512.79	58,242,732.89	81,849,156.26	106,787,116.30	132,513,772.75
EV(a)	6,029,568.00	22,548,549.79	28,126,382.12	50,659,240.62	74,050,391.42	104,726,341.97	117,611,227.91

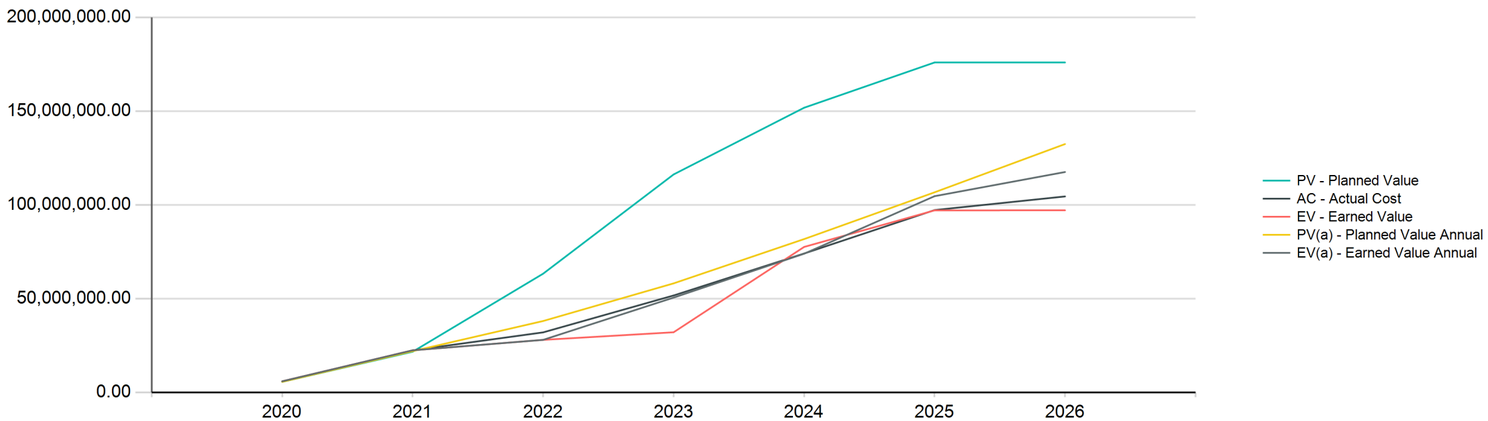

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CPI	1.00	1.00	0.88	0.62	1.05	1.00	0.93
CPI(a)	1.00	1.00	0.88	0.98	1.00	1.08	1.12
SPI	1.05	1.03	0.44	0.28	0.51	0.55	0.55
SPI(a)	1.05	1.02	0.74	0.87	0.90	0.98	0.89

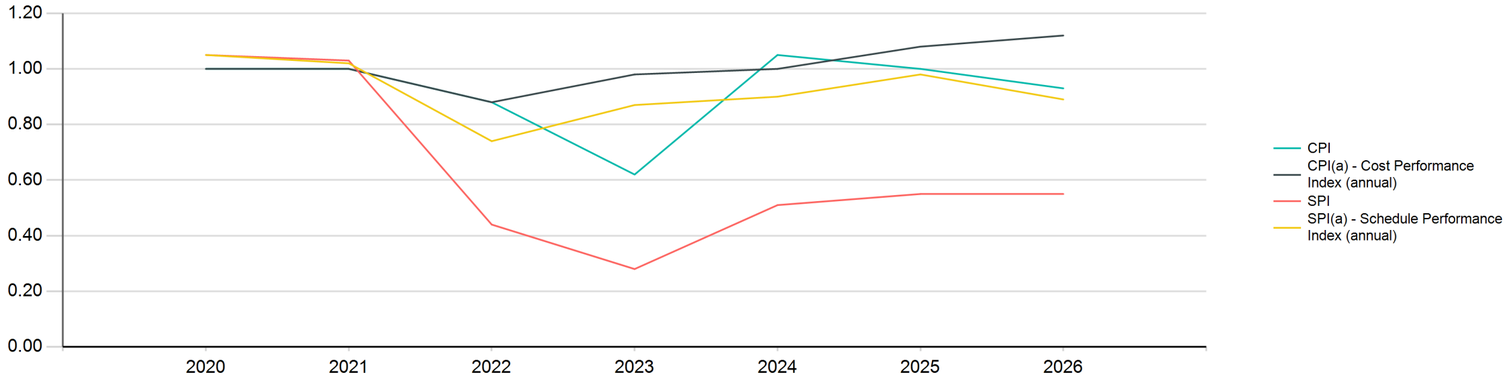
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
CPI
CPI(a) - Cost Performance Index (annual)
SPI
SPI(a) - Schedule Performance Index (annual)
