PMR Operational Report

Operation Number	CR-L1151	**Chief of Operations Validation Date**	
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2026	**Division Chief Validation Date**	
Last Update	10/02/26	**Country Representative Validation Date**	
PMR Validation Stage	Completed by Team Leader		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Road Infrastructure and Urban Mobility Program: resilient connectivity	**Loan Number**	5823/OC-CR
Executing Agency	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE	**Sector/Subsector**	TRANSPORT-TRANSPORT NETWORKS CONNECTIVITY
Team Leader	ANSALDO, MARIANO PEDRO	**Overall Stage**	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	**Country**	Costa Rica
Lending Instrument	Investment Loan	**PMR required**	YES
Borrower	REPUBLICA DE COSTA RICA	**Convergence related Operation(s)**	

Events Data

Supervision	
Signature	01/10/24
Ratification	
Legal Effectiveness	01/10/24
Total Eligibility	07/08/24
Partial Eligibility	07/08/24
First Disbursement	06/23/25
Original Disbursement Expiration	01/10/29
Current Disbursement Expiration	01/10/29

Preparation

On pipeline	02/03/23
Start date	
PP Approved	06/30/23
PCR Approved	10/03/23
ERM	06/27/23
DLP Approved by OPC	10/12/23
Negotiation	10/17/23
Operation Approved	11/15/23

Objective

Improve the competitiveness of the agricultural and tourist productive sectors of the Huetar Norte region. The specific objective is to improve traffic conditions between the northern and central regions in a safe, sustainable, and climate change-resilient manner incorporating gender perspective in their design.

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	A
Risk	High
Safeguard Performance Rating	Satisfactory
Safeguard Performance Rating - Rationale	La operación está en etapas iniciales para su ejecución. En cumplimiento con los requisitos del MPAS, fue desarrollado un Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS), según lo dispuesto en la NDAS 1 que incluye: (i) un Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS), y un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS); (ii) un Plan de Reasentamiento (PR), (iii) un Plan de Gestión del Riesgo de Desastre (PGRD); y (iv) un Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI)). Se desarrolló un Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS) para la operación.

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval	

	Total Cost and Source					Available Funds (US$)			
Operations	**Original IDB**	**Current IDB**	**Local Counterpart**	**Co-Financing / Country**	**Total Original Cost**	**Current IDB**	**Disb. Amount to Date**	**% Disbursed**	**Undisbursed Amount**
CR-L1151	225,000,000	225,000,000	0	0	225,000,000	225,000,000	11,854,567.7	5.27%	213,145,432.3
Aggregated	**225,000,000**	**225,000,000**	**0**	**0**	**225,000,000**	**225,000,000**	**11,854,567.7**	**5.27%**	**213,145,432.3**

Development Effectiveness Matrix


Economic Analysis

Undefined	Yes
Cost benefit analysis	No
Cost effectiveness analysis	No
General economic analysis (Economic rate of return)	No

Evaluation

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Undefined	Yes
Random assignment	No
Non-experimental method	No
Ex-post cost benefit analysis	No
Ex-post cost effectiveness analysis	No
Before/after or With/without comparison	No

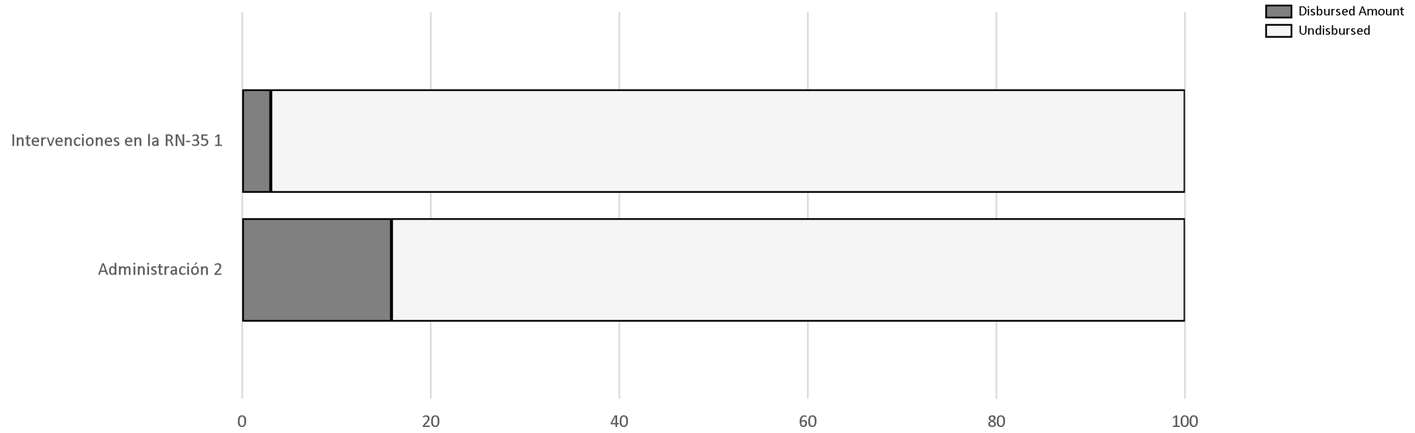

Printed on: October 14, 2026 5:05:52 PM

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Mejorar la competitividad de los sectores productivos agrícola y turístico de la región Huetar Norte.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		EOP 2029
1.10	Índice de Competitividad Nacional (San Ramón)	Puntuación	58.2	2022	2029	P	71.1
						A	-

Details

Means of Verification: Este índice anual muestra el nivel de competitividad de los cantones mediante la medición e interacción de 6 pilares: instituciones, infraestructura, adopción de tecnologías, salud habilidades y dinamismo de mercado

Observations: Referencia: Índice de competitividad Nacional, 2022. https://icn.cr/indice/ Entre 2021 y 2022 se dio un incremento promedio de 1,73 puntos. Como resultado de las intervenciones se ha considerado un aumento de 2 puntos por cada cantón debido a las mejoras en el pilar de infraestructura

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		EOP 2029
1.2	Exportaciones de cadenas de valor estratégicas en la Zona Norte (piñas)	USD millones	335.7	2022	2029	P	363.9
						A	-

Details

Means of Verification: Legiscomex. Los aumentos han sido estimados considerando la elasticidad de la producción agrícola por disminución de tiempos de viaje. Fuente BID : por cada 10% de reducción en tiempo de viaje se da un aumento del 30% en las exportaciones

Observations: Indicador CRF: Logística en América Latina y el Caribe: Oportunidades, desafíos y líneas de acción (Legiscomex, 2022)

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		EOP 2029
1.3	Exportaciones de cadenas de valor estratégicas en la Zona Norte (tubérculos)	USD millones	9.3	2022	2029	P	10.08
						A	-

Details

Means of Verification: Legiscomex. Los aumentos han sido estimados considerando la elasticidad de la producción agrícola por disminución de tiempos de viaje. Fuente BID : por cada 10% de reducción en tiempo de viaje se da un aumento del 30% en las exportaciones

Observations: Indicador CRF: Logística en América Latina y el Caribe: Oportunidades, desafíos y líneas de acción (Legiscomex, 2022)

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		EOP 2029
1.4	Incremento del turismo a la Unidad de Planeamiento Turístico Llanuras del Norte	Visitantes	867999	2019	2029	P	1,548,773
						A	-

Details

Means of Verification: Número de turistas anuales que visitan la zona Llanuras del Norte relativo al total de turistas en el país

Observations: Instituto Costarricense de Turismo, 2019. Estimación de la cantidad de turistas que al menos pernoctaron una noche en la unidad de Planeamiento Turístico Llanuras del Norte sobre el total Nacional.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		EOP 2029
1.5	Índice de Competitividad Nacional (San Carlos)	Puntuación	60.7	2022	2029	P	73.6
						A	-

Details

Means of Verification: Este índice anual muestra el nivel de competitividad de los cantones mediante la medición e interacción de 6 pilares: instituciones, infraestructura, adopción de tecnologías, salud habilidades y dinamismo de mercado

Observations: Referencia: Índice de competitividad Nacional, 2022. https://icn.cr/indice/ Entre 2021 y 2022 se dio un incremento promedio de 1,73 puntos. Como resultado de las intervenciones se ha considerado un aumento de 2 puntos por cada cantón debido a las mejoras en el pilar de infraestructura

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		EOP 2029
1.6	Índice de Competitividad Nacional (Guatuso)	Puntuación	46.7	2022	2029	P	59.6
						A	-

Details

Means of Verification: Este índice anual muestra el nivel de competitividad de los cantones mediante la medición e interacción de 6 pilares: instituciones, infraestructura, adopción de tecnologías, salud habilidades y dinamismo de mercado

Observations: Referencia: Índice de competitividad Nacional, 2022. https://icn.cr/indice/ Entre 2021 y 2022 se dio un incremento promedio de 1,73 puntos. Como resultado de las intervenciones se ha considerado un aumento de 2 puntos por cada cantón debido a las mejoras en el pilar de infraestructura

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No

IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		EOP 2029
1.7	Índice de Competitividad Nacional (Sarapiquí)	Puntuación	49	2022	2029	P	61.9
						A	-

Details

Means of Verification: Este índice anual muestra el nivel de competitividad de los cantones mediante la medición e interacción de 6 pilares: instituciones, infraestructura, adopción de tecnologías, salud habilidades y dinamismo de mercado

Observations: Referencia: Índice de competitividad Nacional, 2022. https://icn.cr/indice/ Entre 2021 y 2022 se dio un incremento promedio de 1,73 puntos. Como resultado de las intervenciones se ha considerado un aumento de 2 puntos por cada cantón debido a las mejoras en el pilar de infraestructura

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Gender-related	No	Indigenous people-related	No	Afrodescendats-related	No	Persons with disabilities-related	No	LGBTQ+ individuals-related	No

IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		EOP 2029
1.8	Índice de Competitividad Nacional (Upala)	Puntuación	45.7	2022	2029	P	58.6
						A	-

Details

Means of Verification: Este índice anual muestra el nivel de competitividad de los cantones mediante la medición e interacción de 6 pilares: instituciones, infraestructura, adopción de tecnologías, salud habilidades y dinamismo de mercado

Observations: Referencia: Índice de competitividad Nacional, 2022. https://icn.cr/indice/ Entre 2021 y 2022 se dio un incremento promedio de 1,73 puntos. Como resultado de las intervenciones se ha considerado un aumento de 2 puntos por cada cantón debido a las mejoras en el pilar de infraestructura

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Gender-related	No	Indigenous people-related	No	Afrodescendats-related	No	Persons with disabilities-related	No	LGBTQ+ individuals-related	No

IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		EOP 2029
1.9	Índice de Competitividad Nacional (Los Chiles)	Puntuación	41	2022	2029	P	53.9
						A	-

Details

Means of Verification: Este índice anual muestra el nivel de competitividad de los cantones mediante la medición e interacción de 6 pilares: instituciones, infraestructura, adopción de tecnologías, salud habilidades y dinamismo de mercado

Observations: Referencia: Índice de competitividad Nacional, 2022. https://icn.cr/indice/ Entre 2021 y 2022 se dio un incremento promedio de 1,73 puntos. Como resultado de las intervenciones se ha considerado un aumento de 2 puntos por cada cantón debido a las mejoras en el pilar de infraestructura

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Gender-related	No	Indigenous people-related	No	Afrodescendats-related	No	Persons with disabilities-related	No	LGBTQ+ individuals-related	No

IF Contribution									

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Mejorar las condiciones de circulación entre las zonas norte y centro del país de forma segura, sostenible y resiliente al CC, incorporando en su diseño la perspectiva de género

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2029	EOP 2029
0.0	R.1.1 Tiempo promedio de recorrido por vehículo en el tramo Florencia RN-1 (vehículos livianos)	Minutos	102	2020	P	-	36
					A	-	-

Details

Means of Verification: Estudios de tránsito para determinar la medición de tiempo
Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2029	EOP 2029
0.3	R.1.1 Tiempo promedio de recorrido por vehículo en el tramo Florencia RN-1 (vehículos pesados y transporte público)	Minutos	126	2020	P	-	45
					A	-	-

Details
Means of Verification: Estudios de tránsito para determinar la medición de tiempo
Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2029	EOP 2029
0.4	R.1.2 Costo de operación vehicular en el tramo de Florencia RN-1 (vehículo liviano)	US$	27.17	2020	P	-	22.66
					A	-	-

Details
Means of Verification: Evaluación ex post por el MOPT
Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2029	EOP 2029
0.4	R.1.2 Costo de operación vehicular en el tramo de Florencia RN-1 (Transporte de carga)	US$	66.07	2020	P	-	55.11
					A	-	-

Details
Means of Verification: Evaluación ex post por el MOPT
Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2029	EOP 2029
0.5	R.1.2 Costo de operación vehicular en el tramo de Florencia RN-1 (Transporte Público)	US$	63.6	2020	P	-	53.05
					A	-	-

Details
Means of Verification: Evaluación ex post por el MOPT
Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2029	EOP 2029
0.5	R.1.3. Nivel de seguridad vial (cantidad de estrellas mediante la metodología de iRAP) de la RN-35	Estrellas	0	2023	P	-	3
					A	-	-

Details

Means of Verification: Evaluación iRAP en la RN-35 al final del programa

Observations: Evaluación de la infraestructura peatonal y ciclista en las áreas urbanas únicamente

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution								

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2029	EOP 2029
0.6	R.1.4. Participación femenina del personal de contratista en la ejecución de las obras	%	3	2023	P	-	6
					A	-	-

Details

Means of Verification: Informes del MOPT

Observations: Se evaluará el porcentaje de mujeres empleadas en labores de construcción de las obras respecto a la fuerza laboral total del contratista en el mismo proyecto.

Evaluation Methodology: -

Gender-related	Yes	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution								

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2029	EOP 2029
0.7	R.1.5. Sitios de la vía en el tramo de Abundancia Sifón (Tramo Central) afectados por inundaciones debido a precipitaciones con un período de retorno de 100 años.	Und	30	2023	P	-	-
					A	-	-

Details

Means of Verification: Informes MOPT. Corresponde a un inventario de drenajes menores existentes en el tramo Abundancia Sifón (Tramo Central) con potencial de inundación, que requieren ser demolidos y repuestos con obras de mayor capacidad hidráulica. Recopilado a través de: Estudio de Hidrología de la FTA RN-53 (Tramo Central) Anexo 4, Drenaje Transversal. Apéndice III-2: Resultados de Verificación. Situación de obras propuestas. Tabla: Comprobación para Tr 100 años - Columna: Tipo de obra. Página 4.

Observations: Diseños factibilidad IDOM. Análisis de Capacidad Hidráulica de Alcantarillas existentes, respecto a escenarios de CC.

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution								

RESULTS MATRIX

OUTPUTS PHYSICAL PROGRESS

Component Nbr. 1: Intervenciones en la RN-35

	Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2029
1.1	Tramo Central Sección Sifón - Sucre de la RN-35 mejorado e incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC	Km	P	0	0	0	0	4.5	4.5
			P (a)	0	0	0	0	4.5	4.5
			A	0	0	-	-	-	0

Details

Means of Verification: Informes semestrales de progreso

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2029
1.2	Obras complementarias en el Tramo Central Sección Sucre - Abundancia de la RN-35 desarrolladas e incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC	Proyecto	P	0	0	0	0	1	1
			P (a)	0	0	0	0	1	1
			A	0	0	-	-	-	0

Details

Means of Verification: Informes semestrales de progreso

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2029
1.3	Punta Sur de la RN-35 diseñado y construido, incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC	Km	P	0	0	0	0	8	8
			P (a)	0	0	0	0	8	8
			A	0	0	-	-	-	0

Details

Means of Verification: Informes semestrales de progreso

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2029
1.4	Obras complementarias en la Punta Norte de la RN-35 desarrolladas (ie. Iluminación)	Proyecto	P	0	0	1	0	0	1
			P (a)	0	0	1	0	0	1
			A	0	0.5	-	-	-	0.5

Details

Means of Verification: Informes Semestrales de Progreso. Actas de recepción de Obras recibidas a satisfacción del MOPT

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2029
1.5	Plan de mejora de las capacidades de gestión de riesgo de desastres y CC diseñado e implementado	Plan	P	0	0	1	0	0	1
			P (a)	0	0	1	0	0	1
			A	0	0	-	-	-	0

Details

Means of Verification: Informes Semestrales de Progreso. Documento de Plan.

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2029
1.6	Guía de indicadores mínimos para el monitoreo de la gestión de operación y mantenimiento del corredor RN-35	Guía	P	0	0	1	0	0	1
			P (a)	0	0	1	0	0	1
			A	0	0	-	-	-	0

Details

Means of Verification: Documento de Guía de indicadores.

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2029
1.7	Plan de comunicación para promoción de prácticas seguras de conducción en el corredor	Plan	P	0	0	0	0	1	1
			P (a)	0	0	0	0	1	1
			A	0	0	-	-	-	0

Details

Means of Verification: Documento de Plan de comunicación.

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2029
1.8	Programa de capacitación a funcionarios públicos para el diseño de pliegos con enfoque de género y ordenamiento ecológico de la RN-35	Programa	P	0	1	0	0	0	1
			P (a)	0	1	1	0	0	2
			A	0	0	-	-	-	0

Details

Means of Verification:

Gender-related	Yes	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

OUTPUTS FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1: Intervenciones en la RN-35

Component revised cost: 223,276,739.89

	Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2029
1.1	Tramo Central Sección Sifón - Sucre de la RN-35 mejorado e incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC	Km	P	1,200,000	24,067,500	85,082,000	80,350,500	1,100,000	191,800,000
			P (a)	1,200,000	210,780	1,378,338.52	1,378,338.52	447,669.26	3,423,806.3
			A	8,680	37,126.49	-	-	-	45,806.49

Details

Means of Verification: Informes semestrales de progreso

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2029
1.2	Obras complementarias en el Tramo Central Sección Sucre - Abundancia de la RN-35 desarrolladas e incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC	Proyecto	P	0	2,292,000	1,783,000	0	0	4,075,000
			P (a)	0	0	4,276,739.88	0	0	4,276,739.88
			A	0	0	-	-	-	0

Details

Means of Verification: Informes semestrales de progreso

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2029
1.3	Punta Sur de la RN-35 diseñado y construido, incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC	Km	P	2,160,000	6,047,500	10,655,500	3,237,000	0	22,100,000
			P (a)	2,160,000	9,926,831.91	125,896,015.02	72,902,198.09	825,905.7	214,170,746.91
			A	4,619,796.19	1,608,200	-	-	-	6,227,996.19

Details

Means of Verification: Informes semestrales de progreso

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2029
1.4	Obras complementarias en la Punta Norte de la RN-35 desarrolladas (ie. Iluminación)	Proyecto	P	0	900,000	0	0	0	900,000
			P (a)	0	837,507.91	400,000	0	0	1,280,446.8
			A	42,938.89	517,061.11	-	-	-	560,000

Details

Means of Verification: Informes Semestrales de Progreso. Actas de recepción de Obras recibidas a satisfacción del MOPT

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2029
1.5	Plan de mejora de las capacidades de gestión de riesgo de desastres y CC diseñado e implementado	Plan	P	0	32,000	18,000	0	0	50,000
			P (a)	0	32,000	18,000	0	0	50,000
			A	0	0	-	-	-	0

Details

Means of Verification: Informes Semestrales de Progreso. Documento de Plan.

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2029
1.6	Guía de indicadores mínimos para el monitoreo de la gestión de operación y mantenimiento del corredor RN-35	Guía	P	0	0	25,000	0	0	25,000
			P (a)	0	0	25,000	0	0	25,000
			A	0	0	-	-	-	0

Details

Means of Verification: Documento de Guía de indicadores.

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2029
1.7	Plan de comunicación para promoción de prácticas seguras de conducción en el corredor	Plan	P	0	0	25,000	0	0	25,000
			P (a)	0	0	25,000	0	0	25,000
			A	0	0	-	-	-	0

Details

Means of Verification: Documento de Plan de comunicación.

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2029
1.8	Programa de capacitación a funcionarios públicos para el diseño de pliegos con enfoque de género y ordenamiento ecológico de la RN-35	Programa	P	0	0	25,000	0	0	25,000
			P (a)	0	0	25,000	0	0	25,000
			A	0	0	-	-	-	0

Details

Means of Verification:

Gender-related	Yes	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

Other Costs

		2025	2026	2027	2028	2029	Cost
Gestión, auditoría y evaluación del programa	P	991,700	1,441,000	1,432,000	1,477,500	657,800	6,000,000
	P (a)	991,700	1,847,459.17	1,276,916.68	1,549,585.68	721,641.32	6,000,000
	A	604,397.15	575,034.13	-	-	-	1,179,431.28

Total Costs

		2025	2026	2027	2028	2029	Cost
Total Cost	P	4,351,700	34,780,000	99,045,500	85,065,000	1,757,800	225,000,000

Total Cost	P (a)	4,351,700	12,854,578.99	133,321,010.1	75,830,122.29	1,995,216.28	229,276,739.89
	A	5,275,812.23	2,737,421.73	-	-	-	8,013,233.96

CORPORATE INDICATORS

IF INDICATORS

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Categories	2025	2026	2027	2028	2029	EOP 2029
1	2.19 People with enhanced access to sustainable transportation infrastructure or services	# of beneficiaries		2023	P	-	-	-	-	-	-
					P (a)	-	-	-	-	-	-
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Evaluación Ex-Post por el MOPT

Observations:

Change Matrix

Section	Name	Reasons	Related Documents	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System	Agreed with Execution Agency
Output	Obras complementarias en la Punta Norte de la RN-35 desarrolladas (ie. Iluminación)	Ajustes, conforme Informe Semestral del primer semestre del 2026, ver ID DOCs EZIDB0000642-1853049126-14 del Informe Semestral	2026 5823-OC-CR Informe Semestral de Progreso 1° Semestre 2026.pdf	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GMORAVARGAS	10/2/2026	
Output	Programa de capacitación a funcionarios públicos para el diseño de pliegos con enfoque de género y ordenamiento ecológico de la RN-35	Ajustes, conforme Informe Semestral del primer semestre del 2026, ver ID DOCs EZIDB0000642-1853049126-14 del Informe Semestral	2026 5823-OC-CR Informe Semestral de Progreso 1° Semestre 2026.pdf	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	GMORAVARGAS	10/2/2026	
Output	Punta Sur de la RN-35 diseñado y construido, incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC	Ajustes, conforme Informe Semestral del primer semestre del 2026, ver ID DOCs EZIDB0000642-1853049126-14 del Informe Semestral	2026 5823-OC-CR Informe Semestral de Progreso 1° Semestre 2026.pdf	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GMORAVARGAS	10/2/2026	
Output	Tramo Central Sección Sifón - Sucre de la RN-35 mejorado e incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC	Ajustes, conforme Informe Semestral del primer semestre del 2026, ver ID DOCs EZIDB0000642-1853049126-14 del Informe Semestral	2026 5823-OC-CR Informe Semestral de Progreso 1° Semestre 2026.pdf	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GMORAVARGAS	10/2/2026	

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Status of the Implementation

Durante el I Semestre de 2026, el Organismo Ejecutor (OE) reporta avances en la ejecución de los productos correspondientes al Componente 1: Intervenciones en la Ruta Nacional No. 35. Al cierre del período, el Programa registra desembolsos acumulados por US$13,25 millones, equivalentes al 5,89% de los recursos BID, de los cuales se habían justificado US$7,91 millones.Los productos 1.1 Tramo Central y 1.2 Obras Complementarias del Tramo Central se encuentran en proceso de redefinición de su estrategia de contratación y fuente de financiamiento. La contratación CR-L1151-P00004 para el diseño y construcción del Tramo Central figura pendiente de cancelación, y se prevé que las obras sean financiadas con recursos nacionales, con la expectativa de formalizar la adjudicación durante el segundo semestre de 2026.El indicador de producto 1.3 Punta Sur, ejecutado bajo la contratación CR-L1151-P00003 “Diseño y Construcción de Punta Sur”, reporta un avance del 75% en la fase de diseño y avances en trabajos preliminares, movimientos de tierra, drenajes, pavimentos y cimentaciones, aunque aún no se reportan kilómetros totalmente terminados.El indicador de producto 1.4 Obras Complementarias Punta Norte, ejecutado mediante la contratación CR-L1151-P00001, finalizó en mayo de 2026 las obras de iluminación y seguridad vial, quedando pendientes obras menores, entre ellas pasos de fauna, cuya contratación se encuentra en preparación.Con respecto a los otros indicadores, los productos 1.5 Plan de mejora de las capacidades de gestión de riesgo y cambio climático, 1.6 Guía de indicadores para monitoreo de la gestión de operación y mantenimiento y 1.8 Programa de capacitación a funcionarios públicos para el diseño de pliegos con enfoque de género, se mantienen pendientes de inicio, previéndose avanzar con sus contrataciones durante el segundo semestre de 2026. Para el producto 1.7 Plan de comunicación para promoción de prácticas seguras de conducción, se prevé iniciar en 2027.

Likelihood of Achieving Development Objectives

Medium	La ejecución de los productos previstos permite mantener una probabilidad media de alcanzar los objetivos de desarrollo. Como aspectos positivos se tiene: (i) avance del diseño de Punta Sur al 75% e inicio de actividades constructivas; (ii) contratos clave para la ejecución del Programa en operación, incluyendo la administración de contratos FIDIC y la gestión financiera; y (iii) estructura institucional de la UEP operativa. Entre los principales riesgos se mantienen: retrasos y redefinición de la estrategia de contratación y financiamiento del Tramo Central; limitaciones presupuestarias que podrían afectar el alcance previsto; baja ejecución financiera respecto del avance temporal del Programa. En relación con la Evaluación Intermedia del Programa, cuya fecha contractual correspondía a julio de 2026, el Organismo Ejecutor solicitó al Banco su reprogramación para julio de 2027, con el fin de que esta incorpore hitos relevantes previstos para la segunda mitad de 2026 y permita una valoración más representativa del avance, los riesgos y las medidas de mitigación del Programa. La hoja de ruta propuesta contempla la contratación y ejecución de una consultoría especializada durante 2027.

Lesson Learned

Category	Lesson Learned	Entered in System
Intra/Inter Coordination, Project Management Capacity, Acquisitions and Procurement - Bidding Stage	La limitada experiencia institucional en la administración de contratos FIDIC durante las primeras etapas del Programa fue una de las dificultades identificadas durante la ejecución. Esta situación generó demoras en la toma de decisiones y una gestión principalmente reactiva de avisos, reclamos y variaciones contractuales. Para atender esta necesidad, se contrató apoyo especializado externo para la administración de los contratos y el acompañamiento técnico de la Unidad Ejecutora. Si bien esta medida fortaleció la gestión contractual, también evidenció el riesgo de mantener una dependencia prolongada de asesores externos si el conocimiento adquirido no se transfiere de manera sistemática al personal institucional. Como lección aprendida, se obtuvo que la capacidad institucional para administrar contratos FIDIC podría fortalecerse mediante las siguientes actividades: 1. Implementar desde etapas tempranas un programa estructurado de capacitación y transferencia de conocimiento. 2. Definir claramente responsabilidades, plazos y criterios para la toma de decisiones contractuales. 3. Documentar procedimientos, casos y lecciones derivadas de avisos, reclamos y variaciones. 4. Incorporar dentro de los servicios especializados productos específicos de capacitación, manuales y acompañamiento práctico al personal institucional.	10/2/2026
Intra/Inter Coordination, Acquisitions and Procurement - Bidding Stage	La contratación del Tramo Central presentó una alta complejidad técnica y financiera, requiriendo evaluaciones prolongadas, múltiples instancias de revisión y ajustes en la estrategia de contratación. Esta situación convirtió el proceso de adquisición en un elemento crítico de la programación del Programa, de manera que los retrasos en la evaluación y adjudicación incidieron en la planificación física y financiera y en el inicio previsto de las obras. Como lección aprendida, las adquisiciones de alta complejidad deberían gestionarse como procesos específicos dentro del Programa, con análisis de mercado desde etapas tempranas, estrategia de contratación definida, responsabilidades claras, cronograma de aprobaciones y puntos de decisión para determinar oportunamente si corresponde continuar, ajustar o relanzar el proceso. Asimismo, resulta conveniente integrar estos hitos a la ruta crítica y mantener un expediente documental consolidado que facilite la trazabilidad de las decisiones.	10/2/2026

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
1	Active	No contar con el derecho de vía liberado en tiempo, conforme lo establecido en el plan de acción y definición de Unidades Funcionales, podría ocasionar afectaciones en el plazo estimado de obra y/o sobrecostos por modificación de diseño y cronograma de actividades.	3 - Medium High	3 - Medium High	High	Legislation and regulation

Details

Associated Outputs	- Tramo Central Sección Sifón - Sucre de la RN-35 mejorado e incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Scope
Associated Outcomes	- Mejorar las condiciones de circulación entre las zonas norte y centro del país de forma segura, sostenible y resiliente al CC, incorporando en su diseño la perspectiva de género	**Responsible**	Organismo Ejecutor	**Probability Factors**	Número de predios y actores; duración de trámites administrativos y judiciales; interferencias; dependencias entre liberación de terrenos, diseño y secuencia constructiva
Description of Impact	Desplazamiento de hitos contractuales, frentes improductivos, variaciones, reclamos y aumento del costo final				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	Estrategia de implementación del Plan de Acción Predial para priorizar y agilizar la gestión del derecho de vía según los requerimientos técnicos del proyecto.	MITIGATE	ACTIVE	

Details

Estimated Completion Date	Hasta finalizar el proceso de contratación de las obras del programa	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
Completion Date	1/9/2029	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status	
2	Seguimiento al avance en la liberación de expedientes y plan de acción para los expedientes en proceso.	MITIGATE	ACTIVE	

Details

Estimated Completion Date	Hasta finalización y entrega de las obras del programa	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
Completion Date	1/9/2029	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
	Active	Si por la magnitud y complejidad de las obras los procesos de precalificación no son exitosos, podría haber un número bajo de empresas oferentes y que firmas cuestionadas (no sancionadas) participen en los procesos, impactando en el cronograma, las metas y/o la calidad de productos del programa.	2 - Medium Low	4 - High	Medium High	Rule of law

Details

Associated Outputs	- Punta Sur de la RN-35 diseñado y construido, incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC - Tramo Central Sección Sifón - Sucre de la RN-35 mejorado e incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Quality - Cost - Time - Scope
Associated Outcomes	- Mejorar las condiciones de circulación entre las zonas norte y centro del país de forma segura, sostenible y resiliente al CC, incorporando en su diseño la perspectiva de género	**Responsible**	Organismo Ejecutor	**Probability Factors**	Alto monto y complejidad técnica; número limitado de firmas con capacidad; consorcios; necesidad de debida diligencia; y posibilidad de protestas o impugnaciones.
Description of Impact	Demora en adjudicación e inicio, menor competencia, incremento de costos, controversias y afectación de la confianza en el proceso.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status
1	Mantener informadas a las empresas sobre las enmiendas a los pliegos y visitas de obra.	MITIGATE	ACTIVE

Details

Estimated Completion Date	Hasta finalizar el proceso de contratación de las obras del programa	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
Completion Date	1/9/2029	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status
2	Talleres y comunicación continua con empresas interesadas	MITIGATE	ACTIVE

Details

Estimated Completion Date	Hasta finalizar el proceso de contratación de las obras del programa	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
Completion Date	1/9/2029	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status
3	Realizar RFI internacional y difusión para atraer oferentes calificados	MITIGATE	ACTIVE

Details

Estimated Completion Date	Inicio de precalificación	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
Completion Date	1/31/2027	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status
4	Previo a la etapa de prelicitación el Organismo Ejecutor publicará un Request For Information dirigido a captar empresas interesadas, utilizando embajadas y redes de negocios para su difusión. El RFI dará ideas sobre el perfil buscado (tareas y magnitud que se requieren.	MITIGATE	COMPLETE

Details

Estimated Completion Date	Hasta el inicio de la precalificación para los procesos de contratación de obras	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
Completion Date	3/19/2025	**Funding Source**	LOCALCOU	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
3	Inactive	Si no se cuenta con la unidad de administración y gestión de los contratos FIDIC previo a la adjudicación de los contratos de obra, se demoraría el inicio de las obras y dificultaraía la implementación de los procesos internos según los contratos para la rendición de cuentas	2 - Medium Low	4 - High	Medium High	Project management capacity

Details

Associated Outputs	- Punta Sur de la RN-35 diseñado y construido, incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC - Tramo Central Sección Sifón - Sucre de la RN-35 mejorado e incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC	**Source of Risk**	Institutional capacity	**Type of Impact**	- Quality - Time - Scope
Associated Outcomes	- Mejorar las condiciones de circulación entre las zonas norte y centro del país de forma segura, sostenible y resiliente al CC, incorporando en su diseño la perspectiva de género	**Responsible**	Organismo Ejecutor	**Probability Factors**	Capacidades institucionales limitadas
Description of Impact	Ineficiencias en ejecución contractual.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	En el Reglamento Operativo del Programa, el Organismo Ejecutor establecerá el mecanismo de gestión y ejecución del programa, integrando las responsabilidades para cada uno de los especialistas por área de acción así como el rol de la firma a cargo de la administración y gestión de los contratos FIDIC.	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	Hasta el cumplimiento de las condiciones contractuales para primer desembolso	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
Completion Date	3/19/2025	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status	
2	Gestionar de manera ágil y efectiva la elaboración de los TdR para la contratación directa del consultor y optimizar proceso de negociación con el mismo para que el inicio se de en el tiempo adecuado.	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	3 Mar 2025	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
Completion Date	2/28/2025	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
4	Inactive	Si no se cuenta con una definición concreta del alcance de las obras por parte de las jerarquías se podría demorar la elaboración de los pliegos de licitación y se incrementa el nivel de incertiumbre para el contratista lo que se traduce en ofertas económicas más altas de lo presupuestado	2 - Medium Low	3 - Medium High	Medium High	Project management capacity

Details

Associated Outputs	- Punta Sur de la RN-35 diseñado y construido, incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC - Tramo Central Sección Sifón - Sucre de la RN-35 mejorado e incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC	**Source of Risk**	Institutional capacity	**Type of Impact**	- Time - Cost
Associated Outcomes	- Mejorar las condiciones de circulación entre las zonas norte y centro del país de forma segura, sostenible y resiliente al CC, incorporando en su diseño la perspectiva de género	**Responsible**	Organismo Ejecutor	**Probability Factors**	-
Description of Impact	-				

Response Actions

1

Response Description		**Management Strategy**		**Status**	
Para la etapa de elaboración de pliegos el Banco ha provisto apoyo al Organismo Ejecutor mediante asistencia y acompañamiento para conformar un equipo especializado en contratos FIDIC.		MITIGATE		COMPLETE	
Details					
Estimated Completion Date	Hasta finalizar el proceso de contratación de las obras del programa	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
Completion Date	11/6/2025	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

2

Response Description		**Management Strategy**		**Status**	
Involucrar en la elaboración de los pliegos de licitación a los especialistas de la UEP y del BID para generar documentos completos y de acuerdo con los requerimientos del proyecto y la normativa. Además de aplicar las lecciones aprendidas de otros proyectos y programas		MITIGATE		COMPLETE	
Details					
Estimated Completion Date	Hasta finalizar el proceso de contratación de las obras del programa	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
Completion Date	3/17/2026	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
5	Inactive	Si los proyectos no logran ejecutar el alcance planificado por limitaciones presupuestarias o técnicas, se ponen en riesgo los objetivos estratégicos del Programa y los compromisos establecidos en el contrato de préstamo, afectando la credibilidad institucional y la disponibilidad de financiamiento futuro	4 - High	4 - High	High	Macroeconomic environment

Details

Associated Outputs	- Punta Sur de la RN-35 diseñado y construido, incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC - Tramo Central Sección Sifón - Sucre de la RN-35 mejorado e incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Time - Cost - Scope
Associated Outcomes	- Mejorar las condiciones de circulación entre las zonas norte y centro del país de forma segura, sostenible y resiliente al CC, incorporando en su diseño la perspectiva de género	**Responsible**	Organismo Ejecutor	**Probability Factors**	Incremento de costos, restricciones fiscales, incertidumbre en alcance.
Description of Impact	Incumplimiento de metas del programa, necesidad de ajustes de alcance o financiamiento adicional				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	Implementar herramientas de monitoreo y control para garantizar el cumplimiento del alcance en tiempo y forma.	MITIGATE	INACTIVE	

Details

Estimated Completion Date	Hasta finalización y entrega de las obras del programa	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
Completion Date	1/9/2029	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
6	Active	No contar con los planes y permisos ambientales vigentes y actualizados podría ocasionar una demora en el inicio de las obras, impactando negativamente en la imagen del MOPT	2 - Medium Low	2 - Medium Low	Medium Low	Business and social environment

Details

Associated Outputs	- Punta Sur de la RN-35 diseñado y construido, incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC - Tramo Central Sección Sifón - Sucre de la RN-35 mejorado e incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Scope - Time - Cost - Quality
Associated Outcomes	- Mejorar las condiciones de circulación entre las zonas norte y centro del país de forma segura, sostenible y resiliente al CC, incorporando en su diseño la perspectiva de género	**Responsible**	Organismo Ejecutor	**Probability Factors**	Múltiples permisos y autoridades; relación entre diseño definitivo y viabilidad; cambios de frente; condiciones de las resoluciones ambientales; y plazos de revisión institucional.
Description of Impact	Paralización o limitación de trabajos, medidas correctivas, sanciones, reprogramación contractual y pérdida de confianza.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	Seguimiento por parte del equipo de regencia ambiental de los trámites de gestión ambiental requeridos para la ejecución de las obras.	MITIGATE	ACTIVE	

Details

Estimated Completion Date	Hasta finalización y entrega de las obras del programa	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
Completion Date	1/9/2029	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
7	Active	Si no se gestiona a los interesados del proyecto de manera oportuna y adecuada, puede presentarse oposición al proyecto por parte de la comunidad y/o diferentes actores, lo que afectaría el desarrollo y flujo del proyecto de acuerdo con lo planificado	3 - Medium High	3 - Medium High	High	Legislation and regulation

Details

Associated Outputs	- Punta Sur de la RN-35 diseñado y construido, incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Time - Cost - Scope - Quality
Associated Outcomes	- Mejorar las condiciones de circulación entre las zonas norte y centro del país de forma segura, sostenible y resiliente al CC, incorporando en su diseño la perspectiva de género	**Responsible**	Organismo Ejecutor	**Probability Factors**	Diversidad de comunidades e instituciones; afectaciones temporales por construcción; cambios en accesos y movilidad; expectativas de empleo y compensación; y circulación de información no verificada.
Description of Impact	Bloqueos o restricciones de acceso, aumento de quejas, necesidad de reprogramar trabajos, escalamiento institucional y deterioro de la confianza en el Programa.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	Llevar a cabo y dar seguimiento al plan de gestión de interesados para abordarlos de acuerdo con sus requerimientos y necesidades.	MITIGATE	ACTIVE	

Details

Estimated Completion Date	Hasta finalización y entrega de las obras del programa	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
Completion Date	1/9/2029	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
8	Inactive	Si no se implementa en tiempo y en forma un sistema digital para la gestión documental y procesal del Programa, las actividades, procesos, procedimientos y rendición de cuentas se dificultaría la ejecución de los mismos y se extenderían los plazos	2 - Medium Low	3 - Medium High	Medium High	Project management capacity

Details

Associated Outputs	- Punta Sur de la RN-35 diseñado y construido, incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC - Tramo Central Sección Sifón - Sucre de la RN-35 mejorado e incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC	**Source of Risk**	Institutional capacity	**Type of Impact**	- Scope - Time
Associated Outcomes	- Mejorar las condiciones de circulación entre las zonas norte y centro del país de forma segura, sostenible y resiliente al CC, incorporando en su diseño la perspectiva de género	**Responsible**	Organismo Ejecutor	**Probability Factors**	-
Description of Impact	-				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	Gestionar en tiempo y forma la contratación de un experto asesor en la implementación del sistema de gestión que requiere el Programa durante toda la duración de este	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	Hasta la contratación del consultor	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
Completion Date	3/17/2026	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
9	Materialized	Recibir ofertas por encima del presupuesto estimado podría invalidar los procesos para replantear los alcances de los trabajos o la adición de recursos	4 - High	4 - High	High	Macroeconomic environment

Details

Associated Outputs	- Obras complementarias en el Tramo Central Sección Sucre - Abundancia de la RN-35 desarrolladas e incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC - Punta Sur de la RN-35 diseñado y construido, incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC - Tramo Central Sección Sifón - Sucre de la RN-35 mejorado e incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Cost
Associated Outcomes	- Mejorar las condiciones de circulación entre las zonas norte y centro del país de forma segura, sostenible y resiliente al CC, incorporando en su diseño la perspectiva de género	**Responsible**	Organismo Ejecutor	**Probability Factors**	Inflación en costos de construcción, limitada competencia, incertidumbre en alcance
Description of Impact	limitada competencia, incertidumbre en alcance Retrasos en adjudicación, relicitaciones, incremento de costos y presión sobre financiamiento				

Response Actions

	Response Description		Management Strategy		Status	
1	Actualizar análisis de mercado y ajustar estimaciones de costos		MITIGATE		INACTIVE	
	Details					
	Estimated Completion Date	Hasta finalizar el proceso de contratación de las obras del programa	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
	Completion Date	1/9/2029	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

	Response Description		Management Strategy		Status	
2	Gestionar coordinación interinstitucional para ajustes presupuestarios		MITIGATE		INACTIVE	
	Details					
	Estimated Completion Date	Hasta finalización y entrega de las obras del programa	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
	Completion Date	1/9/2029	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
10	Inactive	No contar con el compromiso formal por parte del Ministerio de Hacienda para la disposición de recursos para finalizar las obras en Barranca – Limonal – Angostura de acuerdo con el Modificatorio No. 1 a los Contratos de Préstamos Nos. 3071/OC-CR y 3072/CH-CR, impediría el uso de los fondos de la Operación CR-L-1151 asignados al contrato de obra de Punta Sur	1 - Low	4 - High	Medium Low	Political stability

Details

Associated Outputs	- Obras complementarias en el Tramo Central Sección Sucre - Abundancia de la RN-35 desarrolladas e incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC - Punta Sur de la RN-35 diseñado y construido, incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC - Tramo Central Sección Sifón - Sucre de la RN-35 mejorado e incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Scope
Associated Outcomes	- Mejorar las condiciones de circulación entre las zonas norte y centro del país de forma segura, sostenible y resiliente al CC, incorporando en su diseño la perspectiva de género	**Responsible**	Organismo Ejecutor	**Probability Factors**	Restricciones fiscales y legislativas
Description of Impact	Limitación en ejecución financiera y retrasos en obras				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status
1	Solicitud formal a los jerarcas del Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Hacienda para la incorporación de los recursos, evidenciando el riesgo asociado	MITIGATE	COMPLETE

Details

Estimated Completion Date	Hasta la aprobación en Asamblea Legislativa de la Ley del presupuesto nacional.	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
Completion Date	9/29/2025	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status
2	Seguimiento a la gestión y trámite en el presupuesto nacional.	MITIGATE	COMPLETE

Details

Estimated Completion Date	Hasta la aprobación en Asamblea Legislativa de la Ley del presupuesto nacional.	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
Completion Date	3/17/2026	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status
3	Dar seguimiento del trámite legislativo proyecto (Ley No. 24420).	MITIGATE	COMPLETE

Details

Estimated Completion Date	Hasta la aprobación en Asamblea Legislativa de la Ley	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
Completion Date	3/19/2025	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
	Active	Si la ejecución financiera no es consistente con el avance temporal, podría requerirse reprogramación del programa o extensión de plazos	3 - Medium High	4 - High	High	Technical and operational complexity

Details

Associated Outputs	- Guía de indicadores mínimos para el monitoreo de la gestión de operación y mantenimiento del corredor RN-35 - Obras complementarias en el Tramo Central Sección Sucre - Abundancia de la RN-35 desarrolladas e incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC - Obras complementarias en la Punta Norte de la RN-35 desarrolladas (ie. Iluminación) - Plan de comunicación para promoción de prácticas seguras de conducción en el corredor - Plan de mejora de las capacidades de gestión de riesgo de desastres y CC diseñado e implementado - Programa de capacitación a funcionarios públicos para el diseño de pliegos con enfoque de género y ordenamiento ecológico de la RN-35 - Punta Sur de la RN-35 diseñado y construido, incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC - Tramo Central Sección Sifón - Sucre de la RN-35 mejorado e incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC	**Source of Risk**	Project	**Type of Impact**	- Time
Associated Outcomes	- Mejorar las condiciones de circulación entre las zonas norte y centro del país de forma segura, sostenible y resiliente al CC, incorporando en su diseño la perspectiva de género	**Responsible**	Organismo Ejecutor	**Probability Factors**	Magnitud y duración de los contratos; evolución de precios; definición progresiva de diseños; eventuales variaciones; y dependencia de fuentes complementarias de financiamiento
Description of Impact	Brecha de financiamiento, reducción de alcance, retraso en productos, necesidad de reprogramar desembolsos y posible incumplimiento de metas del Programa.				

11

Response Actions

1

Response Description		Management Strategy		Status	
Reestructurar proceso de licitación del Tramo Central y análisis de mercado		MITIGATE		ACTIVE	
Details					
Estimated Completion Date	Q1 2026	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
Completion Date	12/30/2026	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

2

Response Description		Management Strategy		Status	
Se proponen algunas medidas como: 1. Acelerar ejecución financiera mediante actividades preliminares, 2. Acelerar el cumplimiento de condiciones previas (PAAS, no objeción de diseño, FIDIC).		MITIGATE		COMPLETE	
Details					
Estimated Completion Date	Q1 2026	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
Completion Date	10/2/2026	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
12	Active	Si, debido a plazos insuficientes, investigaciones de campo incompletas y fallas en el aseguramiento de la calidad del Contratista, los entregables de diseño o los informes de calidad se presentan tarde, incompletos o con errores, puede ocurrir un ciclo prolongado de revisión y reproceso que cause atrasos en aprobaciones, construcción, relaciones valoradas y plazo contractual.	4 - High	4 - High	High	Technical and operational complexity

Details

Associated Outputs	- Punta Sur de la RN-35 diseñado y construido, incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC - Tramo Central Sección Sifón - Sucre de la RN-35 mejorado e incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC	**Source of Risk**	Project	**Type of Impact**	- Time - Quality
Associated Outcomes	- Mejorar las condiciones de circulación entre las zonas norte y centro del país de forma segura, sostenible y resiliente al CC, incorporando en su diseño la perspectiva de género	**Responsible**	Organismo Ejecutor	**Probability Factors**	Plazos insuficientes para la preparación de entregables; investigaciones de campo incompletas; y debilidades en el aseguramiento y control de calidad del Contratista.
Description of Impact	Revisiones reiteradas, demora en la no objeción o aprobación, retraso de frentes constructivos, condicionamiento de relaciones valoradas, reclamos y extensión del plazo				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	Implementar un mecanismo reforzado de aseguramiento y control de calidad para los entregables de diseño e informes de calidad, que incluya la programación oportuna de las investigaciones de campo requeridas, listas de verificación de completitud previo a cada entrega, revisiones internas del Contratista antes de su remisión y reuniones periódicas de seguimiento con el Ingeniero para identificar y corregir anticipadamente observaciones que puedan generar ciclos de revisión y reproceso.	MITIGATE	ACTIVE	

Details

Estimated Completion Date	1/1/26	**Budget**	0	**Responsible**	Unidad Ejecutora
Completion Date	1/31/2027	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
13	Active	Si, debido a la priorización de otras actividades y a una preparación insuficiente para la época lluviosa, el Contratista no implementa oportunamente el manejo temporal de aguas en excavaciones, taludes y escombreras, pueden ocurrir erosión, inestabilidad, arrastre de sedimentos o daños que causen retrasos, reprocesos, afectaciones ambientales, sobrecostos y riesgos de seguridad.	3 - Medium High	4 - High	High	Technical and operational complexity

Details

Associated Outputs	- Punta Sur de la RN-35 diseñado y construido, incorporando criterios de diseño para la gestión de desastres y resiliencia al CC	**Source of Risk**	Project	**Type of Impact**	- Cost - Time
Associated Outcomes	- Mejorar las condiciones de circulación entre las zonas norte y centro del país de forma segura, sostenible y resiliente al CC, incorporando en su diseño la perspectiva de género	**Responsible**	Unidad Ejecutora	**Probability Factors**	Priorización de otras actividades por parte del Contratista; preparación insuficiente para la época lluviosa; y demora en la implementación de medidas temporales para el manejo de aguas en excavaciones, taludes y escombreras
Description of Impact	Daños en trabajos ejecutados, pérdida de productividad, erosión y arrastre de sedimentos, posibles incidentes de seguridad y afectaciones ambientales, que pueden requerir medidas correctivas y reprocesos, generar sobrecostos y ocasionar extensiones del plazo contractual.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	Seguimiento por parte del equipo de regencia ambiental de los trámites de gestión ambiental requeridos para la ejecución de las obras.	MITIGATE	ACTIVE	

Details

Estimated Completion Date	Hasta finalización y entrega de las obras del programa	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
Completion Date	1/9/2029	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

MATERIALIZED RISKS

Issue ID	Issue Description					
1	Se han recibido ofertas por encima del Monto estimado en el diseño de la operación.					
	Details					
	Associated Risk	Recibir ofertas por encima del presupuesto estimado podría invalidar los procesos para replantear los alcances de los trabajos o la adición de recursos	**Action**	En la próxima revisión de cartera se dará seguimiento al Plan de Acción relacionado con financiamiento y ejecución de obras.	**Expected Completion Date**	11/13/2025
	Operation Impact	Se podrían requerir recursos adicionales para completar los productos diseñados.	**Lesson Learned**	Los riesgos geológicos y geotécnicos son difíciles de estimar en contractos diseño + construcción.	**Completion Date**	11/14/2025

EVALUATION TRACKING

Validation Process


Date	User	Role	Action	Comment	Classification	Workflow
10/02/2026	MARIANOA	Team Leader	Completed by Team Leader		Alert	Progress Monitoring Report September Validation Workflow

MONITORING INDICATORS

Stage 2: After Eligibility

		Benchmark Indicator Value			
Indicator (I)	**Project Indicator Value**	**Satisfactory**	**Alert**	**Problem**	**Traffic Light**
Synthetic Indicator (SI)	2.30	2.5 <= I	2<=I<2.5	I<2	ALERT
Accumulated disbursements to country's historic disbursements	0.05	1 >= I > 0.1	0.1 >= I >=0.03	0.03 > I >= 0	ALERT
Cost Performance Index - CPI	1.00	0.80 <= I <= 2.00	0.40 <= I < 0.80	0.00 <= I < 0.40	SATISFACTORY
Cost Performance Index (annual - CPI(a)	1.00	0.80 <= I <= 2.00	0.40 <= I < 0.80	0.00 <= I < 0.40	SATISFACTORY
Schedule Performance Index - SPI	0.19	0.80 <= I <= 2.00	0.40 <= I < 0.80	0.00 <= I < 0.40	PROBLEM
Schedule Performance Index (annual)- SPI(a)	0.44	0.80 <= I <= 2.00	0.40 <= I < 0.80	0.00 <= I < 0.40	ALERT
Expected additional execution duration (months)	235.99	N/A	N/A	N/A	For tracking purpose only
Environmental and social safeguards performance rating	Satisfactory	N/A	N/A	N/A	For tracking purpose only


Accumulated disbursements as proportion of the total amount

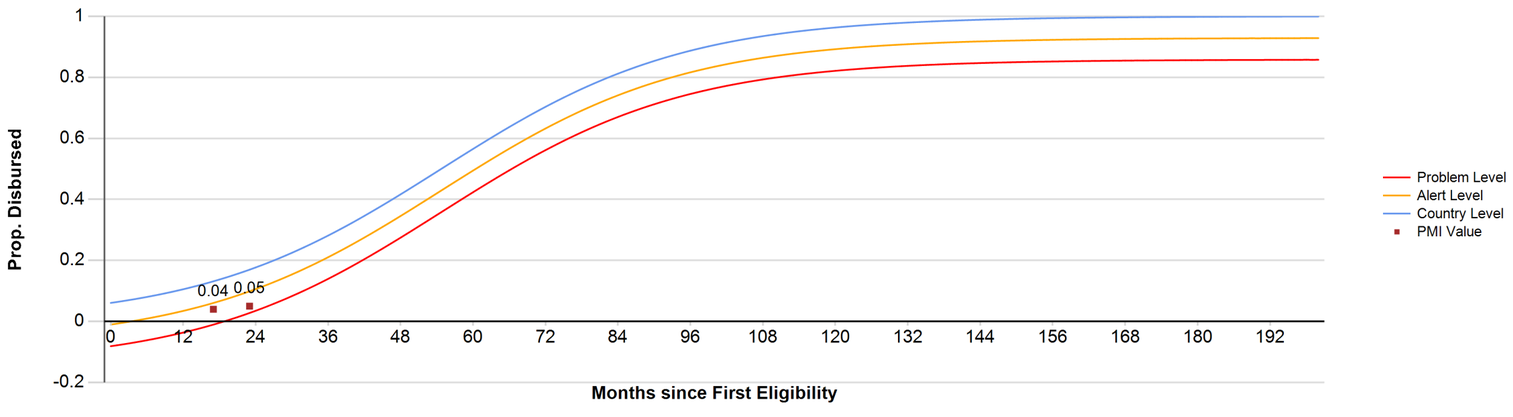

PV, AC, EV, PV(a), EV(a)

	2025	2026
PV	3,360,000.00	36,699,000.00
AC	4,671,415.08	6,833,802.68
EV	4,671,415.08	6,833,802.68
PV(a)	3,360,000.00	15,678,534.90

EV(a)	4,671,415.08	6,833,802.68

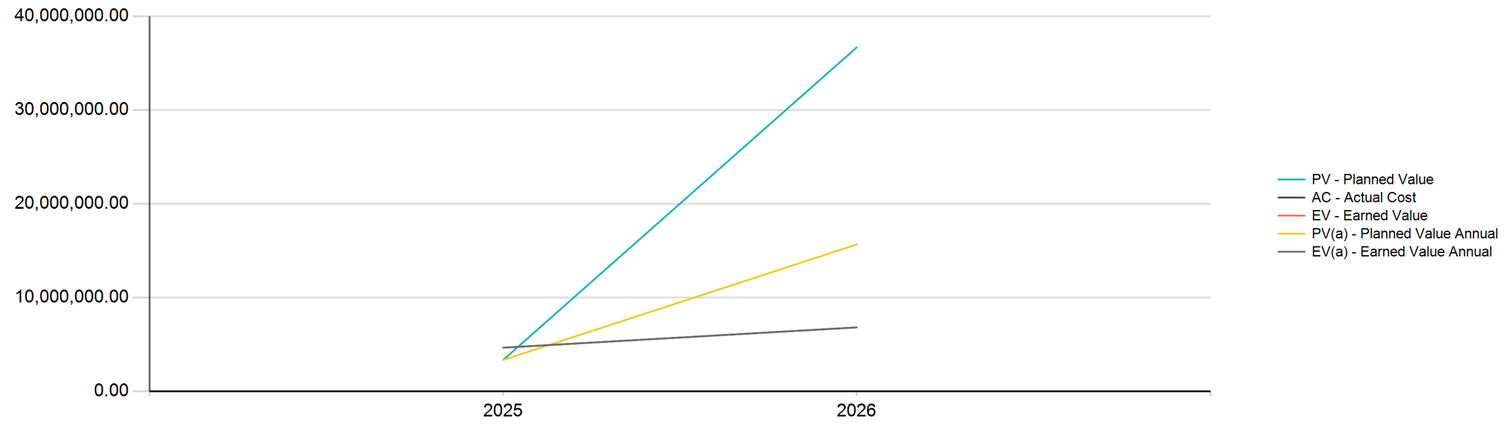

	2025	2026
CPI	1.00	1.00
CPI(a)	1.00	1.00
SPI	1.39	0.19
SPI(a)	1.39	0.44

