PMR Operational Report

Operation Number	CR-L1065	**Chief of Operations Validation Date**	
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2026	**Division Chief Validation Date**	
Last Update	10/02/26	**Country Representative Validation Date**	
PMR Validation Stage	Completed by Team Leader		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Cantonal Road Network II Program	**Loan Number**	4507/OC-CR
Executing Agency	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE	**Sector/Subsector**	TRANSPORT-RURAL ROADS
Team Leader	ANSALDO, MARIANO PEDRO	**Overall Stage**	Fully Disbursed
Operation Type	Loan Operation	**Country**	Costa Rica
Lending Instrument	Investment Loan	**PMR required**	YES
Borrower	REPUBLICA DE COSTA RICA	**Convergence related Operation(s)**	

Events Data

Supervision	
Signature	09/20/18
Ratification	
Legal Effectiveness	09/20/18
Total Eligibility	
Partial Eligibility	11/26/18
First Disbursement	03/07/19
Original Disbursement Expiration	09/20/23
Current Disbursement Expiration	04/24/26

Preparation

On pipeline	10/31/12
Start date	03/09/16
PP Approved	
POD Approved	02/15/18
DLP Approved by OPC	03/05/18
Negotiation	03/06/18
Operation Approved	03/20/18

Objective

The program's general objective is to contribute to productivity growth and poverty reduction in Costa Rica by facilitatingcloser integration between production and consumption areas and improving the population's access to public and social services. Its specific objective isto improve the quality of the Cantonal Road Network through: (i) road rehabilitation and maintenance works that include a climate change adaptationcomponent, which will result in shorter travel times and lower operating costs; and (ii) strengthening of the institutions responsible for road networkmanagement.

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	**Risk**	Substantial
Safeguard Performance Rating	Partially Unsatisfactory		
Safeguard Performance Rating - Rationale	La clasificación de desempeño se mantiene en Parcialmente Insatisfactorio. Hay avances significativos en las gestiones de salud y seguridad ocupacional asociadas al accidente fatal ocurrido el 20 de junio de 2025 en el Proyecto Monterrey y en el cierre del plan de acción relacionado a las 3 quejas gestionadas mediante el Protocolo de Quejas del BID. También se identifica avance en acciones para la atención de afectaciones por inundaciones en dos viviendas del proyecto Puente en Quebrada Mina. Sin embargo, estos avances no son suficientes para mejorar la clasificación de desempeño aún.		

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO	**Date of approval**	

	Total Cost and Source					Available Funds (US$)			
Operations	**Original IDB**	**Current IDB**	**Local Counterpart**	**Co-Financing / Country**	**Total Original Cost**	**Current IDB**	**Disb. Amount to Date**	**% Disbursed**	**Undisbursed Amount**
CR-L1065	144,036,000	142,213,393	8,000,000	0	152,036,000	142,213,393	142,213,392.52	100.00%	-
Aggregated	**144,036,000**	**142,213,393**	**8,000,000**	**0**	**152,036,000**	**142,213,393**	**142,213,392.52**	**0.00%**	**-**

Development Effectiveness Matrix


Economic Analysis

Undefined	Yes
Cost benefit analysis	No
Cost effectiveness analysis	No
General economic analysis (Economic rate of return)	No

Evaluation

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Undefined	Yes
Random assignment	No
Non-experimental method	No
Ex-post cost benefit analysis	No
Ex-post cost effectiveness analysis	No
Before/after or With/without comparison	No

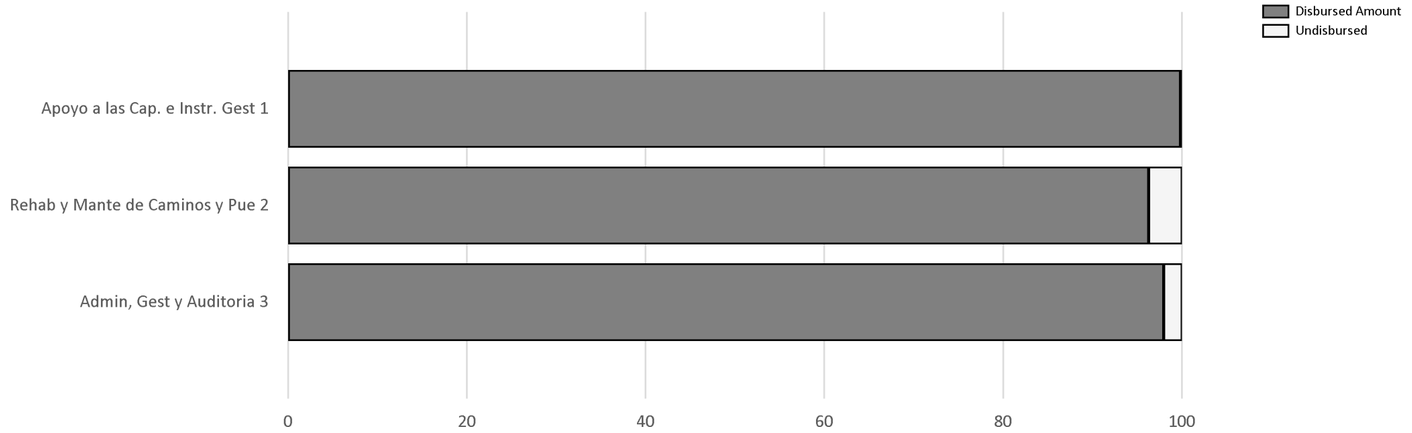

Printed on: October 14, 2026 5:08:15 PM

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Mejora de productividad

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		EOP 2026
1.0	Calidad de caminos, según Componente “Quality of trade and transport-related infrastructure” del Logistics Performance Index (LPI) del Banco Mundial	Puntaje	2.32	2016	2023	P	2.48
						A	2.48

Details

Means of Verification: Documento que presente la verificación de la mejora en la puntuación del componente “Quality of trade and transport-related infrastructure” del Índice de Desempeño Logístico (LPI) del Banco Mundial

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Mejora de la condición de la Red Vial Cantonal

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2025	EOP 2026
1.0	Densidad de vías cantonales en buen estado	km	53.7	2018	P	65.6	-	65.6
					A	-	-	217.9

Details

Means of Verification: Registro Vial de la Red Vial Cantonal del MOPT

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No

IF Contribution	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Disminución de costos de operación vehicular

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2025	EOP 2026
2.0	Costos de operación vehicular en tramos que pasan de Lastre o Tierra a Tratamiento Bituminoso Simple (TBS)	USD/km	0.52	2018	P	.37	-	.37
					A	-	-	.38

Details

Means of Verification: Informes de consultorías del programa, que determinen anualmente a través de mediciones de IRI en campo y cálculos realizados con HDM-4

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

Specific Development Objectives Nbr. 3: Disminución de costos de viaje

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2025	EOP 2026
3.0	Costos de viaje en tramos que pasan de Lastre o Tierra a Tratamiento Bituminoso Simple (TBS)	USD/km	0.31	2018	P	.21	-	.21
					A	-	-	.18

Details

Means of Verification: Informes de consultorías del programa, que determinen anualmente a través de mediciones de IRI en campo y cálculos realizados con HDM-4

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

Specific Development Objectives Nbr. 4: Reducción de vulnerabilidad de las vías frente a efectos de CC

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2025	EOP 2026
4.0	Caminos con paso interrumpido temporal o permanentemente debido a vulnerabilidad por eventos climáticos	Porcentaje	62	2018	P	14	-	14
					A	-	-	3.6

Details

Means of Verification: Informes de afectación

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

Specific Development Objectives Nbr. 5: Fortalecimiento institucional de los Municipios

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2025	EOP 2026
5.0	Porcentaje de Municipios que realizan su gestión vial con base en los Planes de conservación, desarrollo y seguridad vial (PCDSV) elaborados	Porcentaje	49	2018	P	100	-	100
					A	-	-	100

Details

Means of Verification: Informes semestrales de seguimiento al programa que elabora el MOPT

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous**	No	**Afrodescendats-**	No	**Persons with**	No	**LGBTQ+**	No

		people-related		**related**		**disabilities-related**		**individuals-related**	
IF Contribution									

Specific Development Objectives Nbr. 6: Aumento de la presencia de mujeres en las microempresas de gestión vial

Observation:

	Indicator	**Unit of Measure**	**Baseline**	**Baseline Year**		**2023**	**2025**	**EOP 2026**
6.0	Porcentaje de mujeres socias en microempresas de mantenimiento vial existentes en el país	Porcentaje	7	2018	P	20	-	20
					A	-	-	31

Details

Means of Verification: Informes semestrales de seguimiento al programa que elabora el MOPT

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	Yes	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

RESULTS MATRIX

OUTPUTS PHYSICAL PROGRESS

Component Nbr. 1: Apoyo a las capacidades e instrumentos de gestión

	Output	**Unit of Measure**		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	EOP 2026
1.1	Número de funcionarios responsables de la gestión vial municipal capacitados	Funcionarios	P	0	0	30	78	78	57	-	-	-	243
			P (a)	0	0	0	108	100	100	51	0	0	369
			A	0	0	0	153	100	56	60	0	0	369

Details

Means of Verification: Informes de avance

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

	Output	**Unit of Measure**		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	EOP 2026
1.2	Número de cantones con Planes Viales Quinquenales de conservación y desarrollo elaborados	Cantones	P	0	0	0	20	21	0	-	-	-	41
			P (a)	0	0	0	0	20	20	0	0	0	38

	Número de cantones con Planes Viales Quinquenales de conservación y desarrollo elaborados	Cantones	A	0	0	0	0	21	17	0	0	0	38

Details

Means of Verification: Informes de avance

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	EOP 2026
1.3	Manuales de seguridad vial y gestión socioambiental elaborados	Documentos	P	0	0	4	0	0	0	-	-	-	4
			P (a)	0	0	0	4	0	0	0	0	0	11
			A	0	0	0	4	0	0	7	0	0	11

Details

Means of Verification: Informes de avance

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	EOP 2026
1.4	Número de cantones con Planes de gestión de activos viales cantonales elaborados	Cantones	P	0	0	0	20	40	21	-	-	-	81
			P (a)	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
			A	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification:

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	EOP 2026
1.4	Sistema de Gestión de Activos Viales implementado	Sistema	P	0	0	0	0	1	0	-	-	-	1
			P (a)	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
			A	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

Details

Means of Verification:

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	EOP 2026
1.5	Cantones con intervención de seguridad vial	Número	P	0	0	0	40	41	0	-	-	-	81
			P (a)	0	0	0	0	40	40	40	81	0	81
			A	0	0	0	0	0	0	0	81	0	81

Details

Means of Verification:

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

Component Nbr. 2: Rehabilitación y mantenimiento de caminos y puentes

	Output	Unit of Measure		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	EOP 2026
2.1	Caminos cantonales rehabilitados	Km	P	0	0	61	210	119	221	-	-	-	611
			P (a)	0	0	61	150	190	70.3	30	119.34	3.98	405
			A	0	0	63.8	80	81.1	44.7	16.1	115.32	11.25	412.27

Details

Means of Verification: Informes de avance y de recepción de obras.

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

Disaggregation			**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
	Low-carbon and/or resiliency measures included in design (km)	P	-	-	-	-	-
		P (a)	-	-	-	-	-
		A	-	-	-	-	-

	Output	Unit of Measure		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	EOP 2026
2.2	Puentes construidos o rehabilitados (Incluyendo diseño adaptados a cambio climático)	m	P	0	0	0	0	282	323	-	-	-	605
			P (a)	0	0	0	0	400	264	200	293	178	605
			A	0	0	0	0	0	114	198	115	84.45	511.45

Details

Means of Verification: Informes de avance y de recepción de obras.

Gender-related		**Indigenous people-related**		**Afrodescendats-related**		**Persons with disabilities-related**		**LGBTQ+ individuals-related**	
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

2023	2024	2025	2026	EOP 2026
-	-	-	-	0
-	80	55.44	-	405
269.56	-	-	-	269.56

Disaggregation			2018	2019	2020	2021	2022
	Low-carbon and/or resiliency measures included in design (m)	P	-	-	-	-	-
		P (a)	-	-	-	-	-
		A	-	-	-	-	-

	Output	Unit of Measure		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	EOP 2026
2.3	Mantenimiento rutinario por estándares realizado a través de microempresas	km/año	P	0	0	0	239	358.5	119.5	-	-	-	717
			P (a)	0	0	0	300	800	800	0	0	0	2,809.4
			A	0	0	0	771.4	1,019	1,019	0	0	0	2,809.4

Details

Means of Verification: Informes de avance

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

OUTPUTS FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1: Apoyo a las capacidades e instrumentos de gestión

Component revised cost: 2,824,419.63

	Output	Unit of Measure		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	EOP 2026
1.1	Número de funcionarios responsables de la gestión vial municipal capacitados	Funcionarios	P	0	0	0	333,333	666,667	0	-	-	-	1,000,000
			P (a)	0	0	0	231,120	416,685.02	399,996	41,800	122,147.14	0	527,853
			A	0	0	0	183,318.98	91,801.92	102,079.1	150,653	0	0	527,853

Details

Means of Verification: Informes de avance

2023	2024	2025	2026	EOP 2026
-	-	-	-	0
-	291	200	-	605
114	-	-	-	114

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No	
IF indicator					**Strategic Alignment**					

	Output	Unit of Measure		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	EOP 2026
1.2	Número de cantones con Planes Viales Quinquenales de conservación y desarrollo elaborados	Cantones	P	0	0	0	0	676,500	0	-	-	-	676,500
			P (a)	0	0	0	406,298	795,475	758,800	2,100	10,499.4	0	1,139,500.6
			A	0	0	0	165,725	182,297.5	601,786.5	189,691.6	0	0	1,139,500.6

Details

Means of Verification: Informes de avance

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No	
IF indicator					**Strategic Alignment**					

	Output	Unit of Measure		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	EOP 2026
1.3	Manuales de seguridad vial y gestión socioambiental elaborados	Documentos	P	0	0	180,000	0	0	0	-	-	-	180,000
			P (a)	0	0	0	180,000	136,677	0	0	11,677	0	63,323
			A	0	0	3,498.45	39,824.55	5,000	15,000	0	0	0	63,323

Details

Means of Verification: Informes de avance

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No	
IF indicator					**Strategic Alignment**					

	Output	Unit of Measure		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	EOP 2026
1.4	Número de cantones con Planes de gestión de activos viales cantonales elaborados	Cantones	P	0	0	0	0	1,043,500	0	-	-	-	1,043,500
			P (a)	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
			A	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification:

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	EOP 2026
1.4	Sistema de Gestión de Activos Viales implementado	Sistema	P	0	0	0	400,000	200,000	0	-	-	-	600,000
			P (a)	0	0	0	0	276,800	323,200	608,091	220,000	174,395.67	191,860.67
			A	0	0	0	0	0	0	0	17,465	169,611	187,076

Details

Means of Verification:

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	EOP 2026
1.5	Cantones con intervención de seguridad vial	Número	P	0	0	0	1,000,000	0	0	-	-	-	1,000,000
			P (a)	0	0	0	0	444,440	555,560	600,000	935,000	41,375.36	901,882.36
			A	0	0	0	0	0	0	0	860,507	0	860,507

Details

Means of Verification:

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

Component Nbr. 2: Rehabilitación y mantenimiento de caminos y puentes

Component revised cost: 139,158,069.73

	Output	Unit of Measure		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	EOP 2026
2.1	Caminos cantonales rehabilitados	Km	P	0	392,808	9,813,002	34,406,056	33,731,846	29,569,286	-	-	-	107,912,998
			P (a)	0	392,808	29,423,144	22,496,367	34,975,998.76	16,326,017	33,330,248.75	38,769,588.73	9,829,728.73	105,925,755.73
			A	0	3,117,555.2	20,576,315.88	11,196,322.41	9,918,852.51	6,522,435	16,060,287.27	28,704,258.73	8,799,531	104,895,558

Details

Means of Verification: Informes de avance y de recepción de obras.

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	EOP 2026
2.2	Puentes construidos o rehabilitados (Incluyendo diseño adaptados a cambio climático)	m	P	0	0	0	0	10,848,002	6,475,000	-	-	-	17,323,002
			P (a)	0	0	0	600,000	7,005,794.19	7,546,353	8,405,975.22	8,261,850.62	2,902,969.05	20,939,643
			A	0	0	1,984,407.2	1,327,006.43	723,565.37	2,166,364	6,476,449.38	5,358,881.57	2,443,414.05	20,480,088

Details

Means of Verification: Informes de avance y de recepción de obras.

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	EOP 2026
2.3	Mantenimiento rutinario por estándares realizado a través de microempresas	km/año	P	0	0	0	0	5,000,000	8,000,000	-	-	-	13,000,000
			P (a)	0	0	0	7,533,500	5,070,889.55	5,070,889.55	462,775	249,652.55	0	12,292,671
			A	0	0	4,895,191.32	2,401,346.58	2,003,818.1	2,375,186	374,805.45	242,323.55	0	12,292,671

Details

Means of Verification: Informes de avance

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

Other Costs

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Cost
Administración , gestión y auditoria	P	-	20,000	30,000	30,000	30,000	1,190,000	-	-	-	1,300,000
	P (a)	-	20,000	280,451	290,000	335,800	333,105.84	220,000	219,229.65	126,752.27	1,760,036.62
	A	-	225,797.62	225,299.28	277,995.6	208,662.5	222,000	226,015.35	247,514	133,531	1,766,815.35
Contrapartida local	P	-	100,000	2,000,000	2,850,000	2,150,000	900,000	-	-	-	8,000,000
	P (a)	-	100,000	2,100,000	2,439,050.67	1,888,000	1,500,000	1,934,516.9	3,248,981.62	655,000	10,042,635.38
	A	-	1,244,999.28	1,265,950.05	1,212,751.2	1,263,818.91	1,434,671	956,582.94	2,008,862	613,581	10,001,216.38

Total Costs

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Cost
Total Cost	P	-	512,808	12,023,002	39,019,389	54,346,515	46,134,286	-	-	-	152,036,000
	P (a)	-	512,808	31,803,595	34,176,335.67	51,346,559.52	32,813,921.39	45,605,506.87	52,048,626.71	13,730,221.08	153,785,161.36
	A	-	4,588,352.1	28,950,662.18	16,804,290.75	14,397,816.81	13,439,521.6	24,434,484.99	37,439,811.85	12,159,668.05	152,214,608.33

CORPORATE INDICATORS

IF INDICATORS

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Categories	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	EOP 2026
1	2.19 People with enhanced access to sustainable transportation infrastructure or services	# of beneficiaries		2018	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					P (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,307,517
					A	-	-	-	-	468,909	371,874	602,881	863,853	-	2,307,517

Details

Means of Verification: Informe Semestral (Anexo 3 Informe de Evaluacion de Indicadores)

Observations: Dato del TPDA tomado del Anexo de Evaluación de indicadores del Informe Avance de reporte semestral, datos de habitantes tomado de Cuadro 8.3 Proyecciones Población 2021-2022 por Distrito (INEC,2022), y utilización de información geográfica de los proyectos de la carpeta Atlas GIS del Sharepoint TSP Costa Rica.

Change Matrix

Section	Name	Reasons	Related Documents	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System	Agreed with Execution Agency
Output	Caminos cantonales rehabilitados	Ajuste conforme a EFAs finales, ver ID DOCs EZIDB0000195-1802924561-249 del EFA	4507OC-CR - EFA Final - Informe EFA.pdf	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADRIANBAR	10/2/2026	
Output	Caminos cantonales rehabilitados	Ajuste conforme a EFAs finales, ver ID DOCs EZIDB0000195-1802924561-249 del EFA	4507OC-CR - EFA Final - Informe EFA.pdf	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	ADRIANBAR	10/2/2026	
Output	Cantones con intervención de seguridad vial	Ajuste conforme a EFAs finales, ver ID DOCs EZIDB0000195-1802924561-249 del EFA	4507OC-CR - EFA Final - Informe EFA.pdf	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADRIANBAR	10/2/2026	
Output	Cantones con intervención de seguridad vial	Ajuste conforme a EFAs finales, ver ID DOCs EZIDB0000195-1802924561-249 del EFA	4507OC-CR - EFA Final - Informe EFA.pdf	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	ADRIANBAR	10/2/2026	
Output	Mantenimiento rutinario por estándares realizado a través de microempresas	Ajuste conforme a EFAs finales, ver ID DOCs EZIDB0000195-1802924561-249 del EFA	4507OC-CR - EFA Final - Informe EFA.pdf	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	ADRIANBAR	10/2/2026	
Output	Mantenimiento rutinario por estándares realizado a través de microempresas	Ajuste conforme a EFAs finales, ver ID DOCs EZIDB0000195-1802924561-249 del EFA	4507OC-CR - EFA Final - Informe EFA.pdf	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADRIANBAR	10/2/2026	
Output	Número de funcionarios responsables de la gestión vial municipal capacitados	Ajuste conforme a EFAs finales, ver ID DOCs EZIDB0000195-1802924561-249 del EFA	4507OC-CR - EFA Final - Informe EFA.pdf	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	ADRIANBAR	10/2/2026	
Output	Número de funcionarios responsables de la gestión vial municipal capacitados	Ajuste conforme a EFAs finales, ver ID DOCs EZIDB0000195-1802924561-249 del EFA	4507OC-CR - EFA Final - Informe EFA.pdf	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADRIANBAR	10/2/2026	
Output	Sistema de Gestión de Activos Viales implementado	Ajuste conforme a EFAs finales, ver ID DOCs EZIDB0000195-1802924561-249 del EFA	4507OC-CR - EFA Final - Informe EFA.pdf	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	ADRIANBAR	10/2/2026	
Output	Sistema de Gestión de Activos Viales implementado	Ajuste conforme a EFAs finales, ver ID DOCs EZIDB0000195-1802924561-249 del EFA	4507OC-CR - EFA Final - Informe EFA.pdf	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ADRIANBAR	10/2/2026	

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Status of the Implementation

El PRVC-II concluyó sus ocho productos. Al cierre se reportan 412,7 km de caminos rehabilitados y 511,45 m de puentes y alcantarillas, frente a metas ajustadas de 405 km y 500 m. Se capacitaron 369 funcionarios, se elaboraron 38 planes viales y 11 manuales y se atendieron 81 cantones en seguridad vial. El mantenimiento comunitario alcanzó aproximadamente 1.020 km/año.

Las metas originales de 611 km y 605 m se redujeron por la apreciación del colón y compensaciones contractuales, descartando paquetes de obra. Los planes viales pasaron de 41 a 38 por el retiro de tres municipios y el sistema de gestión de activos se implementó en siete municipios.

Se desembolsaron US$142,21 millones: 98,73% del préstamo original y 100% del monto vigente tras cancelar US$1,82 millones no desembolsados. La justificación final fue aprobada el 18 de septiembre de 2026 y el EFA se presentó el 30 de septiembre.

La pandemia y los atrasos en contrataciones, pagos, permisos y reubicación de servicios requirieron prórrogas hasta el 24 de abril de 2026 para el último desembolso. Se reforzó el equipo financiero, se reprogramaron metas y se fortaleció la coordinación interinstitucional.

Los incidentes con terceros motivaron la caída en la calificación ESG a fin de 2025 que, con la planificación y ejecución de planes de acción, y compensaciones en los casos Quebrada Mina e Ipís, se logró una calificación PS al cierre. La indemnización por el accidente fatal en Monterrey permanece pendiente y requiere seguimiento institucional ya que se encuentra en sede judicial.

El EFA reporta US$339.794,28 pendientes de pago con la empresa MECO, a cubrir con presupuesto del MOPT. Los pendientes bancarios y de exoneración deben trasladarse a responsables institucionales. Para mitigar riesgos de sostenibilidad debe asegurarse el mantenimiento municipal y la continuidad de las microempresas; 12 de 21 tenían contratos vigentes al cierre.

Likelihood of Achieving Development Objectives

High	La probabilidad de lograr los objetivos generales y específicos de desarrollo se considera alta. Según la Matriz de Resultados, los productos fueron completados y se alcanzaron o superaron las metas ajustadas, incluida la de resiliencia. La rehabilitación de caminos y estructuras, el mantenimiento vial y el fortalecimiento municipal constituyen productos necesarios y suficientes, en cantidad y calidad, para mejorar la condición de la red, reducir costos de operación y viaje, conectar zonas productivas y facilitar el acceso a servicios. Las obras evaluadas presentan condiciones funcionales buenas o excelentes y se reportan reducciones en los costos de transporte. La participación femenina en las microempresas alcanzó el 21%, superando la meta del 20%. Estos resultados respaldan la contribución del Programa a sus objetivos de desarrollo.

Lesson Learned

Category	Lesson Learned	Entered in System
Project Management Capacity, Cost and Budgetary Aspects, Project Design	La reducción de la disponibilidad presupuestaria para ejecutar las obras fue una de las principales dificultades que enfrentó nuestro equipo durante el PRVC-II, aunque se cumplieron las metas físicas ajustadas. Durante la ejecución, la apreciación del colón frente al dólar, a partir de noviembre de 2023, generó necesidades de compensación en los contratos de obra pactados en dólares. Estos contratos no incorporaban cláusulas de reajuste de precios, por lo que las variaciones se atendieron mediante compensaciones económicas. Para financiarlas se desestimaron paquetes de obra y se redujeron las metas de caminos de 611 a aproximadamente 405 km y de estructuras de 605 a 500 m. Esta situación evidenció la necesidad de incorporar el riesgo cambiario desde la planificación para anticipar sus efectos sobre el presupuesto y el alcance. Como equipo, aprendimos que podríamos haber fortalecido la preparación del Programa mediante las siguientes actividades: 1- Incluir cláusulas de reajuste de precios en los contratos de obra. 2- Actualizar las estimaciones de preinversión considerando las variaciones de precios y los plazos reales de contratación. 3- Evaluar escenarios cambiarios y revisar periódicamente el presupuesto para anticipar necesidades de financiamiento y reducir el riesgo de recortes en las obras previstas.	10/2/2026
Project Management Capacity, Acquisitions and Procurement - Bidding Stage, Project Design	La baja participación de oferentes en algunos concursos de obra fue una de las dificultades que se enfrentaron durante la ejecución del PRVC-II. La conformación de paquetes con numerosos proyectos ubicados en distintas regiones redujo la cantidad de oferentes. Asimismo, la disponibilidad de contratistas y de fuentes de materiales adecuados, junto con el tipo de contratación, estuvo asociada a procesos infructuosos y reprogramaciones de concursos. Tres proyectos fueron declarados infructuosos. Estas circunstancias limitaron la competencia y afectaron la programación de las contrataciones, evidenciando la necesidad de considerar las condiciones del mercado al organizar los paquetes de obra. Como lección aprendida, se obtuvo que se podría haber fortalecido la preparación de las contrataciones mediante las siguientes actividades: 1- Conformar paquetes geográficamente acotados, considerando la cantidad y complejidad de las obras. 2- Consultar el mercado desde la preparación para identificar contratistas con capacidad e interés en cada zona. 3- Verificar la disponibilidad de fuentes de materiales que cumplan las especificaciones y ajustar la modalidad de contratación a las condiciones locales.	10/2/2026

Project Management Capacity, Acquisitions and Procurement - Provider Performance and Supervision	Los problemas relacionados con la salida y reemplazo de consultores individuales de supervisión requirieron atención durante la ejecución del PRVC-II. En un contexto de limitación de recursos financieros en esta área, se establecieron evaluaciones periódicas y rendición de cuentas sobre productos, plazo y alcance. Asimismo, la experiencia dio lugar a la recomendación de valorar la contratación de firmas consolidadas para la supervisión de obras o mantener un banco de oferentes precalificados. Como lección aprendida, se obtuvo que se podría haber fortalecido la gestión de la supervisión mediante las siguientes actividades: 1- Valorar la contratación de firmas consolidadas para la supervisión de obras, en lugar de consultores individuales. 2- Mantener, como alternativa, un banco de oferentes precalificados para atender las necesidades de reemplazo. 3- Replicar las evaluaciones periódicas y la rendición de cuentas sobre productos, plazo y alcance de los servicios de supervisión.	10/2/2026
Project Design, Environmental and Social Factors	La reformulación de factibilidades para incorporar criterios de resiliencia frente al cambio climático fue uno de los aspectos atendidos durante la ejecución del PRVC-II. Se ajustaron las factibilidades de 19 proyectos correspondientes a los paquetes 10, 11, 12, 15 y 22 para incorporar estos criterios. Esta reformulación formó parte de la gestión de ofertas de licitación que superaron los montos estimados. Aunque la meta de resiliencia se cumplió según la matriz de productos, la experiencia evidenció la conveniencia de incorporar los criterios de adaptación desde la formulación inicial de los proyectos. Como lección aprendida, se obtuvo que se podría haber fortalecido la preparación de los proyectos mediante las siguientes actividades: 1- Internalizar los criterios de adaptación al cambio climático desde la etapa de formulación. 2- Verificar que las factibilidades incorporen estos criterios antes de la licitación, para reducir la necesidad de ajustes posteriores.	10/2/2026
Intra/Inter Coordination, Project Design	La reubicación de servicios públicos fue una de las dificultades que se enfrentaron durante la ejecución del PRVC-II. En el Paquete 16, las gestiones de telecomunicaciones del ICE contribuyeron a los atrasos. En el Paquete 19, la ubicación de una tubería de agua potable del AyA ocasionó atrasos y obligó a modificar el diseño del puente. El fortalecimiento de la coordinación con ambas instituciones y sus subsidiarias redujo el impacto hacia la etapa final del Programa; sin embargo, la reubicación de redes se mantuvo en la ruta crítica de los proyectos. Como lección aprendida, se obtuvo que se podría haber fortalecido la coordinación para la reubicación de servicios públicos mediante las siguientes actividades: 1- Formalizar, durante la etapa de preinversión, convenios marco de coordinación con el AyA, el ICE y sus subsidiarias. 2- Incorporar en dichos convenios compromisos de plazo y de aporte de materiales para la reubicación de los servicios.	10/2/2026
Intra/Inter Coordination, Legal aspects and public processes, Stakeholder Priorities	La conformación de las microempresas comunitarias de mantenimiento vial por estándares (MMEC) constituyó una innovación institucional durante la ejecución del PRVC-II. El modelo contó con el respaldo de la Ley N.º 10241 y con la creación de la Red de Administradores de Microempresas Viales (RAMVI). Al cierre del Programa, 12 de las 21 MMEC mantenían contratos municipales vigentes, equivalentes al 57% del total. Esta experiencia evidenció que, además del respaldo legal y organizativo, la permanencia de las microempresas depende de la decisión de contratación de cada gobierno local. Como lección aprendida, se obtuvo que se podría haber fortalecido la sostenibilidad del modelo mediante las siguientes actividades: Promover la adopción formal del modelo como política institucional, a partir de la propuesta MMEC 2.0. Replicar la organización en red para el apoyo mutuo, el intercambio de experiencias y la participación conjunta en licitaciones. Promover la continuidad de la contratación municipal de las MMEC para las labores de mantenimiento vial.	10/2/2026
Project Management Capacity, Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors, Environmental and Social Factors	La participación de los gestores ambientales municipales en la regencia ambiental de las obras constituyó una experiencia replicable del PRVC-II. Estos funcionarios asumieron la regencia ambiental en parte de los proyectos, con capacitación y acompañamiento de la Unidad Ejecutora. Esta participación generó capacidad instalada en el nivel municipal para la gestión socioambiental de obra pública. Asimismo, los instrumentos desarrollados por el Programa quedaron documentados y disponibles como metodología para futuras intervenciones viales. Como lección aprendida, se obtuvo que esta experiencia puede replicarse en futuros programas mediante las siguientes actividades: 1- Incorporar a los gestores ambientales municipales en la regencia ambiental de los proyectos. 2- Brindar capacitación y acompañamiento desde la Unidad Ejecutora para el desempeño de estas funciones. 3- Aprovechar los instrumentos de gestión socioambiental documentados por el Programa como referencia para futuras intervenciones viales.	10/2/2026

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
1	Active	Si se realiza una gestión socioambiental inadecuada, genera impactos y externalidades negativas a los beneficiarios, provocando suspensión de los trabajos y retrasos significativos al cronograma del Programa.	3 - Medium High	4 - High	High	Technical and operational complexity

Details					
Associated Outputs	- Caminos cantonales rehabilitados - Mantenimiento rutinario por estándares realizado a través de microempresas - Puentes construidos o rehabilitados (Incluyendo diseño adaptados a cambio climático)	**Source of Risk**	Project	**Type of Impact**	- Quality - Cost - Time
Associated Outcomes	- Fortalecimiento institucional de los Municipios - Mejora de la condición de la Red Vial Cantonal - Reducción de vulnerabilidad de las vías frente a efectos de CC	**Responsible**	MOPT	**Probability Factors**	Se mantienen frentes activos de gestión socioambiental; existe seguimiento continuo a ETAS, consultas y casos sensibles durante el cierre entre ellos el Plan de Compensación del accidente fatal en el proyecto de Monterrey, en San Carlos que data de julio de 2025.
Description of Impact	La gestion socioambiental inadecuada se considera bastante relevante para el logro de los objetivos del programa.				

Response Actions

	Response Description		Management Strategy		Status	
1	Gestionar casos activos (incluyendo compensaciones y reasentamiento).		MITIGATE		ACTIVE	
	Details					
	Estimated Completion Date	Previo al cierre del Programa	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor/BID
	Completion Date	12/1/2026	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

	Response Description		Management Strategy		Status	
2	i. Gestión de viabilidad ambiental (permisos ambientales) ii. Plan de monitoreo		MITIGATE		COMPLETE	
	Details					
	Estimated Completion Date	Finaliza con la entrega de todos los productos del programa	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
	Completion Date	3/24/2023	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

	Response Description		Management Strategy		Status	
3	Dar apoyo específico al Organismo Ejecutor en la gestión de interesados ante el aumento en la ejecución de las obras, así como en otros aspectos socioambientales.		MITIGATE		COMPLETE	
	Details					
	Estimated Completion Date	Hasta el cierre del programa	**Budget**	0	**Responsible**	BID
	Completion Date	10/2/2026	**Funding Source**	ESGTRANS	**Status Description**	-

	Response Description		Management Strategy		Status	
4	Implementar procesos participativos con las comunidades en el área de influencia de las obras asociadas con el Producto 6. Caminos Cantonales Rehabilitados y Producto 7. Puentes Construidos o Rehabilitados, como reuniones de lanzamiento, y reforzar el protocolo de atención de partes interesadas, de forma que la gestión de la información fluya más eficientemente.		MITIGATE		COMPLETE	
	Details					
	Estimated Completion Date	Hasta el cierre del programa	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
	Completion Date	2/2/2026	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
2	Inactive	Incumplimiento de compromisos por parte de los gobiernos locales participantes en el proceso de Mantenimiento por medio de Microempresas (MER), genera atrasos en la ejecución que reducen la ejecución financiera anual planeada del programa en más de un 20%	1 - Low	4 - High	Medium Low	Rule of law

Details

Associated Outputs	- Mantenimiento rutinario por estándares realizado a través de microempresas	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Time - Cost
Associated Outcomes	- Mejora de la condición de la Red Vial Cantonal	**Responsible**	gobiernos locales y MOPT	**Probability Factors**	Se reduce la probabilidad de ocurrencia dado que no han sucedido eventos relevantes de atrasos por esta causa.
Description of Impact	Se considera alto impacto dado que los atrasos en le ejecución de compromisos de los gobiernos locales afecta los resultados asociados al mantenimiento por medio de microempresas.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	i. Manifestación de interés firmada por Acuerdo del Concejo Municipal ii. Gestionar Acuerdo del Concejo Municipal como garante de la reserva de recursos para el proceso MER iii. Gestionar Acuerdo del Concejo Municipal con el compromiso de contratación de las MER por el período que acuerden las partes	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	Finaliza con la entrega de todos los productos del programa	**Budget**	0	**Responsible**	Executing Agency
Completion Date	12/31/2021	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
3	Inactive	Atrasos en los procesos de pago	1 - Low	2 - Medium Low	Low	Macroeconomic environment

Details

Associated Outputs	- Caminos cantonales rehabilitados - Cantones con intervención de seguridad vial	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Quality - Cost - Scope - Time
Associated Outcomes	- Aumento de la presencia de mujeres en las microempresas de gestión vial - Disminución de costos de operación vehicular - Disminución de costos de viaje - Fortalecimiento institucional de los Municipios - Mejora de la condición de la Red Vial Cantonal - Reducción de vulnerabilidad de las vías frente a efectos de CC	**Responsible**	MOPT	**Probability Factors**	Se ha demostrado una buena gestión de los beneficiarios en los proyectos ya ejecutados por lo que se considera una baja probabilidad.
Description of Impact	Riesgo inactivo				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	i. Designación de un funcionario de la Dirección Financiera del MOPT con dedicación exclusiva para tramitar pagos. ii. Procesamiento de pagos del Programa en días diferenciados respecto de pagos de fondos ordinarios del MOPT iii. Procedimiento para pago de obras incluido en el MANOP iv. Operación de Oficinas Regionales de Proyecto con personal capacitado en gestión de pago	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	Executing Agency
Completion Date	3/23/2022	**Funding Source**	-	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
4	Inactive	Si se presentan protestas y apelaciones, los atrasos para lograr la adjudicación de las obras generarán una reducción de la ejecución financiera anual planeada del programa en más de un 20%	1 - Low	3 - Medium High	Low	Scope and planning

Details

Associated Outputs	- Caminos cantonales rehabilitados - Puentes construidos o rehabilitados (Incluyendo diseño adaptados a cambio climático)	**Source of Risk**	Project	**Type of Impact**	- Cost - Time
Associated Outcomes	- Disminución de costos de operación vehicular - Disminución de costos de viaje - Mejora de la condición de la Red Vial Cantonal	**Responsible**	MOPT	**Probability Factors**	La ocurrencia histórica de estos casos en el programa y el cambio a procesos de comparación de precios (con menor exposición ante la CGR) se considera que puede conllevar a un riesgo bajo de ocurrencia de protestas y apelaciones. Adicionalmente, dado que los montos de cada contrato son relativamente bajos, es poco probable que se apelen varios procesos de manera simultánea y se reduce el eventual impacto financiero.
Description of Impact	Los atrasos en la ejecución que afecten en más de un 20 % la ejecución financiera de la operación podrían tener un impacto medio-alto en la calificación de la operación.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status
1	i. Coordinación con CGR ii. Comisión de Recomendación de Adjudicación conformada por especialistas en áreas técnica, legal y financiera. iii. Mejora continua de los carteles de licitación, incorporando lecciones aprendidas del Programa	MITIGATE	COMPLETE

Details

Estimated Completion Date	Finaliza con la adjudicación del ultimo paquete de obras	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
Completion Date	3/24/2023	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
5	Inactive	Si se presentan protestas y apelaciones, los atrasos para lograr la adjudicación de las obras reducirán el cumplimiento de las metas físicas anuales planeadas en más de un 20%	1 - Low	2 - Medium Low	Low	Scope and planning

Details

Associated Outputs	- Caminos cantonales rehabilitados - Puentes construidos o rehabilitados (Incluyendo diseño adaptados a cambio climático)	**Source of Risk**	Project	**Type of Impact**	- Scope - Time
Associated Outcomes	- Disminución de costos de operación vehicular - Disminución de costos de viaje - Mejora de la condición de la Red Vial Cantonal	**Responsible**	MOPT	**Probability Factors**	La ocurrencia histórica de estos casos en el programa y el cambio a procesos de comparación de precios (con menor exposición ante la CGR) se considera que puede conllevar a un riesgo bajo de ocurrencia de protestas y apelaciones.
Description of Impact	Los atrasos en la ejecución que afecten en más de un 20% la ejecución fisica de la operación podrían tener un impacto medio-bajo en la calificación de la operación, pues la mayoría de metas físicas están asociadas a proceso ya adjudicados y el inicio de procesos nuevos				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status
1	i. Cumplimiento del Procedimiento Especial de Adquisiciones para el PRVC-II ii. Capacitación en procedimientos de adquisiciones con políticas BID	MITIGATE	COMPLETE

Details

Estimated Completion Date	Finaliza con la adjudicación del ultimo paquete de obras	**Budget**	0	**Responsible**	Executing Agency
Completion Date	3/24/2023	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
6	Inactive	Bajo interés de firmas constructoras, generará poca participación en las licitaciones y aumentar los costos de las obras en al menos un 10% sobre lo estimado	1 - Low	2 - Medium Low	Low	Scope and planning

Details

Associated Outputs	- Caminos cantonales rehabilitados - Puentes construidos o rehabilitados (Incluyendo diseño adaptados a cambio climático)	**Source of Risk**	Project	**Type of Impact**	- Cost
Associated Outcomes	- Disminución de costos de operación vehicular - Disminución de costos de viaje - Mejora de la condición de la Red Vial Cantonal	**Responsible**	MOPT	**Probability Factors**	Los cambios en la forma de estructurar los paquetes a ser contratados se estima que reducirán la probabilidad de ocurrencia a un nivel medio-bajo.
Description of Impact	El aumento de costo de las obras en un 10 % se considera un impacto medio-bajo, al poder ser cubierto el sobrecosto con fondos remanentes de la operación.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	i. Agrupación de paquetes de obra para atraer contratistas nacionales e internacionales con mayor capacidad ii. Publicación de los procesos en varios medios: SICOP, UNDB y SEPA	AVOID	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	finaliza con la adjudicación del ultimo paquete de obra	**Budget**	0	**Responsible**	Executing Agency
Completion Date	3/24/2023	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
7	Inactive	CGR no autoriza contratación directa de Consultoría Externa (GIZ)	2 - Medium Low	4 - High	Medium High	Political stability

Details

Associated Outputs	- Caminos cantonales rehabilitados - Cantones con intervención de seguridad vial - Mantenimiento rutinario por estándares realizado a través de microempresas - Manuales de seguridad vial y gestión socioambiental elaborados - Número de cantones con Planes Viales Quinquenales de conservación y desarrollo elaborados - Número de cantones con Planes de gestión de activos viales cantonales elaborados - Número de funcionarios responsables de la gestión vial municipal capacitados - Puentes construidos o rehabilitados (Incluyendo diseño adaptados a cambio climático) - Sistema de Gestión de Activos Viales implementado	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Cost - Scope - Quality - Time
Associated Outcomes	- Aumento de la presencia de mujeres en las microempresas de gestión vial - Disminución de costos de operación vehicular - Disminución de costos de viaje - Fortalecimiento institucional de los Municipios - Mejora de la condición de la Red Vial Cantonal	**Responsible**	MOPT	**Probability Factors**	se considera una probabilidad baja.
Description of Impact	Riesgo inactivo				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	i. Contratación de consultores individuales ii. Contratación de Consultoría Externa mediante concurso público (contratación directa concursada con autorización de CGR)	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	Executing Agency
Completion Date	3/23/2022	**Funding Source**	-	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
8	Inactive	Baja capacidad institucional en las municipalidades, impide la aplicación de los Planes de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial o Planes Quinquenales elaborados, afectando el logro de los objetivos del programa	2 - Medium Low	2 - Medium Low	Medium Low	Rule of law

Details

Associated Outputs	- Cantones con intervención de seguridad vial - Manuales de seguridad vial y gestión socioambiental elaborados - Número de cantones con Planes Viales Quinquenales de conservación y desarrollo elaborados - Número de cantones con Planes de gestión de activos viales cantonales elaborados - Número de funcionarios responsables de la gestión vial municipal capacitados - Sistema de Gestión de Activos Viales implementado	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Scope - Quality
Associated Outcomes	- Fortalecimiento institucional de los Municipios - Reducción de vulnerabilidad de las vías frente a efectos de CC	**Responsible**	MOPT	**Probability Factors**	Se considera una probabilidad medio-baja de ocurrencia, luego de la formalización de acuerdos con los gobiernos locales.
Description of Impact	Se considera impacto medio a bajo considerando el peso de este producto dentro de los objetivos del programa.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	i. Apoyo directo a los Gobiernos Locales para la elaboración de los Planes de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial (PCDSV) o Planes Quinquenales y de proyectos asociados a éstos ii. Fortalecimiento de los cuadros técnicos de los Gobiernos Locales iii. Inclusión de compromisos de los Gobiernos Locales en los Convenios de Participación iv. Socialización de Planes de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial elaborados en el marco del PRVC-II, ante el Consejo Municipal y gestión para su aprobación v. Sensibilización al personal municipal para el cumplimiento de compromisos vi. Gobiernos Locales sin PCDSV no pueden optar por recursos del PRVCII según criterios del MANOP	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	finaliza cuando se implementen los planes quinquenales	**Budget**	0	**Responsible**	Executing Agency
Completion Date	3/24/2023	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
9	Inactive	Si el programa no logra mantener su importancia estratégica con el apoyo político que permita la coordinación interinstitucional y toma de decisiones ágil y oportuna, involucramiento territorial y adecuada gestión de expectativas de los beneficiarios, frente a prioridades sectoriales se generará atrasos en la ejecución de los productos del Programa limitando el alcance y el logro de los resultados y objetivos previstos.	3 - Medium High	4 - High	High	Execution mechanism

Details

Associated Outputs	- Caminos cantonales rehabilitados - Mantenimiento rutinario por estándares realizado a través de microempresas - Puentes construidos o rehabilitados (Incluyendo diseño adaptados a cambio climático)	**Source of Risk**	Institutional capacity	**Type of Impact**	- Quality - Time
Associated Outcomes	- Fortalecimiento institucional de los Municipios - Mejora de la condición de la Red Vial Cantonal	**Responsible**	MOPT	**Probability Factors**	El cierre requiere coordinación interinstitucional para compensaciones, ajustes finales, gestión territorial y atención de expectativas de beneficiarios (Gestión Socioambiental) que incluye que para el cierre de temas ambientales y sociales se deba requerir de aprobar un decreto legislativo en la Asamblea Legislativa.
Description of Impact	La percepción de los beneficiarios se considera bastante relevante para el logro de los objetivos del programa, por lo que se define un impacto medio a alto.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status
1	Seguimiento con actores clave y comunicación activa con beneficiarios y autoridades.	MITIGATE	ACTIVE

Details

Estimated Completion Date	Previo al cierre del Programa	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
Completion Date	7/26/2026	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status
2	i. Desarrollo e implementación de estrategias para la contratación de las empresas que cuenten con la capacidad suficiente para la ejecución de las obras en los plazos previstos ii. Cumplimiento de plazos establecidos en el Procedimiento Especial de Adquisiciones iii. Suministro regular de información respecto al avance del Programa a los beneficiarios iv. Inspección de proyectos por parte de la contraparte municipal con personal idóneo para el cargo v. Utilización de reuniones de preinicio como último filtro para asegurar la capacidad de las empresas (de no ser así, tramitar insubsistencia al no dar orden de inicio)	MITIGATE	COMPLETE

Details

Estimated Completion Date	Finaliza con el cierre de los productos del programa	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
Completion Date	9/20/2025	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status
3	Dar seguimiento, con el impulso de ANAI y la UNGL, a la coordinación de las instituciones implicadas con el Producto 6. Caminos Cantonales Rehabilitados y Producto 7. Puentes Construidos o Rehabilitados.	MITIGATE	ACTIVE

Details

Estimated Completion Date	Hasta el cierre del programa	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
Completion Date	4/26/2026	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
10	Inactive	Si no se logra concluir las obras contratadas en el plazo contractual, por retrasos en el avance en las estimaciones de obra y en los pagos, afectando directamente a las obras y generando solicitudes de compensación y/o arbitrajes por la insatisfacción de los interesados.	3 - Medium High	4 - High	High	Macroeconomic environment

Details

Associated Outputs	- Caminos cantonales rehabilitados - Puentes construidos o rehabilitados (Incluyendo diseño adaptados a cambio climático)	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Time - Cost
Associated Outcomes	- Disminución de costos de operación vehicular - Disminución de costos de viaje - Mejora de la condición de la Red Vial Cantonal	**Responsible**	Organismo Ejecutor	**Probability Factors**	Al cierre de 2025 permanecen 7 proyectos en ejecución; los paquetes P19 y P20 constituyen la ruta crítica; persisten trámites de órdenes de modificación, estimaciones y pagos.
Description of Impact	Afectando directamente a las comunidades, a la administración de las municipalidades; y generando una opinión negativa para este tipo de iniciativas de inversión, por la insatisfacción de los interesados.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status
1	Seguimiento a proyectos remanentes; priorización de ruta crítica (P19 y P20); aceleración de órdenes de modificación, estimaciones y pagos; cronograma integrado de cierre.	MITIGATE	ACTIVE

Details

Estimated Completion Date	Previo al cierre del Programa	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
Completion Date	4/26/2026	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status
2	i. Realización de reuniones preoferta con potenciales oferentes para explicar el alcance de las obras previo a presentar ofertas. ii. Requisitos de capacidad técnica y financiera mejorados en documentos de licitación iii. Contratación de Consultoría Externa que se encargue de la supervisión de las obras y apoye a la UEC en todas las actividades del Programa	MITIGATE	COMPLETE

Details

Estimated Completion Date	Hasta finalizar el proceso de contratación de las obras del programa	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
Completion Date	3/20/2025	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status
3	Reforzar el personal del Organismo Ejecutor con personal propietario de apoyo administrativo y financiero para mejorar la gestión y evitar cuellos de botella en los procesos de aprobación	MITIGATE	ACTIVE

Details

Estimated Completion Date	Hasta el cierre del programa.	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
Completion Date	4/26/2026	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
11	Inactive	Tardía definición de la figura jurídica de las MER	4 - High	4 - High	High	Project management capacity

Details

Associated Outputs	- Caminos cantonales rehabilitados - Mantenimiento rutinario por estándares realizado a través de microempresas	**Source of Risk**	Institutional capacity	**Type of Impact**	- Time - Cost - Scope
Associated Outcomes	- Mejora de la condición de la Red Vial Cantonal	**Responsible**	MOPT	**Probability Factors**	probabilidad baja.
Description of Impact	Riesgo inactivo				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	i. Apoyo legal del MOPT para la definición de la figura jurídica más apropiada ii. Análisis de características de diferentes figuras jurídicas apropiadas para la conformación de las MER	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	Executing Agency
Completion Date	3/23/2022	**Funding Source**	-	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
12	Inactive	Indefinición de la figura de contratación adecuada	4 - High	4 - High	High	Project management capacity

Details

Associated Outputs	- Caminos cantonales rehabilitados - Cantones con intervención de seguridad vial - Mantenimiento rutinario por estándares realizado a través de microempresas - Manuales de seguridad vial y gestión socioambiental elaborados - Número de cantones con Planes Viales Quinquenales de conservación y desarrollo elaborados - Número de cantones con Planes de gestión de activos viales cantonales elaborados - Número de funcionarios responsables de la gestión vial municipal capacitados - Puentes construidos o rehabilitados (Incluyendo diseño adaptados a cambio climático) - Sistema de Gestión de Activos Viales implementado	**Source of Risk**	Institutional capacity	**Type of Impact**	- Cost - Quality - Scope - Time
Associated Outcomes	- Aumento de la presencia de mujeres en las microempresas de gestión vial - Disminución de costos de operación vehicular - Disminución de costos de viaje - Fortalecimiento institucional de los Municipios - Mejora de la condición de la Red Vial Cantonal - Reducción de vulnerabilidad de las vías frente a efectos de CC	**Responsible**	MOPT	**Probability Factors**	Baja
Description of Impact	Riesgo inactivo				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	i. Gestionar ante la CGR para preparar aprobación de la figura de contratación definida ii. Apoyo de Jurídicos y de Proveeduría del MOPT para la definición de la figura de contratación adecuada, tomando en cuenta criterios de la CGR iii. Gestión de alianzas estratégicas interinstitucionales para la definición de la forma de contratación adecuada iv. Gestionar la inclusión de una política de desarrollo local y mantenimiento vial por estándares en los planes viales quinquenales de conservación y desarrollo (PVQCD).	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	Executing Agency
Completion Date	3/23/2022	**Funding Source**	-	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
13	Inactive	La no identificación de mecanismos para adelantar recursos a las MER para su equipamiento y gastos operativos	2 - Medium Low	2 - Medium Low	Medium Low	Scope and planning

Details

Associated Outputs	- Mantenimiento rutinario por estándares realizado a través de microempresas	**Source of Risk**	Project	**Type of Impact**	- Cost - Time
Associated Outcomes	- Mejora de la condición de la Red Vial Cantonal	**Responsible**	MOPT	**Probability Factors**	Probabilidad baja
Description of Impact	Riesgo inactivo				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	i. Apoyo de Jurídicos y Proveeduría del MOPT para identificar y poner en práctica mecanismo para el adelanto de recursos a las MER	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	Executing Agency
Completion Date	3/23/2022	**Funding Source**	-	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
14	Inactive	Fondos insuficientes del PRVC-II para la “puesta a punto” de la totalidad de los caminos que serán atendidos por las MER	1 - Low	1 - Low	Low	Macroeconomic environment

Details

Associated Outputs	- Mantenimiento rutinario por estándares realizado a través de microempresas	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Cost
Associated Outcomes	- Mejora de la condición de la Red Vial Cantonal	**Responsible**	MOPT	**Probability Factors**	Se ha demostrado una buena gestión de los beneficiarios en los proyectos ya ejecutados por lo que se considera una baja probabilidad.
Description of Impact	Riesgo inactivo				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	i. Presupuestar recursos municipales para la puesta a punto de los caminos que serán intervenidos por las MER	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	Executing Agency
Completion Date	3/23/2022	**Funding Source**	-	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
15	Inactive	Atrasos para cumplir con todos los requisitos de elegibilidad de los proyectos complejos del paquete de obras que define la ruta critica del programa, generan la necesidad de solicitar una prórroga para la operación superior a 6 meses	2 - Medium Low	4 - High	Medium High	Scope and planning

Details

Associated Outputs	- Caminos cantonales rehabilitados - Puentes construidos o rehabilitados (Incluyendo diseño adaptados a cambio climático)	**Source of Risk**	Project	**Type of Impact**	- Time - Scope
Associated Outcomes	- Disminución de costos de operación vehicular - Disminución de costos de viaje - Mejora de la condición de la Red Vial Cantonal	**Responsible**	MOPT	**Probability Factors**	Se reduce la probabilidad dado que el PEP actual permite estimar que no sería necesario una prórroga superior a 6 meses.
Description of Impact	La prórroga del programa superior a 6 meses se considera de alto impacto.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	1. Se da un seguimiento continuo Interinstitucional entre los diferentes actores. 2.Se ha planteado a las Municipalidades respectivas que cuenten con otro proyecto maduro que pueda usarse en caso de no llegar a cumplirse con los requerimientos del proyecto original. Este segundo proyecto debe ser menos complejo de manera que de ser necesario puede cumplir en menos tiempo con los requisitos de elegibilidad. seguimiento continuo interisntitucional constante	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	Finaliza con la licitación del paquete de obras de ruta critica	**Budget**	0	**Responsible**	Executing Agency
Completion Date	9/23/2024	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
16	Inactive	Afectaciones asociadas a COVID-19 generan atrasos en la ejecución de obras, lo que reduce la ejecución financiera anual del programa en más de un 20%	1 - Low	3 - Medium High	Low	Business and social environment

Details

Associated Outputs	- Caminos cantonales rehabilitados - Puentes construidos o rehabilitados (Incluyendo diseño adaptados a cambio climático)	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Time - Cost
Associated Outcomes	- Disminución de costos de operación vehicular - Disminución de costos de viaje - Mejora de la condición de la Red Vial Cantonal	**Responsible**	MOPT y empresas contratistas	**Probability Factors**	Las afectaciones a las obras se han reducido sustancialmente y no se espera que la tendencia cambie, por lo que se considera una probabilidad baja.
Description of Impact	Los atrasos en la ejecución que afecten en más de un 20% la ejecución financiera de la operación podrían tener un impacto medio-alto en la calificación de la operación.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	Incorporar a las obras protocolos recomendados por el Ministerio de Salud y exigir mecanismos de prevencion de contagios.	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	finaliza con la eliminación de medidas por parte del Min Salud.	**Budget**	0	**Responsible**	Executing Agency
Completion Date	3/24/2023	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
17	Inactive	Si los procesos de contratación no cumple con los plazos establecidos, aumentando los días previstos para la confección y revisión de pliegos cartelarios retrasa la publicación y eventual inicio de las obras; postergando la fecha para el último desembolso	1 - Low	3 - Medium High	Low	Macroeconomic environment

Details

Associated Outputs	- Caminos cantonales rehabilitados - Puentes construidos o rehabilitados (Incluyendo diseño adaptados a cambio climático)	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Time
Associated Outcomes	- Disminución de costos de operación vehicular - Disminución de costos de viaje - Mejora de la condición de la Red Vial Cantonal - Reducción de vulnerabilidad de las vías frente a efectos de CC	**Responsible**	Organismo Ejecutor	**Probability Factors**	1. Procesos de análisis y aprobación de carteles para obras y verificación de calidad están requiriendo más tiempo de lo previsto en el MANOP. 2. Se presenta saturación en envío de documentos para trámite de NOB y en publicación de carteles.
Description of Impact	Retrasa la publicación y eventual inicio de las obras; postergando la fecha para el último desembolso.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	Establecer mecanismos internos para acelerar la respuesta de aclaraciones y objeciones a los oferentes, y acelerar la evaluación de ofertas.	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	Hasta finalización y entrega de las obras del programa	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
Completion Date	9/2/2025	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
18	Active	Si no se cuenta con el equipo clave y el liderazgo de la UEC, con perfiles idóneos y dedicación a tiempo completo no se ejecutarán las actividades y coordinaciones interinstitucionales necesarias para la ejecución del programa conforme a lo previsto lo que generará mayores atrasos en el logro de las metas del Programa	2 - Medium Low	4 - High	Medium High	Project management capacity

Details

Associated Outputs	- Caminos cantonales rehabilitados - Cantones con intervención de seguridad vial - Mantenimiento rutinario por estándares realizado a través de microempresas - Manuales de seguridad vial y gestión socioambiental elaborados - Número de cantones con Planes Viales Quinquenales de conservación y desarrollo elaborados - Número de cantones con Planes de gestión de activos viales cantonales elaborados - Número de funcionarios responsables de la gestión vial municipal capacitados - Puentes construidos o rehabilitados (Incluyendo diseño adaptados a cambio climático) - Sistema de Gestión de Activos Viales implementado	**Source of Risk**	Institutional capacity	**Type of Impact**	- Time
Associated Outcomes	- Aumento de la presencia de mujeres en las microempresas de gestión vial - Disminución de costos de operación vehicular - Disminución de costos de viaje - Fortalecimiento institucional de los Municipios - Mejora de la condición de la Red Vial Cantonal - Reducción de vulnerabilidad de las vías frente a efectos de CC	**Responsible**	Organismo Ejecutor	**Probability Factors**	1. Se requiere de seguimiento socioambiental de Programa para el caso de Monterrey.
Description of Impact	Mayores atrasos en el logro de las metas físicas y financieras del Programa (incumplimiento en proyección de los desembolsos).				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status
1	Mantener refuerzo en áreas administrativa-financiera, legal y técnica; priorizar procesos de cierre, pagos y gestión contractual.	MITIGATE	ACTIVE

Details

Estimated Completion Date	Previo al cierre del Programa	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
Completion Date	12/1/2026	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status
2	i) En coordinación entre el Organismo Ejecutor y la Unidad Ejecutora se realizará la designación de los profesionales en los puestos requeridos, y ii) La Unidad Ejecutora deberá gestionar en tiempo, la contratación de 3 consultores individuales con experiencia en proyectos similares.	MITIGATE	COMPLETE

Details

Estimated Completion Date	Hasta finalización y entrega de las obras del programa	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
Completion Date	3/18/2026	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
19	Inactive	Si la formalización de los contratos y órdenes de inicio para el Producto 6. Caminos Cantonales Rehabilitados y Producto 7. Puentes Construidos o Rehabilitados, no se dan por fechas programadas en el PEP, se retrasa el inicio de las obras, aumentando la posibilidad de no ejecución del Programa dentro del plazo establecido.	3 - Medium High	3 - Medium High	High	Project management capacity

Details

Associated Outputs	- Número de cantones con Planes de gestión de activos viales cantonales elaborados - Sistema de Gestión de Activos Viales implementado	**Source of Risk**	Institutional capacity	**Type of Impact**	- Scope
Associated Outcomes	- Fortalecimiento institucional de los Municipios	**Responsible**	Organismo Ejecutor	**Probability Factors**	1. Durante el 2024 se tardó más de 6 meses en formalizar contrato para ejecutar campaña de seguridad. 2. Durante el 2024 se debió replantear alcance del SAGA y replantear el objetivo inicial del Programa en un SGAV. 3. La formalización de contratos a excedido los plazos programados
Description of Impact	Se retrasa el inicio de las obras, aumentando la posibilidad de no ejecución del Programa dentro del plazo establecido.				

Response Actions

19	1	**Response Description**		**Management Strategy**		**Status**	
		Concientizar a las autoridades de la necesidad de cumplir el plazo, para lograr los objetivos del Programa		MITIGATE		COMPLETE	
		Details					
		Estimated Completion Date	Hasta finalización y entrega de las obras del programa	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
		Completion Date	3/18/2026	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-
	2	**Response Description**		**Management Strategy**		**Status**	
		Dar seguimiento estratégico mensual del Producto 6. Caminos Cantonales Rehabilitados y Producto 7. Puentes Construidos o Rehabilitados para plantear medidas de contingencia en caso de rezagos, que permitan reducir los retrasos generados.		MITIGATE		COMPLETE	
		Details					
		Estimated Completion Date	Hasta finalización y entrega de las obras del programa	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
		Completion Date	3/18/2026	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-
	3	**Response Description**		**Management Strategy**		**Status**	
		Formalizar la entrega del Producto 6. Caminos Cantonales Rehabilitados y Producto 7. Puentes Construidos o Rehabilitados destinando el plazo remanente a corrección de defectos y cierre administrativo.		ACCEPT		COMPLETE	
		Details					
		Estimated Completion Date	Hasta finalización y entrega de las obras del programa	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
		Completion Date	3/18/2026	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-
	4	**Response Description**		**Management Strategy**		**Status**	
		Instruir al personal técnico y administrativo sobre la necesidad de evitar la tramitación de modificaciones contractuales en el Producto 6. Caminos Cantonales Rehabilitados y Producto 7. Puentes Construidos o Rehabilitados que impliquen no cumplir con el plazo del programa.		MITIGATE		COMPLETE	
		Details					
		Estimated Completion Date	Hasta el cierre del programa	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
		Completion Date	3/18/2026	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-
	5	**Response Description**		**Management Strategy**		**Status**	
		Dar seguimiento estratégico desde el Banco en la revisión de las comunicaciones que tramite el Organismo Ejecutor, desde la gestión del riesgo que prevenga de posibles retrasos en la ejecución, destinando parte del tiempo de los consultores de apoyo operativo.		MITIGATE		COMPLETE	
		Details					
		Estimated Completion Date	Hasta el cierre del programa	**Budget**	0	**Responsible**	BID
		Completion Date	3/18/2026	**Funding Source**	TECHNICA	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
20	Inactive	Si las reclamaciones de compensación económica de contratistas, derivadas de condiciones macroeconómicas y tipo de cambio, no se resuelven oportunamente y con criterios técnicos consistentes, podrían incrementarse los compromisos financieros o quedar recursos sin ejecutar, afectando el cierre financiero y el uso total del préstamo.	3 - Medium High	4 - High	High	Macroeconomic environment

Details

Associated Outputs	- Caminos cantonales rehabilitados - Puentes construidos o rehabilitados (Incluyendo diseño adaptados a cambio climático)	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Cost - Time
Associated Outcomes	- Disminución de costos de operación vehicular - Disminución de costos de viaje - Mejora de la condición de la Red Vial Cantonal	**Responsible**	Organismo Ejecutor	**Probability Factors**	Existen solicitudes de compensación económica en análisis; presión por maximizar uso de recursos antes de fecha límite de desembolso.
Description of Impact	Uso eficiente de los recursos.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	Algunas acciones: i) Aplicar guía técnica para compensaciones; ii) análisis conjunto UEC-BID; iii) definir elegibilidad y montos; iv) ajustar redistribución presupuestaria final.	MITIGATE	ACTIVE	

Details

Estimated Completion Date	Previo al cierre del Programa	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
Completion Date	7/26/2026	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
21	Active	Si no se redefine oportunamente la metodología para medir el impacto del Programa ante la discontinuidad del indicador original, podría no contarse con evidencia suficiente y comparable sobre el logro de los objetivos de desarrollo al cierre, afectando la evaluación final de la operación.	2 - Medium Low	3 - Medium High	Medium High	Scope and planning

Details

Associated Outputs	- Caminos cantonales rehabilitados - Cantones con intervención de seguridad vial - Mantenimiento rutinario por estándares realizado a través de microempresas - Manuales de seguridad vial y gestión socioambiental elaborados - Número de cantones con Planes Viales Quinquenales de conservación y desarrollo elaborados - Número de cantones con Planes de gestión de activos viales cantonales elaborados - Número de funcionarios responsables de la gestión vial municipal capacitados - Puentes construidos o rehabilitados (Incluyendo diseño adaptados a cambio climático) - Sistema de Gestión de Activos Viales implementado	**Source of Risk**	Project	**Type of Impact**	- Quality
Associated Outcomes	- Aumento de la presencia de mujeres en las microempresas de gestión vial - Disminución de costos de operación vehicular - Disminución de costos de viaje - Fortalecimiento institucional de los Municipios - Mejora de la condición de la Red Vial Cantonal - Reducción de vulnerabilidad de las vías frente a efectos de CC	**Responsible**	BID	**Probability Factors**	El indicador de impacto original dejó de publicarse; se requiere coordinación con SPD para definir medición alternativa y asegurar evaluación final.
Description of Impact	Logro de objetivos de desarrollo				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	Definir metodología alternativa con SPD; asegurar informe de evaluación de impacto; establecer indicador sustituto o narrativa metodológica.	MITIGATE	ACTIVE	

Details

Estimated Completion Date	Previo al cierre del Programa	**Budget**	0	**Responsible**	BID
Completion Date	12/1/2026	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

MATERIALIZED RISKS

EVALUATION TRACKING

Evaluación Económica Ex post del Programa

Evaluation

Evaluation Methodology as per DEM:	N/A
Current Evaluation Methodology:	Cost-Benefit Analysis Ex Post
Stage:	Pre-Internvention (Ex Ante)
Main Topic of the Intervention:	TRANSPORT
Other Topics of the Intervention:	TRANSPORT
Main Topic of the Evaluation:	TRANSPORT
Other Topics of the Evaluation:	TRANSPORT

The methodology has not change

Status of the evaluation:	Active
Expected Date of Final Evaluation Report:	9/20/2024
Responsible:	External
Information on Responsible:	MOPT

Funding

Source of funding:	
Amount in USD (Thousands):	
Code:	
Total amount in USD (Thousands) spent to date in data collection:	50000

Comments

3/20/2019	La evaluación se hace un año posterior, por lo que los fondos y el encargado es el MOPT. La evaluación se debe realizar una vez concluida la operación de préstamo, sin embargo el sistema no deja guardar si no se escoge la "etapa" "Pre-intervention (Ex-Ante)"
SOFIAF	

Documents

Stage	Type of document	Name	Document Description	Document Date	Document Number	Document Permissions	Document User

Evaluación de impacto del Programa

Evaluation

Evaluation Methodology as per DEM:	N/A
Current Evaluation Methodology:	Experimental –Random Assignment
Stage:	Baseline
Main Topic of the Intervention:	TRANSPORT
Other Topics of the Intervention:	TRANSPORT
Main Topic of the Evaluation:	TRANSPORT
Other Topics of the Evaluation:	TRANSPORT

The evaluation method has not change

Status of the evaluation:	Active
Expected Date of Final Evaluation Report:	10/20/2023
Responsible:	Project Team
Information on Responsible:	

Funding

Source of funding:	
Amount in USD (Thousands):	
Code:	
Total amount in USD (Thousands) spent to date in data collection:	300000

Comments

3/20/2019	
SOFIAF	

Documents

Stage	Type of document	Name	Document Description	Document Date	Document Number	Document Permissions	Document User


Validation Process

Date	User	Role	Action	Comment	Classification	Workflow
10/02/2026	MARIANOA	Team Leader	Completed by Team Leader		Satisfactory	Progress Monitoring Report September Validation Workflow


MONITORING INDICATORS Show

Stage 3: After Operation Reaches 95% of total Disbursements

		Benchmark Indicator Value			
Indicator (I)	**Project Indicator Value**	**Satisfactory**	**Alert**	**Problem**	**Traffic Light**
Synthetic Indicator (SI)	2.80	2.5 <= I	2<=I<2.5	I<2	SATISFACTORY
# of months elapsed after 95% disbursements reached	12.00	I <=11.85	11.85I <=19.61	'I>19.61	ALERT
Accumulated disbursements to country's historic disbursements	1.00	1 >= I >=0.79	0.79 > I >=0.72	0.72 > I >= 0	SATISFACTORY
Cost Performance Index (annual - CPI(a)	1.00	0.80 <= I <= 2.00	0.40 <= I < 0.80	0.00 <= I < 0.40	SATISFACTORY
Schedule Performance Index (annual)- SPI(a)	0.99	0.80 <= I <= 2.00	0.40 <= I < 0.80	0.00 <= I < 0.40	SATISFACTORY
Expected additional execution duration (months)		N/A	N/A	N/A	For tracking purpose only
Environmental and social safeguards performance rating	Partially Satisfactory	N/A	N/A	N/A	For tracking purpose only

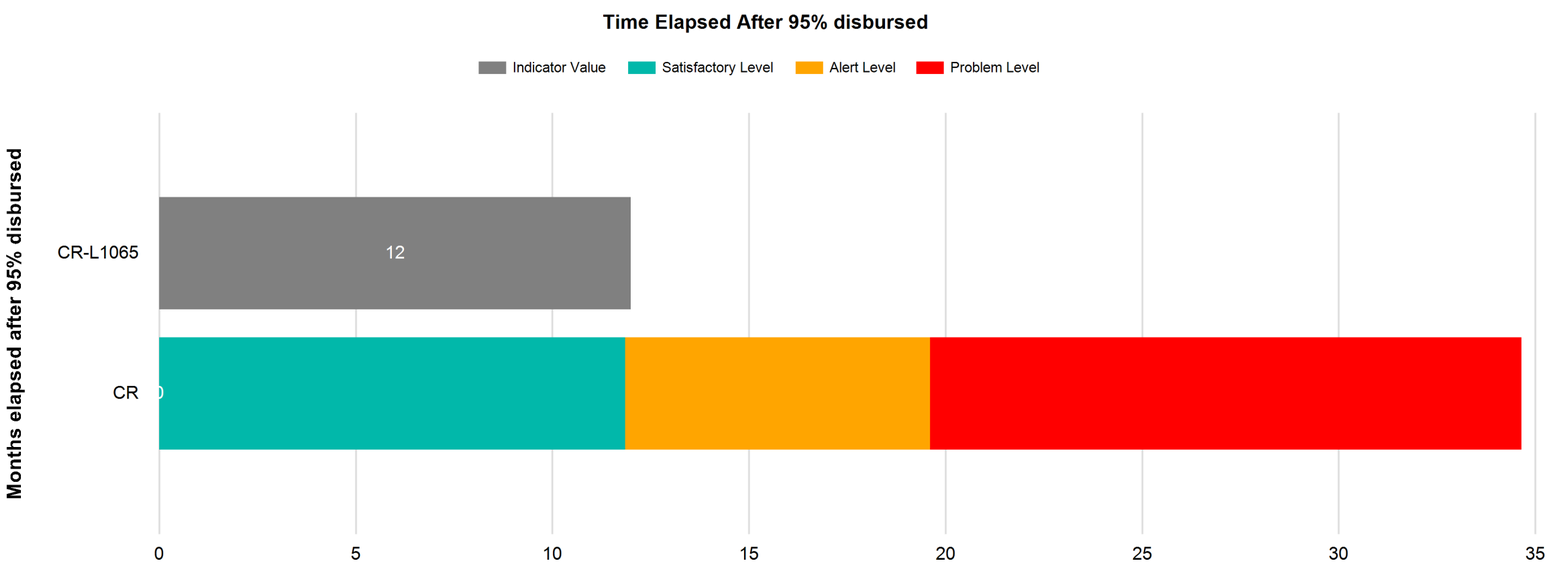


Accumulated disbursements as proportion of the total amount

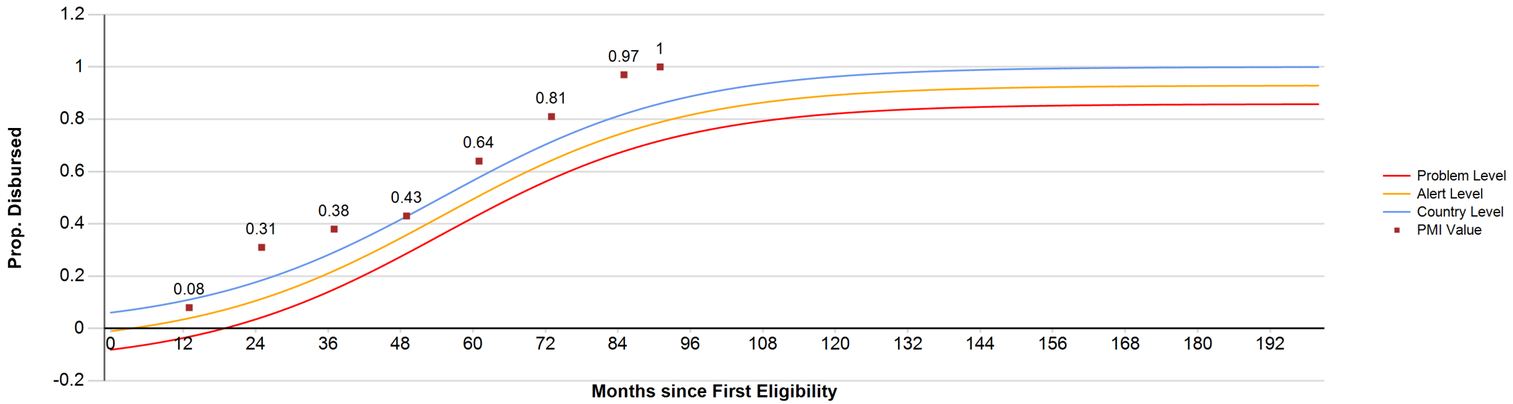


PV, AC, EV, PV(a), EV(a)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PV	0.00	392,808.00	10,385,810.00	46,525,199.00	98,691,714.00	142,736,000.00	142,736,000.00	142,736,000.00	142,736,000.00
AC	0.00	3,117,555.20	30,576,968.05	45,890,512.00	58,815,847.40	70,598,698.00	93,850,584.70	129,034,020.55	140,446,576.60
EV	0.00	3,117,555.20	17,553,871.93	27,635,909.66	62,047,349.09	103,896,239.40	112,971,033.08	138,231,309.63	142,636,313.09
PV(a)	0.00	392,808.00	32,540,699.20	62,024,253.05	95,013,271.52	89,796,662.95	114,049,687.97	142,431,000.14	141,982,489.36
EV(a)	0.00	3,117,555.20	40,917,467.61	67,013,513.33	62,953,110.42	78,085,764.61	108,941,949.64	135,216,599.97	140,646,064.87

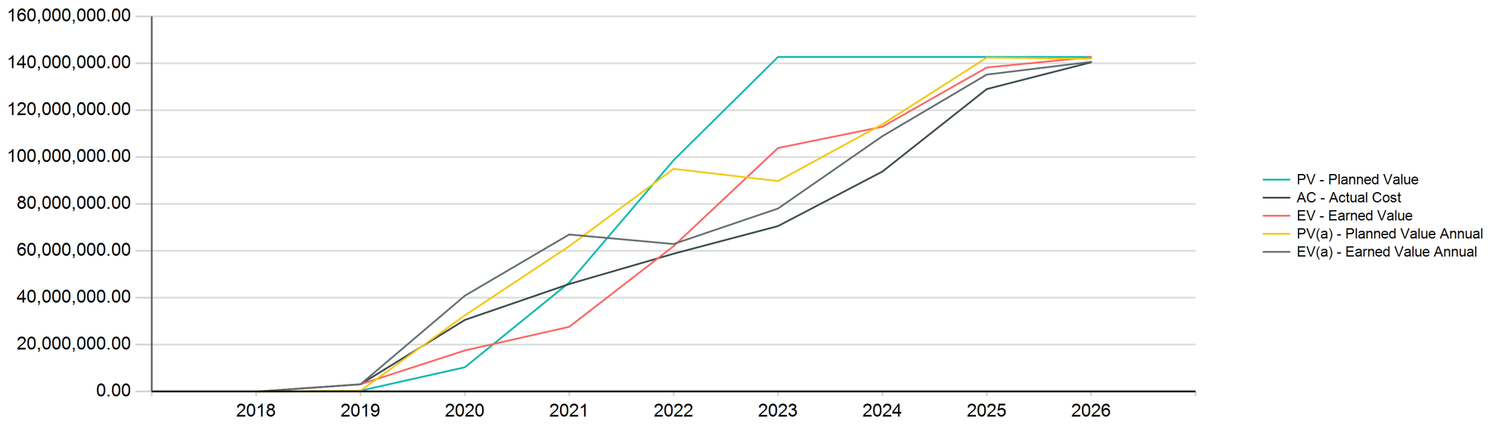

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CPI(a)	1.00	1.00	1.34	1.46	1.07	1.11	1.16	1.05	1.00
SPI(a)	1.00	7.94	1.26	1.08	0.66	0.87	0.96	0.95	0.99

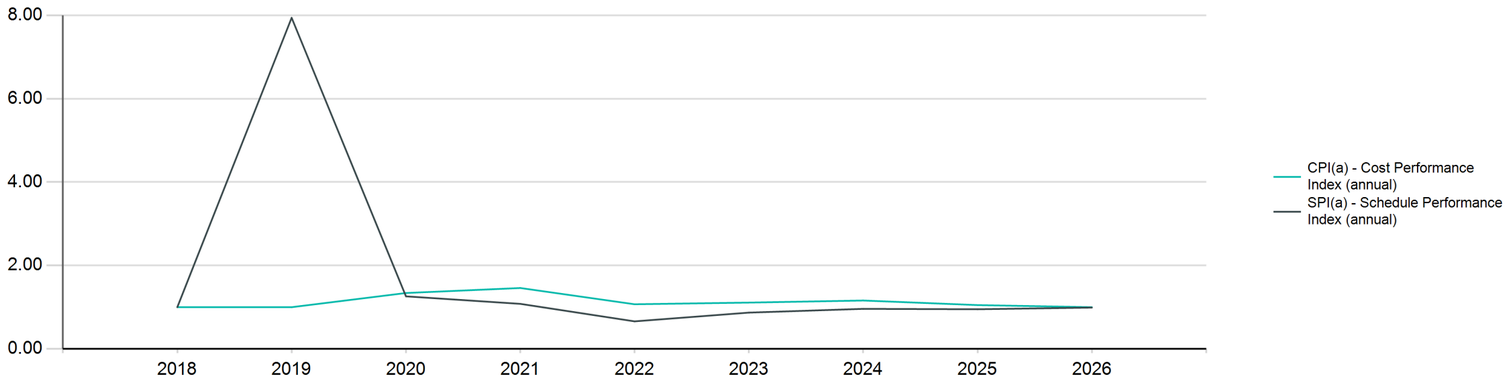
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
CPI(a) - Cost Performance Index (annual)
SPI(a) - Schedule Performance Index (annual)
