PMR Operational Report

Operation Number	CR-L1032	**Chief of Operations Validation Date**	
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2026	**Division Chief Validation Date**	
Last Update	10/02/26	**Country Representative Validation Date**	
PMR Validation Stage	Completed by Team Leader		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Infrastructure Transport Program (PIT)	**Loan Number**	3071/OC-CR, 3072/CH-CR
Executing Agency	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE	**Sector/Subsector**	TRANSPORT-TRANSPORT NETWORKS CONNECTIVITY
Team Leader	ANSALDO, MARIANO PEDRO	**Overall Stage**	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	**Country**	Costa Rica
Lending Instrument	Investment Loan	**PMR required**	YES
Borrower	REPUBLICA DE COSTA RICA	**Convergence related Operation(s)**	

Events Data

Supervision	
Signature	04/03/14
Ratification	11/13/14
Legal Effectiveness	11/13/14
Total Eligibility	03/04/16
Partial Eligibility	03/04/16
First Disbursement	04/07/16
Original Disbursement Expiration	11/13/26
Current Disbursement Expiration	11/13/26

Preparation

On pipeline	09/22/08
Start date	08/04/11
PP Approved	06/05/13
ERM POD Approved	05/24/13 10/03/23
DLP Approved by OPC	10/12/23
Negotiation	10/17/23
Operation Approved	11/13/13

Objective

Contribute to the development of the transport sector through the improvment of road and port infrastructure, which will benefit the conditions of mobility of people and goods, facilitating the flow of trade and regional economic integration of Costa Rica.

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	**Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?**	YES
Risk	High	**Date of approval**	09/11/24
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory		
Safeguard Performance Rating - Rationale	La clasificación se mantiene en Parcialmente Satisfactorio, debido a que se ha comprobado que el OE ha implementado la mayoría de las acciones correctivas para la atención a los pasivos socioambientales, asociados a temas de seguridad vial, peatonal, señalización, compensación forestal, revegetación y/o cobertura de taludes, colocación y adecuación de pasos de fauna, construcción de infraestructura comunal, entre otras. Es importante indicar que, para las acciones no materializadas identificadas, el OE ha presentado algunos documentos y demostrado en campo evidencia del avance en el proceso de las obras que se desarrollarán para la atención de estas, sin embargo, continúan pendientes algunas actividades.		

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

	Total Cost and Source					Available Funds (US$)			
Operations	**Original IDB**	**Current IDB**	**Local Counterpart**	**Co-Financing / Country**	**Total Original Cost**	**Current IDB**	**Disb. Amount to Date**	**% Disbursed**	**Undisbursed Amount**
CR-L1032	450,000,000	450,000,000	0	0	450,000,000	450,000,000	348,000,000	77.33%	102,000,000
Aggregated	**450,000,000**	**450,000,000**	**0**	**0**	**450,000,000**	**450,000,000**	**348,000,000**	**77.33%**	**102,000,000**

Development Effectiveness Matrix


Economic Analysis

Undefined	No
Cost benefit analysis	Yes
Cost effectiveness analysis	No
General economic analysis (Economic rate of return)	No

Evaluation

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Undefined	No
Random assignment	No
Non-experimental method	No
Ex-post cost benefit analysis	Yes
Ex-post cost effectiveness analysis	No
Before/after or With/without comparison	No

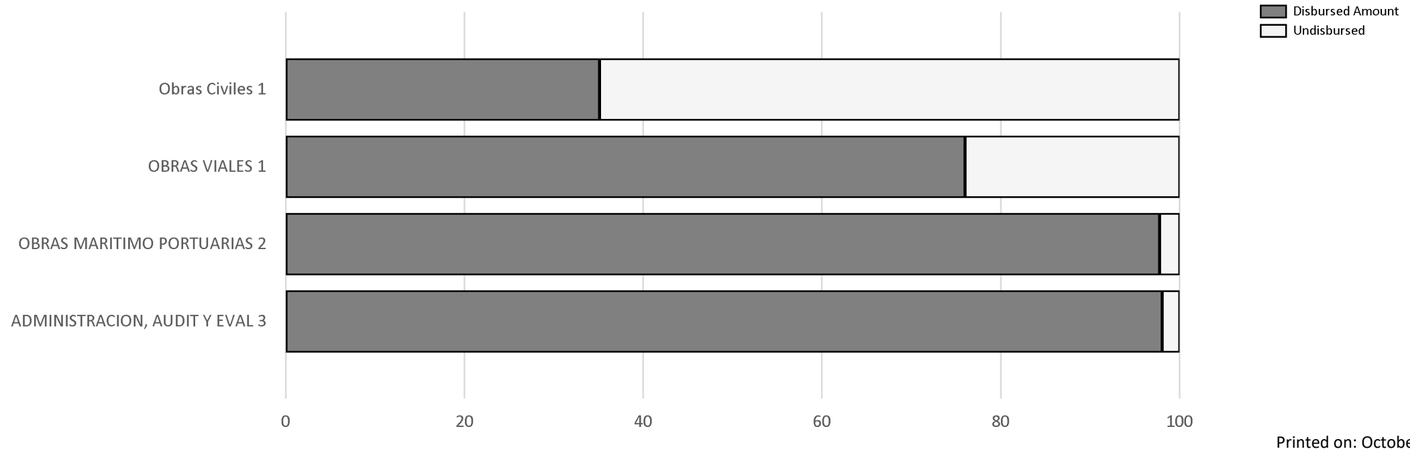

Printed on: October 14, 2026 4:55:58 PM

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Calidad de la Infraestructura de transporte

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		EOP 2026
0.0	Calidad de las carreteras (Indice de Competitividad Global)	ptos	2.7	2013	2026	P	3
						A	3

Details

Means of Verification: Publicación del Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Disminuir los costos de operación vehicular

Observation: Medio de verificación: Evaluaciones del proyecto mediante Highway Development and Management (HDM-4). El cálculo para autobús no incluye tiempos de parada. La definición de los tipos de vehículos se realiza con base en la clasificación del MOPT.

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2023	2024	2026	EOP 2026
0.0	Costo de operación de automóvil Proyecto Limonal – Cañas	US$/veh-km	0.24	2016	P	-	-	-	-	.24
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2023	2024	2026	EOP 2026
0.1	Costo de operación de camioneta Proyecto Limonal – Cañas	US$/veh-km	0.31	2016	P	-	-	-	-	.3
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution								

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2023	2024	2026	EOP 2026
0.2	Costo de operación de autobús Proyecto Limonal – Cañas	US$/veh-km	0.82	2016	P	-	-	-	-	.69
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution								

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2023	2024	2026	EOP 2026
0.3	Costo de operación de camión C2 Proyecto Limonal – Cañas	US$/veh-km	0.7	2016	P	-	-	-	-	.61
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution								

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2023	2024	2026	EOP 2026
0.4	Costo de operación de camión C3 Proyecto Limonal – Cañas	US$/veh-km	1	2016	P	-	-	-	-	.95
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution								

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2023	2024	2026	EOP 2026
0.5	Costo de operación de camión articulado Proyecto Limonal – Cañas	US$/veh-km	1.51	2016	P	-	-	-	-	1.32
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous**	No	**Afrodescendats-**	No	**Persons with**	No	**LGBTQ+**	No

		people-related		**related**		**disabilities-related**		**individuals-related**	
IF Contribution									

	Indicator	**Unit of Measure**	**Baseline**	**Baseline Year**		**2021**	**2023**	**2024**	**2026**	**EOP 2026**
0.6	Costo de operación de automóvil Proyecto Playa Naranjo- Paquera	US$/veh-km	0.36	2017	P	-	-	-	-	.25
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

	Indicator	**Unit of Measure**	**Baseline**	**Baseline Year**		**2021**	**2023**	**2024**	**2026**	**EOP 2026**
0.7	Costo de operación de camioneta Proyecto Playa Naranjo- Paquera	US$/veh-km	0.54	2017	P	-	-	-	-	.34
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

	Indicator	**Unit of Measure**	**Baseline**	**Baseline Year**		**2021**	**2023**	**2024**	**2026**	**EOP 2026**
0.8	Costo de operación de autobús Proyecto Playa Naranjo- Paquera	US$/veh-km	1.56	2017	P	-	-	-	-	1.02
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

	Indicator	**Unit of Measure**	**Baseline**	**Baseline Year**		**2021**	**2023**	**2024**	**2026**	**EOP 2026**
0.9	Costo de Operación de Camión C2 Proyecto Playa Naranjo- Paquera	US$/veh-km	1.24	2017	P	-	-	-	-	.87
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

	Indicator	**Unit of Measure**	**Baseline**	**Baseline Year**		**2021**	**2023**	**2024**	**2026**	**EOP 2026**
0.10	Costo de Operación de Camión C3 Proyecto Playa Naranjo- Paquera	US$/veh-km	1.84	2017	P	-	-	-	-	1.18
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2023	2024	2026	EOP 2026
0.11	Costo de Operación de camión articulado Proyecto Playa Naranjo- Paquera	US$/veh-km	2.73	2017	P	-	-	-	-	1.39
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2023	2024	2026	EOP 2026
0.12	Costo de operación de automóvil Proyecto Barranca – Limonal	US$/veh-km	0.24	2016	P	-	-	-	-	.24
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2023	2024	2026	EOP 2026
0.13	Costo de operación de camioneta Proyecto Barranca – Limonal	US$/veh-km	0.31	2016	P	-	-	-	-	.31
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2023	2024	2026	EOP 2026
0.14	Costo de operación de autobús Proyecto Barranca – Limonal	US$/veh-km	0.84	2016	P	-	-	-	-	.71
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2023	2024	2026	EOP 2026
0.15	Costo de Operación de Camión C2 Proyecto Barranca – Limonal	US$/veh-km	0.73	2016	P	-	-	-	-	.64
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution								

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2023	2024	2026	EOP 2026
0.16	Costo de Operación de Camión C3 Proyecto Barranca – Limonal	US$/veh-km	1.02	2016	P	-	-	-	-	.98
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution								

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2023	2024	2026	EOP 2026
0.17	Costo de Operación de camión articulado Proyecto Barranca – Limonal	US$/veh-km	1.52	2016	P	-	-	-	-	1.36
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution								

Specific Development Objectives Nbr. 1: Reducir tiempos de viaje de personas y bienes

Observation: Medio de verificación: Evaluaciones del proyecto mediante HDM-4. El cálculo para autobús no incluye tiempos de parada. La definición de los tipos de vehículos se realiza con base en la clasificación del MOPT.

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2023	2024	2026	EOP 2026
1.0	Tiempo medio de viaje de automóvil Proyecto Limonal – Cañas	min	63	2016	P	-	-	-	-	47
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution								

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2023	2024	2026	EOP 2026
1.1	Tiempo medio de viaje de camioneta Proyecto Limonal – Cañas	min	56	2016	P	-	-	-	-	48
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2023	2024	2026	EOP 2026
1.2	Tiempo medio de viaje de autobús Proyecto Limonal – Cañas	min	84	2016	P	-	-	-	-	54
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2023	2024	2026	EOP 2026
1.3	Tiempo medio de viaje de camión C2 Proyecto Limonal – Cañas	min	77	2016	P	-	-	-	-	56
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2023	2024	2026	EOP 2026
1.4	Tiempo medio de viaje de camión C3 Proyecto Limonal – Cañas	min	84	2016	P	-	-	-	-	47
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2023	2024	2026	EOP 2026
1.5	Tiempo medio de viaje de camión articulado Proyecto Limonal – Cañas	min	75	2016	P	-	-	-	-	55
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2023	2024	2026	EOP 2026
1.6	Tiempo medio de viaje de automóvil Proyecto Playa Naranjo- Paquera	min	33	2017	P	-	-	-	-	21
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution								

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2023	2024	2026	EOP 2026
1.7	Tiempo medio de viaje de camioneta Proyecto Playa Naranjo- Paquera	min	32	2017	P	-	-	-	-	22
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution								

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2023	2024	2026	EOP 2026
1.8	Tiempo medio de viaje de autobús Proyecto Playa Naranjo- Paquera	min	43	2017	P	-	-	-	-	29
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous**	No	**Afrodescendats-**	No	**Persons with**	No	**LGBTQ+**	No
IF Contribution								

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2023	2024	2026	EOP 2026
1.9	Tiempo medio de viaje de camión C2 Proyecto Playa Naranjo- Paquera	min	41	2017	P	-	-	-	-	30
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution								

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2023	2024	2026	EOP 2026
1.10	Tiempo medio de viaje de camión C3 Proyecto Playa Naranjo- Paquera	min	42	2017	P	-	-	-	-	26
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous**	No	**Afrodescendats-**	No	**Persons with**	No	**LGBTQ+**	No

		people-related		**related**		**disabilities-related**		**individuals-related**	
IF Contribution									

	Indicator	**Unit of Measure**	**Baseline**	**Baseline Year**		**2021**	**2023**	**2024**	**2026**	**EOP 2026**
1.11	Tiempo medio de viaje de camión articulado Proyecto Playa Naranjo- Paquera	min	17	2017	P	-	-	-	-	8
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

	Indicator	**Unit of Measure**	**Baseline**	**Baseline Year**		**2021**	**2023**	**2024**	**2026**	**EOP 2026**
1.12	Tiempo medio de viaje de automóvil Proyecto Barranca – Limonal	min	45	2016	P	-	-	-	-	32
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

	Indicator	**Unit of Measure**	**Baseline**	**Baseline Year**		**2021**	**2023**	**2024**	**2026**	**EOP 2026**
1.13	Tiempo medio de viaje de camioneta Proyecto Barranca – Limonal	min	39	2016	P	-	-	-	-	32
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

	Indicator	**Unit of Measure**	**Baseline**	**Baseline Year**		**2021**	**2023**	**2024**	**2026**	**EOP 2026**
1.14	Tiempo medio de viaje de autobús Proyecto Barranca – Limonal	min	61	2016	P	-	-	-	-	38
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

	Indicator	**Unit of Measure**	**Baseline**	**Baseline Year**		**2021**	**2023**	**2024**	**2026**	**EOP 2026**
1.15	Tiempo medio de viaje de camión C2 Proyecto Barranca – Limonal	min	55	2016	P	-	-	-	-	39
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2023	2024	2026	EOP 2026
1.16	Tiempo medio de viaje de camión C3 Proyecto Barranca – Limonal	min	61	2016	P	-	-	-	-	32
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2023	2024	2026	EOP 2026
1.17	Tiempo medio de viaje de camión articulado Proyecto Barranca – Limonal	min	54	2016	P	-	-	-	-	39
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Evaluaciones ex-ante y ex-post del proyecto mediante HDM-4.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

Specific Development Objectives Nbr. 2: Incrementar la seguridad vial y portuaria

Observation: Evaluación iRAP en rutas intervenidas al final del programa. Fuente: Estudios de campo (MOPT). Evaluación de riesgo de falla aplicando el modelo de la evaluación ex-ante con datos actualizados. Se define falla grave aquella que produzca una destrucción de 75 metros en el rompeolas. Registro de días anuales de operación de las terminales sin afectaciones debidas a fallas en la infraestructura. Encuestas de satisfacción de los usuarios, discriminadas por sexo, en cada terminal con una muestra estadísticamente representativa. Aumento del 15%.

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2023	2024	2026	EOP 2026
2.0	Nivel de seguridad de la vía del tramo Barranca Limonal (cantidad de estrellas mediante la metodología de iRAP5 ponderadas por kilómetro)	#estrellas	2	2016	P	-	-	-	-	3
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Evaluación iRAP en rutas intervenidas al final del programa. Fuente: Estudios de campo (MOPT)

Observations: Alineado con la Meta Global 3 de Seguridad Vial, del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2023	2024	2026	EOP 2026
2.1	Nivel de seguridad de la vía del tramo Limonal -Cañas (cantidad de estrellas mediante la metodología de iRAP5 ponderadas por kilómetro)	#estrellas	2	2016	P	-	-	-	-	3
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Evaluación iRAP en rutas intervenidas al final del programa. Fuente: Estudios de campo (MOPT)

Observations: Alineado con la Meta Global 3 de Seguridad Vial, del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No

IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2023	2024	2026	EOP 2026
2.2	Nivel de seguridad de la vía del tramo Playa Naranjo – Paquera. (cantidad de estrellas mediante la metodología de iRAP5 ponderadas por kilómetro)	#estrellas	2	2016	P	-	-	-	-	3
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Evaluación iRAP en rutas intervenidas al final del programa. Fuente: Estudios de campo (MOPT)

Observations: Alineado con la Meta Global 3 de Seguridad Vial, del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	Indigenous people-related	No	Afrodescendats-related	No	Persons with disabilities-related	No	LGBTQ+ individuals-related	No

IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2023	2024	2026	EOP 2026
2.3	Probabilidad de ocurrencia de una falla grave en el rompeolas del Puerto de Caldera (escenario a 20 años)	Porcentaje	42.29	2013	P	-	-	-	-	1.42
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Evaluación de riesgo de falla aplicando el modelo de la evaluación ex-ante con datos actualizados. Se define falla grave aquella que produzca una destrucción de 75 metros en el rompeolas

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	Indigenous people-related	No	Afrodescendats-related	No	Persons with disabilities-related	No	LGBTQ+ individuals-related	No

IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2023	2024	2026	EOP 2026
2.4	Porcentaje de tiempo de operatividad de las terminales de transbordadores del Golfo de Nicoya (medido en un año)	Porcentaje	100	2013	P	-	-	-	-	100
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Registro de días anuales de operación de las terminales sin afectaciones debidas a fallas en la infraestructura.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	Indigenous people-related	No	Afrodescendats-related	No	Persons with disabilities-related	No	LGBTQ+ individuals-related	No

IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2023	2024	2026	EOP 2026
2.5	Porcentaje de aumento de satisfacción de los usuarios de las terminales de transbordadores del Golfo de Nicoya (Hombres).	Porcentaje	63.8	2017	P	-	-	-	-	78.8
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Encuestas de satisfacción de los usuarios, discriminadas por sexo, en cada terminal con una muestra estadísticamente representativa. Aumento del 15%.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	Indigenous people-related	No	Afrodescendats-related	No	Persons with disabilities-related	No	LGBTQ+ individuals-related	No

IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2023	2024	2026	EOP 2026
2.6	Porcentaje de aumento de satisfacción de los usuarios de las terminales de transbordadores del Golfo de Nicoya (Mujeres).	Porcentaje	61.6	2017	P	-	-	-	-	76.6
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Encuestas de satisfacción de los usuarios, discriminadas por sexo, en cada terminal con una muestra estadísticamente representativa. Aumento del 15%.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	Yes	Indigenous people-related	No	Afrodescendats-related	No	Persons with disabilities-related	No	LGBTQ+ individuals-related	No
IF Contribution									

RESULTS MATRIX

OUTPUTS PHYSICAL PROGRESS

Component Nbr. 1: Obras viales

	Output	Unit of Measure		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.1	Diseño de Intercambiadores La Lima y Taras. Ruta 2. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles.	Km	P	-	0	0	0	4.5	0	-	-	-	-
			P (a)	-	0	0	0	3.6	0	0	-	-	0
			A	-	0	0	0	3.6	0	0	-	-	0

Details

Means of Verification: Obra realizada

Gender-related	No	Indigenous people-related	No	Afrodescendats-related	No	Persons with disabilities-related	No	LGBTQ+ individuals-related	No
IF Contribution				Strategic Alignment					

Milestone				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Nº de pasos a desnivel diseñados	Número	P	-	0	0	0	3	0	-	-	-	-
			P (a)	-	0	0	0	0	3	0	-	-	0
			A	0	0	0	0	3	3	0	-	-	0
	Nº de bahías de autobuses diseñados	Número	P	-	0	0	2	2	0	-	-	-	-
			P (a)	-	0	0	0	2	0	0	-	-	0
			A	0	0	0	0	12	0	0	-	-	0
	Nº de puentes peatonales diseñados	Número	P	-	0	0	0	1	0	-	-	-	-
			P (a)	-	0	0	0	0	2	0	-	-	0
			A	0	0	0	0	2	2	0	-	-	0

	Output	Unit of Measure		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.2	Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado (incluye vía, puentes e intercambiadores). Ruta 1. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles	Km	P	-	0	0	0	0	49	-	-	-	-
			P (a)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2025	2026	2027	EOP 2026
-	-	-	4.5
0	0	0	3.6
0	0	-	3.6

2025	2026	2027	EOP 2026
-	-	-	3
0	0	0	6
0	0	-	6
-	-	-	4
0	0	0	12
0	0	-	12
-	-	-	1
0	0	0	4
0	0	-	4

2025	2026	2027	EOP 2026
-	-	-	49
0	49	0	49

Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado (incluye vía, puentes e intercambiadores). Ruta 1. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles	Km	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Details

Means of Verification: Informes de avance y de recepción de obras.

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

Milestone				**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Nº de pasos a desnivel construidos	Número	P	-	0	0	0	1	3	-	-	-	-
			P (a)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Km aceras construidas	km	P	-	0	0	0	4	6	-	-	-	-
			P (a)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Km Ciclovías construidas	km	P	-	0	0	0	1.5	4.5	-	-	-	-
			P (a)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Km Calles marginales construidas	km	P	-	0	0	0	3	7	-	-	-	-
			P (a)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nº Puentes peatonales construidos	Número	P	-	0	0	0	2	8	-	-	-	-
			P (a)	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nº Bahías de autobuses construidas	Número	P	-	0	0	0	10	28	-	-	-	-
			P (a)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nº Puentes vehiculares construidos o rehabilitados	Número	P	-	0	0	0	4	7	-	-	-	-
			P (a)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nº Pasos aéreos para animales construidos	Número	P	0	0	0	0	4	11	-	-	-	-
			P (a)	-	0	0	0	4	0	0	0	0	0
			A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nº Pasos terrestres para animales construidos	Número	P	-	0	0	0	4	11	-	-	-	-
			P (a)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			A	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	-	0

2025	2026	2027	EOP 2026
-	-	-	4
0	4	0	4
0	0	-	0
-	-	-	10
0	10	0	10
0	0	-	0
-	-	-	6
0	6	0	6
0	0	-	0
-	-	-	10
0	10	0	10
0	0	-	0
-	-	-	10
0	10	0	10
0	0	-	0
-	-	-	38
0	38	0	38
0	0	-	0
-	-	-	11
0	11	0	11
0	0	-	0
-	-	-	15
0	15	0	15
0	0	-	0
-	-	-	15
0	15	0	15
0	0	-	0

	Output	Unit of Measure		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.3	Ampliación y Rehabilitación Cañas-Limonal. Ruta 1. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles.	Km	P	-	0	0	0	20.5	0	-	-	-	-
			P (a)	-	0	0	0	0	0	0	20.5	20.5	0
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	20.5	0

Details

Means of Verification: Informes de avance y de recepción de obras.

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

2025	2026	2027	EOP 2026
-	-	-	20.5
0	0	0	20.5
0	0	-	20.5

Milestone				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Nº de pasos a desnivel construidos	Número	P	-	0	0	1	0	0	-	-	-	-
			P (a)	-	0	0	0	0	0	0	3	1	0
			A	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
	Nº de Puentes vehiculares construidos y rehabilitados	Número	P	-	0	0	3	3	0	-	-	-	-
			P (a)	-	0	0	0	0	0	0	6	1	0
			A	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0
	Nº de Bahías de autobuses construidas	Número	P	-	0	3	6	10	0	-	-	-	-
			P (a)	-	0	0	0	0	0	0	28	28	0
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0
	Nº de Puentes peatonales construidos	Número	P	-	0	1	5	2	0	-	-	-	-
			P (a)	-	0	0	0	2	0	0	5	7	0
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0
	Nº de Pasos aéreos para animales construidos	Número	P	-	0	0	3	4	0	-	-	-	-
			P (a)	-	0	0	0	0	0	0	6	6	0
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
	Nº de Pasos terrestres para animales construidos	Número	P	-	0	0	5	2	0	-	-	-	-
			P (a)	-	0	0	0	0	0	0	10	10	0
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
	Km de calles marginales construídas	Kilometros	P	-	0	0	3	2	0	-	-	-	-
			P (a)	-	0	0	0	2	0	0	22	22	0
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0
	Km de Ciclovías construídas	Kilometros	P	-	0	0	2	1	0	-	-	-	-
			P (a)	-	0	0	0	1	0	0	0	-	0
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
	Km de Aceras construídas	Kilometros	P	-	0	0	4	1	0	-	-	-	-
			P (a)	-	0	0	0	0	0	0	24	24	0
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0

1.4	Output	Unit of Measure		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Rehabilitación Playa Naranjo Paquera. Ruta 160. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles.	Km	P	-	0	0	0	22.5	0	-	-	-	-
			P (a)	-	0	0	0	0	0	22.5	-	-	0

2025	2026	2027	EOP 2026
-	-	-	1
0	0	0	3
0	0	-	3
-	-	-	6
0	0	0	6
0	0	-	6
-	-	-	19
0	0	0	28
0	0	-	28
-	-	-	8
0	0	0	7
0	0	-	7
-	-	-	7
0	0	0	6
0	0	-	6
-	-	-	7
0	0	0	10
0	0	-	10
-	-	-	5
0	0	0	22
0	0	-	22
-	-	-	3
0	0	0	0
0	0	-	0
-	-	-	5
0	0	0	24
0	0	-	24

2025	2026	2027	EOP 2026
-	-	-	22.5
0	0	0	22.5

Rehabilitación Playa Naranjo Paquera. Ruta 160. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles.	Km	A	0	0	0	0	0	0	22.5	-	-	0

Details

Means of Verification: Informes de avance y de recepción de obras.

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

Milestone				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Nº de Puentes vehiculares construidos y rehabilitados	Número	P	-	0	0	1	2	0	-	-	-	-
			P (a)	-	0	0	0	2	1	0	-	-	0
			A	0	0	0	0	0	1	2	-	-	0
	Nº de Pasos aéreos para animales construidos	Número	P	-	0	0	2	3	0	-	-	-	-
			P (a)	-	0	0	0	3	5	0	-	-	0
			A	0	0	0	0	0	5	0	-	-	0
	Nº de Pasos terrestres para animales construidos	Número	P	-	0	0	2	3	0	-	-	-	-
			P (a)	-	-	0	0	3	5	0	-	-	0
			A	0	0	0	0	0	5	0	-	-	0
	Km de aceras construidas	Kilometros	P	-	0	0	0	1	0	-	-	-	-
			P (a)	-	0	0	0	1	0	0	-	-	0
			A	0	0	0	0	0	0	1	-	-	0

Output	**Unit of Measure**		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Otros tramos viales: Ruta Nacional 35 (En la Operación CR-L1151 se presentan los indicadores de resultados para la RN35)	Km	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P (a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.5

Details

Means of Verification: Informes de avance y de recepción de obras.

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

0	0	-	22.5

2025	2026	2027	EOP 2026
-	-	-	3
-	0	0	3
0	0	-	3
-	-	-	5
-	0	0	5
0	0	-	5
-	-	-	5
-	0	0	5
0	0	-	5
-	-	-	1
0	0	-	1

2025	2026	2027	EOP 2026
0	18	-	18
0	18	0	18
0	0	-	0

Milestone				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Nº Estudios básicos elaborados	Unidad	P	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-
			P (a)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nº Diseños finales elaborados	Unidad	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			P (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de puentes vehiculares construidos o rehabilitados	Unidad	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			P (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de pasos a desnivel construidos	Unidad	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			P (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N° de Intercambios construidos	Unidad	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			P (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de pasos de fauna construidos	Unidad	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			P (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Metros de Facilidades peatonales y ciclistas implementadas	metros	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			P (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Component Nbr. 2: Obras marítimo-portuarias

	Output	Unit of Measure		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.1	Terminales de transbordadores rehabilitadas	terminales	P	-	0	0	0	3	0	-	-	-	-
			P (a)	-	0	0	0	0	0	0	0	1	0
			A	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Details

Means of Verification: Informes de avance y de recepción de obras.

2025	2026	2027	EOP 2026
1	2	-	3
1	3	0	3
0	0	-	0
-	5	-	5
-	5	0	5
0	0	-	0
2	3	-	5
2	5	0	5
0	0	-	0
1	3	-	4
1	4	0	4
0	0	-	0
1	3	-	4
1	3	0	3
0	0	-	0
-	16	-	16
-	16	0	16
0	0	-	0
-	5,767	-	5,767
-	5,767	0	5,767
0	0	-	0

2025	2026	2027	EOP 2026
-	-	-	3
0	0	0	1
0	0	-	1

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.2	Rompeolas de Caldera rehabilitado	m	P	-	0	0	0	320	0	-	-	-	-
			P (a)	-	0	0	0	0	0	594	-	-	0
			A	0	0	0	0	0	0	594	-	-	0

Details

Means of Verification: Informes de avance y de recepción de obras.

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.3	Rompeolas de Caldera ampliado	m	P	-	0	0	0	66	0	-	-	-	-
			P (a)	-	0	0	0	0	0	38	-	-	0
			A	0	0	0	0	0	0	38	-	-	0

Details

Means of Verification: Informes de avance y de recepción de obras.

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

2025	2026	2027	EOP 2026
-	-	-	320
0	0	0	594
0	0	-	594

2025	2026	2027	EOP 2026
-	-	-	66
0	0	0	38
0	0	-	38

	Output	Unit of Measure		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.4	Plan Maestro Caldera desarrollado	Plan	P	-	0	0	0	1	0	-	-	-	-
			P (a)	-	0	0	0	1	0	0	-	-	0
			A	0	0	0	0	1	0	0	-	-	0

Details

Means of Verification: Informes de avance y de recepción de obras.

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

OUTPUTS FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1: Obras viales

Component revised cost: 372,129,456

	Output	Unit of Measure		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.1	Diseño de Intercambiadores La Lima y Taras. Ruta 2. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles.	Km	P	-	361,300	208,900	12,250,700	7,154,300	1,024,800	-	-	-	-
			P (a)	-	361,300	0	350,000	0	175,493.76	0	0	0	0
			A	0	0	350,000	359,146.5	2,494.5	1,578,320.17	1,483,837.32	2,893,075.57	6,719,894.76	0

Details

Means of Verification: Obra realizada

Gender-related		**Indigenous people-related**		**Afrodescendats-related**		**Persons with disabilities-related**		**LGBTQ+ individuals-related**	
IF indicator					**Strategic Alignment**				

2025	2026	2027	EOP 2026
-	-	-	1
0	0	0	1
0	0	-	1

2025	2026	2027	EOP 2026
-	-	-	21,000,000
0	0	0	13,386,768.82
0	0	-	13,386,768.82

	Output	Unit of Measure		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.2	Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado (incluye vía, puentes e intercambiadores). Ruta 1. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles	Km	P	-	-	3,293,400	28,875,400	121,550,000	45,441,200	-	-	-	-
			P (a)	-	-	3,401,775	26,999,657.73	0	1,017,859.52	84,630,569.3	41,300,257.71	95,800,360.68	14,067,119.19
			A	0	0	293,766.12	332.43	7,520.47	6,558,332.86	8,511,084.97	22,695,118.5	5,476,447.84	16,620,530.81

Details

Means of Verification: Informes de avance y de recepción de obras.

Gender-related		**Indigenous people-related**		**Afrodescendats-related**		**Persons with disabilities-related**		**LGBTQ+ individuals-related**	
IF indicator					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.3	Ampliación y Rehabilitación Cañas-Limonal. Ruta 1. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles.	Km	P	-	-	802,600	33,527,000	41,530,600	9,139,800	-	-	-	-
			P (a)	-	-	956,445	15,170,682.43	7,776,773.89	19,392,539.81	34,148,827	19,687,640.84	1,642,251	4,752,375.42
			A	0	0	249.83	18,140,620.74	7,423,953.5	23,407,638.29	25,981,362.11	30,722,070.29	8,389,358.2	3,853,967.99

Details

Means of Verification: Informes de avance y de recepción de obras.

Gender-related		**Indigenous people-related**		**Afrodescendats-related**		**Persons with disabilities-related**		**LGBTQ+ individuals-related**	
IF indicator					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.4	Rehabilitación Playa Naranjo Paquera. Ruta 160. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles.	Km	P	-	-	268,900	22,198,300	5,532,800	-	-	-	-	-
			P (a)	-	-	308,232	16,065,317.82	22,141,763.11	14,871,204.58	9,439,320.86	71,605.1	4,666,730.69	406,555.93

2025	2026	2027	EOP 2026
-	-	-	199,160,000
7,136,666.76	0	0	60,163,134
0	259,428.56	-	60,422,562.56

2025	2026	2027	EOP 2026
-	-	-	85,000,000
4,127,528.62	2,081,656.77	-	120,997,141.91
996,264.19	826,415.22	-	119,741,900.36

2025	2026	2027	EOP 2026
-	-	-	28,000,000
1,777,449.32	286,295.58	-	40,939,435.96

	Rehabilitación Playa Naranjo Paquera. Ruta 160. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles.	Km	A	0	0	186.41	3,803,482.41	8,068,725.69	12,232,355.09	9,161,057.8	121,656.9	3,845,154.51	2,093,735.5

Details

Means of Verification: Informes de avance y de recepción de obras.

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.5	Otros tramos viales: Ruta Nacional 35 (En la Operación CR-L1151 se presentan los indicadores de resultados para la RN35)	Km	P	-	-	-	-	23,500,000	23,500,000	-	-	-	-
			P (a)	-	-	156,200	4,397,440.95	3,314,384.32	2,860,207.85	11,234,690	415,125.49	12,474,263.04	4,385,885.99
			A	0	0	3,267,954.02	3,832,846.38	1,718,943.91	2,965,108.6	1,039,234.54	989,777.71	1,377,187.96	171,447.3

Details

Means of Verification: Informes de avance y de recepción de obras.

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

Component Nbr. 2: Obras marítimo-portuarias

Component revised cost: 18,884,501

	Output	Unit of Measure		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.1	Terminales de transbordadores rehabilitadas	terminales	P	-	-	-	3,800,000	4,750,000	950,000	-	-	-	-
			P (a)	-	-	-	380,000	132,900	475,174.4	3,400,000	1,940,252.2	1,347,906	33,780.11
			A	0	0	24,553.28	23,439.17	61,800	78,127.67	21.49	3,148,183.08	2,410,891.23	33,780.11

Details

Means of Verification: Informes de avance y de recepción de obras.

1,326,786.07	19,670.68	-	40,672,811.06

2025	2026	2027	EOP 2026
-	-	-	47,000,000
127,320	83,391,319.97	29,761,571.4	136,642,975.31
8,127,583.52	4,394,306.08	-	27,884,390.02

2025	2026	2027	EOP 2026
-	-	-	9,500,000
0	331,716.97	-	6,112,513
0	0	-	5,780,796.03

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No	
IF indicator					**Strategic Alignment**					

	Output	Unit of Measure		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.2	Rompeolas de Caldera rehabilitado	m	P	-	-	-	5,908,500	3,446,600	492,400	-	-	-	-
			P (a)	-	-	-	1,113,285.7	1,100,000	3,818,487.72	1,584,083.63	0	0	0
			A	0	0	247.85	2,423	448,499.86	3,818,487.72	3,129,444.48	0	0	0

Details

Means of Verification: Informes de avance y de recepción de obras.

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No	
IF indicator					**Strategic Alignment**					

	Output	Unit of Measure		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.3	Rompeolas de Caldera ampliado	m	P	-	-	-	1,969,500	1,148,900	164,100	-	-	-	-
			P (a)	-	-	-	213,000	244,454.98	1,536,450.99	1,584,083.63	0	0	0
			A	0	0	-	214,000	244,454.98	2,630,869.31	1,715,462.8	0	0	0

Details

Means of Verification: Informes de avance y de recepción de obras.

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No	
IF indicator					**Strategic Alignment**					

2025	2026	2027	EOP 2026
-	-	-	9,847,500
0	0	-	7,399,102.91
0	0	-	7,399,102.91

2025	2026	2027	EOP 2026
-	-	-	3,282,500
0	0	-	4,804,787.09
0	0	-	4,804,787.09

	Output	Unit of Measure		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.4	Plan Maestro Caldera desarrollado	Plan	P	-	-	-	439,500	630,400	130,100	-	-	-	-
			P (a)	-	-	-	380,800	357,000	231,920	0	0	0	0
			A	0	137	41.42	280,000	56,000	231,919.58	0	0	0	0

Details

Means of Verification: Informes de avance y de recepción de obras.

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

Other Costs

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Cost
Supervisión de obras	P	-	523,500	1,961,100	7,008,700	8,245,600	6,685,100	-	-	-	-	-	-	-	24,424,000
	P (a)	-	523,500	940,000	4,747,471.91	4,416,347	1,323,271.18	1,343,972	2,310,280.1	8,185,567.92	2,518,415.44	835,755.07	1,998,821.54	-	36,149,603
	A	-	355,372.45	1,585,868.42	2,786,939.5	3,157,399.86	4,126,615.87	8,025,042.94	5,089,524.38	4,910,892.07	2,990,126.11	1,122,999.86	61,409.4	-	34,212,190.86
Gestión socioambiental	P	-	1,256,200	1,665,500	707,900	554,700	275,700	-	-	-	-	-	-	-	4,460,000
	P (a)	-	1,256,200	1,148,762	286,848	274,551.5	587,196.34	808,901	574,745.5	824,803.3	314,350.84	197,550	280,144.5	-	5,422,661
	A	-	261,689.6	986,547.09	922,419.86	644,564.57	529,251.4	719,968.21	313,461.69	397,708.51	306,835.57	60,070	17,352.38	-	5,159,868.88
Contingencias y escalamientos	P	-	-	-	-	-	9,717,800	-	-	-	-	-	-	-	9,717,800
	P (a)	-	-	-	-	-	3,903,329.47	-	-	1,531,759.79	-	-	-	-	-
	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Monitoreo y evaluacion	P	-	-	-	75,000	-	75,000	-	-	-	-	-	-	-	150,000
	P (a)	-	-	-	75,000	-	-	-	-	-	-	-	150,000	-	150,000
	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejecución y Administracion	P	-	1,135,500	1,529,400	1,529,400	1,523,300	1,290,600	-	-	-	-	-	-	-	7,008,200
	P (a)	-	1,135,500	1,360,672	1,857,639.5	1,344,978	1,545,341	1,000,000	1,782,769.88	1,414,377.38	4,558,125.16	1,644,923.73	19,061.72	-	16,903,864
	A	-	1,207,219.26	1,445,782.65	810,650.45	543,195.94	3,518,486.67	1,440,085.23	1,013,623.8	839,797.6	4,386,960.03	1,679,000.65	883,300.96	-	17,768,103.24
Auditorías Financieras	P	-	-	50,000	50,000	50,000	100,000	-	-	-	-	-	-	-	250,000
	P (a)	-	-	4,910	15,000	50,000	50,000	50,000	50,000	51,000	65,003	45,000	-	-	359,915
	A	-	-	4,910	14,700	37,545	37,545	42,050	47,165	51,000	65,003	59,997	41,191	-	401,106

Total Costs

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Cost
Total Cost	P	-	3,276,500	9,779,800	118,339,900	219,617,200	98,986,600	-	-	-	-	-	-	-	450,000,000
	P (a)	-	3,276,500	8,276,996	72,052,144.04	41,153,152.8	51,788,476.62	149,224,447.42	68,132,676.82	127,939,019.8	31,101,611.08	15,892,193.5	88,539,017.05	29,761,571.4	450,000,000
	A	-	1,824,418.31	7,960,107.09	31,191,000.44	22,415,098.28	61,713,058.23	61,248,651.89	67,033,656.92	34,418,332.68	30,522,386.42	13,372,701.29	6,503,074.28	-	338,202,485.83

2025	2026	2027	EOP 2026
-	-	-	1,200,000
0	0	-	568,098
0	0	-	568,098

CORPORATE INDICATORS

IF INDICATORS

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Categories	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2.19 People with enhanced access to sustainable transportation infrastructure or services	# of beneficiaries		2015	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					P (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					A	-	-	-	-	-	-	-	-	61,191	-	-	-

Details

Means of Verification: Evaluación Ex-Post por parte del MOPT

Observations: Dato del TPDA tomado del Memoria de Cálculo de los Disenos de Obra Finales, datos de habitantes tomado de Cuadro 8.3 Proyecciones Población 2021-2022 por Distrito (INEC,2022), y utilización de información geográfica de los proyectos de la carpeta Atlas GIS del Sharepoint TSP Costa Rica.

Change Matrix

No information available for the section

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Status of the Implementation

Al cierre de junio de 2026, el PIT registra un avance temporal del 98% y desembolsos acumulados del 80%. La diferencia responde
principalmente al grado de ejecución de la obra de Ruta Nacional 35, vinculada al programa PIV-MU (CR-L1151), que se encuentra iniciando su etapa de construcción en la Punta Sur - línea 1. Respecto de los fondos no asignados a
RN-35, la Unidad Ejecutora continúa gestionando finiquitos, justificaciones y actividades de cierre, con finalización prevista para noviembre de 2026.
El programa requerirá de una prórroga de su vencimiento, actualmente previsto para el 13-nov-2026, para poder ejecutar los $78 millones asignados a la RN-35 y sus obras conexas. El MOPT y Hacienda estiman un plazo de hasta 3
años.

Likelihood of Achieving Development Objectives

High	En términos generales la probabilidad es media dado que se proyecta que para la fecha de último desembolso (Nov-2026) los productos se encuentren finalizados, salvo el caso del producto 1.1 Tramo Barranca-Limonal ampliado. Se han presentado de manera preliminar los resultados de la Evaluación Final del Programa, quedando por fuera el tramo Barranca-Limonal ampliado. Debe de considerarse que el programa requerirá de una prórroga sustancial, que podría permitir la medición de los indicadores pendientes.

Lesson Learned

Category	Lesson Learned	Entered in System
Intra/Inter Coordination, Project Management Capacity, Stakeholder Priorities	Hallazgos Se observó que la necesidad de coordinar acciones entre la UEP, MOPT, CONAVI, el BID y otras instituciones para abordar compromisos pendientes exponía debilidades en el mantenimiento de canales de comunicación y en el seguimiento de acuerdos compartidos. Esta situación requería un seguimiento continuo de las decisiones y actividades conjuntas para evitar retrasos en el programa. La evidencia indicó que, aunque la coordinación permitió finalmente una ejecución más fluida y una resolución más rápida de obstáculos, la ausencia de responsabilidades claramente asignadas, plazos definidos y mecanismos estructurados de seguimiento aumentó inicialmente el riesgo de retrasos y desalineaciones en los horarios entre las partes interesadas. Recomendaciones Asegurarse de que, cuando la coordinación multiinstitucional se identifique como un factor clave de ejecución, se establezcan arreglos formales de gobernanza que especifiquen partes responsables, plazos y herramientas estandarizadas de seguimiento para todos los compromisos interinstitucionales. Implementar acciones como la creación de un comité conjunto de coordinación con reuniones regulares, planes de acción compartidos y un único repositorio para acuerdos y seguimiento del progreso. Se recomienda integrar estos mecanismos de coordinación y seguimiento en el manual operativo y las rutinas de gestión del programa, incluyendo indicadores de rendimiento para la colaboración interinstitucional.	10/2/2026

EOP 2026
-
-
-

Intra/Inter Coordination, Project Management Capacity, Project Monitoring & Evaluation	Hallazgos La ejecución simultánea de los procesos de cierre contractual, la recepción definitiva de las obras y la preparación de los acuerdos finales expusieron que las actividades de cierre no habían sido suficientemente anticipadas ni estructuradas como un componente central de la ejecución del proyecto. Esta situación requirió una asignación ad hoc de recursos administrativos, técnicos y financieros para validar entregables, conciliar cuentas y compilar documentación de apoyo, revelando lagunas en la planificación y coordinación para la fase de fin de contrato. Como resultado, el equipo reconoció que la ausencia de una estrategia proactiva de cierre ponía en riesgo la rendición de cuentas, aumentar la exposición administrativa y debilitar la trazabilidad de la información necesaria para auditorías y para diseñar futuras intervenciones. Recomendaciones Implementar acciones como incorporar el cierre contractual como un flujo de trabajo definido dentro del plan de ejecución desde el principio, con hitos claros, responsabilidades y asignación de recursos para tareas administrativas, técnicas y financieras. Los equipos de proyecto deben establecer procedimientos estandarizados y listas de verificación para validar entregables, conciliar la información financiera y organizar la documentación para garantizar la trazabilidad completa y y la preparación para auditorías. Sería útil integrar estos requisitos de cierre en contratos y manuales operativos.	10/2/2026
Project Management Capacity, Project Design, Project Monitoring & Evaluation	Hallazgos Se observó que el seguimiento sistemático de los indicadores del programa creaba una visibilidad oportuna de desviaciones, riesgos emergentes y necesidades de ajuste durante la ejecución de las inversiones. La información generada por estos sistemas de monitoreo apoyó la toma de decisiones y permitió aplicar medidas correctivas mientras las obras y procesos estaban en curso, evitando retrasos o sobrecostes. Este uso proactivo de los datos fortaleció la gestión basada en resultados y aumentó la probabilidad de cumplir los objetivos de movilidad y facilitación del comercio, mitigando implícitamente varios riesgos operativos como retrasos en la adquisición, débil capacidad de gestión pública y limitaciones macroeconómicas que requieren una supervisión estrecha. Recomendaciones Asegurarse de que los sistemas de monitoreo y seguimiento de resultados estén diseñados, mantenidos y actualizados regularmente con datos fiables y validados para que puedan funcionar como herramienta de alerta temprana y apoyo a la toma de decisiones. Definir líneas de referencia y objetivos claros de los indicadores, establecer ciclos periódicos de revisión con la alta dirección y vincular tendencias de indicadores con acciones correctivas predefinidas para adquisiciones, estudios técnicos, gestión socioambiental y ejecución financiera.	10/2/2026
Project Management Capacity, Acquisitions and Procurement - Bidding Stage, Project Monitoring & Evaluation	Hallazgos Se observó que la administración de múltiples procesos de contratación durante la ejecución reveló que la programación temprana y la gestión preventiva de riesgos eran decisivas para mantener el ritmo de contratación. Al anticipar las necesidades de contratación, el equipo redujo los retrasos vinculados a revisiones, aprobaciones y procedimientos administrativos. Los planes de adquisición, actualizados periódicamente se convirtieron en una herramienta central de gestión, permitiendo procesos contractuales más eficientes y limitando los efectos negativos en los plazos del proyecto. Recomendaciones Garantizar que los futuros programas institucionalicen la planificación proactiva de adquisiciones como una práctica central de gestión, incluyendo la identificación temprana sistemática de las necesidades de contratación y la gestión preventiva de los riesgos asociados a revisiones y aprobaciones. Implementar acciones como establecer un calendario formal para actualizaciones periódicas de los planes de adquisición, integrarlos con calendarios técnicos, financieros y administrativos, y asignar responsabilidades claras dentro de la unidad ejecutora para el seguimiento de hitos de adquisiciones y señales de riesgo. En circunstancias similares, se recomienda vincular la planificación de adquisiciones con los registros de riesgos sobre retrasos en la adquisición, para activar medidas de mitigación que protejan los plazos de ejecución y el logro de los objetivos del sector.	10/2/2026

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
1	Inactive	El proceso de ratificación legislativa de la operación puede sufrir atrasos que impidan el inicio del Programa.	4 - High	3 - Medium High	High	Political stability

Details

Associated Outputs		**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	
Associated Outcomes		**Responsible**	-	**Probability Factors**	-
Description of Impact	-				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	Monitoreo del trámite legislativo y lobby con diputados	MITIGATE	COMPLETE	

Details					
Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	Bank
Completion Date	9/24/2021	**Funding Source**	-	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status	
2	Apoyar al poder ejecutivo para la difusión de los beneficios del programa ante diputados y la sociedad civil	MITIGATE	COMPLETE	

Details					
Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	Bank
Completion Date	9/24/2021	**Funding Source**	-	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status	
3	Verificar la inclusión explícita en la estrategia país (EBP) para los años 2014-2018, de las líneas estratégicas que fundamenten la operación y sus resultados esperados	MITIGATE	COMPLETE	

Details					
Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	Bank
Completion Date	9/24/2021	**Funding Source**	-	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status	
4	Verificar que todas las obras incluidas en el plan de inversiones estén alineadas con esta EBP y con el Plan Nacional de Transportes (PNT) que ha sido oficializado por el MOPT	MITIGATE	COMPLETE	

Details					
Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	Bank
Completion Date	9/24/2021	**Funding Source**	-	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
2	Inactive	Ausencia o inadecuado alcance de los estudios técnicos de preinversión para el diseño de las obras, genera atrasos para el inicio de los procesos de licitación y afecta la ejecucion física anual planeada del programa en mas del 20%	2 - Medium Low	4 - High	Medium High	Rule of law

Details

Associated Outputs	- Otros tramos viales: Ruta Nacional 35 (En la Operación CR-L1151 se presentan los indicadores de resultados para la RN35)	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Scope - Time
Associated Outcomes		**Responsible**	-	**Probability Factors**	-
Description of Impact	-				

Response Actions

	Response Description		Management Strategy		Status	
1	Supervisar la contratación de personal de la unidad ejecutora para garantizar su idoneidad en la preparación de TdR		MITIGATE		COMPLETE	
	Details					
	Estimated Completion Date	Hasta lograr el compromiso del 100% del programa	**Budget**	0	**Responsible**	MOPT
	Completion Date	10/5/2023	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

	Response Description		Management Strategy		Status	
2	Contratación de estudios básicos y diseños con cargo al programa		MITIGATE		COMPLETE	
	Details					
	Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	Executing Agency
	Completion Date	9/24/2021	**Funding Source**	-	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
3	Active	Si no se aseguran mecanismos de mantenimiento y sostenibilidad de la inversión una vez cerrada la operación, entonces la sostenibilidad de los resultados del Programa podría verse comprometida, lo que podría generar un incumplimiento de las cláusulas contractuales asociadas a mantenimiento y afectar la permanencia de los beneficios logrados.	1 - Low	3 - Medium High	Low	Operation and maintenance capacity

Details

Associated Outputs	- Ampliación y Rehabilitación Cañas-Limonal. Ruta 1. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles. - Diseño de Intercambiadores La Lima y Taras. Ruta 2. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles. - Otros tramos viales: Ruta Nacional 35 (En la Operación CR-L1151 se presentan los indicadores de resultados para la RN35) - Rehabilitación Playa Naranjo Paquera. Ruta 160. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles. - Rompeolas de Caldera ampliado - Rompeolas de Caldera rehabilitado - Terminales de transbordadores rehabilitadas - Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado (incluye vía, puentes e intercambiadores). Ruta 1. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles	**Source of Risk**	Institutional capacity	**Type of Impact**	- Quality
Associated Outcomes	- Disminuir los costos de operación vehicular - Reducir tiempos de viaje de personas y bienes	**Responsible**	Ministerio de Obras Públicas y Transporte	**Probability Factors**	En el POD se estipula que el OE asegurará la sostenibilidad de las inversiones, en el caso de proyectos carreteros al fondo vial, y proyectos portuarios con cargo a su presupuesto ordinario. Mientas en el caso de Puerto Caldera, el INCOP es el responsable de su mantenimiento con cargo a presupuesto ordinario. En 2025, el OE comunicó al Banco que los tramos viales Playa Naranjo-Paquera y Limonal-Cañas, fueron trasladados al OE para su programa de mantenimiento.
Description of Impact	La falta de mantenimiento de las obras ya entregadas puede afectar la sostenibilidad en el tiempo de los resultados obtenidos.				

Response Actions

3

1	**Response Description**		**Management Strategy**		**Status**	
	Incorporar en presupuesto nacional recursos para mantenimiento de infraestructura del Programa.		MITIGATE		COMPLETE	
	Details					
	Estimated Completion Date	Q2 2026	**Budget**	0	**Responsible**	MOPT
	Completion Date	10/2/2026	**Funding Source**	LOCALCOU	**Status Description**	-

2	**Response Description**		**Management Strategy**		**Status**	
	El Organismo Ejecutor planea realizar contrataciones para brindar el mantenimiento preventivo previo al traslado al CONAVI para mantenimiento.		TRANSFER		COMPLETE	
	Details					
	Estimated Completion Date	Formalizar el finiquito de las obras asociadas al programa PIT	**Budget**	0	**Responsible**	Executing Agency
	Completion Date	3/21/2025	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

3	**Response Description**		**Management Strategy**		**Status**	
	Desarrollar esquemas de APP y estrategias de gestión para asegurar sostenibilidad post-cierre.		MITIGATE		ACTIVE	
	Details					
	Estimated Completion Date	Q2	**Budget**	0	**Responsible**	MOPT
	Completion Date	11/1/2026	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

4	**Response Description**		**Management Strategy**		**Status**	
	Organismo ejecutor incluye en el presupuesto nacional planes de mantenimiento de las obras del programa		MITIGATE		COMPLETE	
	Details					
	Estimated Completion Date	Aprobación de presupuesto nacional (mes de septiembre)	**Budget**	0	**Responsible**	Executing Agency
	Completion Date	2/21/2025	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
	Active	Si la gestión socioambiental de las intervenciones pendientes no se implementa de manera oportuna y adecuada, entonces podrían surgir reclamaciones, oposición comunitaria o nuevas obligaciones correctivas, lo que podría retrasar el cierre técnico y financiero del Programa.	1 - Low	2 - Medium Low	Low	Technical and operational complexity

Details

Associated Outputs	- Diseño de Intercambiadores La Lima y Taras. Ruta 2. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles. - Otros tramos viales: Ruta Nacional 35 (En la Operación CR-L1151 se presentan los indicadores de resultados para la RN35) - Terminales de transbordadores rehabilitadas - Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado (incluye vía, puentes e intercambiadores). Ruta 1. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles	**Source of Risk**	Project	**Type of Impact**	- Cost
Associated Outcomes	- Disminuir los costos de operación vehicular - Reducir tiempos de viaje de personas y bienes	**Responsible**	MOPT	**Probability Factors**	Aunque se han identificado focos de problemas socioambientales, éstos nunca han generado niveles de oposición de la comunidad que afecten sustancialmente la ejecución financiera.
Description of Impact	La oposición de la comunidad a los proyectos del programa podría generar atrasos en su ejecución que limiten la posibilidad de alcanzar la ejecución financiera programada.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status
1	Implementar medidas socioambientales correctivas y obras complementarias para cierre de pasivos.	MITIGATE	ACTIVE

Details

Estimated Completion Date	Q2 2026	**Budget**	0	**Responsible**	MOPT
Completion Date	11/13/2026	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status
2	Proveer apoyo al Organismo Ejecutor a través de asistencia para la gestión socioambiental de los proyectos para evitar escalamiento de reclamaciones	MITIGATE	COMPLETE

Details

Estimated Completion Date	Hasta finalizar el programa y el finiquito de las obras	**Budget**	0	**Responsible**	Bank
Completion Date	10/2/2024	**Funding Source**	TECHNICA	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status
3	Dar seguimiento y apoyo específico a la Unidad Ejecutora en la gestión de interesados, así como en temas socioambientales de los compromisos pactados de Misión ESG	MITIGATE	ACTIVE

Details

Estimated Completion Date	Hasta la fecha de último desembolso	**Budget**	0	**Responsible**	MOPT
Completion Date	11/13/2026	**Funding Source**	ESGTRANS	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status
4	Mantener adecuados planes de comunicación con las comunidades e implementar medidas de mitigación para las afectaciones,	MITIGATE	COMPLETE

Details

Estimated Completion Date	Hasta finalización y entrega de las obras del programa	**Budget**	0	**Responsible**	Executing Agency
Completion Date	3/24/2023	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
5	Materialized	Si la gestión socioambiental no identifica y atiende oportunamente impactos residuales, pasivos o compromisos pendientes, entonces podrían mantenerse afectaciones a beneficiarios o terceros, lo que podría afectar el logro de los objetivos del Programa y generar contingencias durante el cierre.	2 - Medium Low	2 - Medium Low	Medium Low	Technical and operational complexity

Details

Associated Outputs	- Otros tramos viales: Ruta Nacional 35 (En la Operación CR-L1151 se presentan los indicadores de resultados para la RN35) - Terminales de transbordadores rehabilitadas - Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado (incluye vía, puentes e intercambiadores). Ruta 1. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles	**Source of Risk**	Project	**Type of Impact**	- Scope
Associated Outcomes	- Disminuir los costos de operación vehicular - Incrementar la seguridad vial y portuaria - Reducir tiempos de viaje de personas y bienes	**Responsible**	MOPT	**Probability Factors**	Aunque se han identificado focos de problemas socioambientales, éstos nunca han generado niveles de oposición de la comunidad que pongan en riesgo el logro de los objetivos del programa.
Description of Impact	La oposición de la comunidad a los proyectos del programa podría generar atrasos en su ejecución que limiten la posibilidad de alcanzar los objetivos del programa.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	Mantener una supervisión constante del cumplimiento de las políticas y salvaguardas, con el apoyo de un equipo de consultores especializados en temas ambientales y sociales.	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	Hasta finalización y entrega de las obras del programa	**Budget**	0	**Responsible**	Bank
Completion Date	10/2/2024	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
6	Inactive	Si se producen cambios frecuentes en personal clave o debilidades en la capacidad de gestión pública de las instancias responsables, entonces podrían retrasarse las decisiones técnicas, administrativas y fiduciarias requeridas al cierre de la operación, lo que podría extender los plazos de ejecución y afectar el logro de resultados.	1 - Low	2 - Medium Low	Low	Rule of law

Details

Associated Outputs	- Diseño de Intercambiadores La Lima y Taras. Ruta 2. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles. - Otros tramos viales: Ruta Nacional 35 (En la Operación CR-L1151 se presentan los indicadores de resultados para la RN35) - Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado (incluye vía, puentes e intercambiadores). Ruta 1. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Time
Associated Outcomes	- Disminuir los costos de operación vehicular - Incrementar la seguridad vial y portuaria - Reducir tiempos de viaje de personas y bienes	**Responsible**	Ministerio de Obras Públicas y Transporte	**Probability Factors**	Aunque el programa cuenta con una firma gestora que realiza la mayoría de funciones de la unidad ejecutora, el cambio de gobierno de mayo 2022 podría generar cambios en las instancias de aprobación y control (Unidad Asesora y el Comité de aprobaciones y supervisión).
Description of Impact	La rotación de personal asociado a las decisiones y control del programa por parte del ente ejecutor, podría generar atrasos en la implementación.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status
1	Supervisar la contratación de personal de la unidad ejecutora para garantizar su idoneidad	MITIGATE	INACTIVE

Details

Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	MOPT
Completion Date	12/23/2021	**Funding Source**	-	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status
2	Incluir funciones claras e identificar apropiadamente los perfiles de los miembros de la UE en el manual operativo del mecanismo de ejecución.	MITIGATE	COMPLETE

Details

Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	Executing Agency
Completion Date	9/23/2024	**Funding Source**	-	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status
3	Dar seguimiento a la ejecución del programa	MITIGATE	COMPLETE

Details

Estimated Completion Date	Hasta finalización y entrega de las obras del programa	**Budget**	0	**Responsible**	Bank
Completion Date	10/2/2024	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
7	Inactive	Si se presentan protestas y apelaciones, los atrasos para lograr la adjudicación de las obras reducirán el cumplimiento de las metas físicas anuales planeadas en más de un 20%	1 - Low	4 - High	Medium Low	Rule of law

Details

Associated Outputs	- Otros tramos viales: Ruta Nacional 35 (En la Operación CR-L1151 se presentan los indicadores de resultados para la RN35)	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Time
Associated Outcomes	- Incrementar la seguridad vial y portuaria	**Responsible**	Unidad Ejecutora.	**Probability Factors**	Se considera una probabilidad baja de este riesgo en 2022, debido a que los procesos planificados para el año no repercuten en las metas físicas de cumplimiento del año.
Description of Impact	Las protestas y apelaciones pueden atrasar significativamente el inicio de las obras, repercutiendo sobre la fecha estimada de su finalización.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	Supervisar la contratación de personal de la unidad ejecutora para garantizar su idoneidad	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	MOPT
Completion Date	9/24/2021	**Funding Source**	-	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status	
2	Incluir indicadores de gestión en el MANOP que permitan monitorear la eficiencia de la coordinación entre la UE y el CAS	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	Executing Agency
Completion Date	12/24/2021	**Funding Source**	-	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status	
3	Incluir funciones claras e identificar apropiadamente los perfiles de los miembros de la UE en el manual operativo del mecanismo de ejecución	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	Executing Agency
Completion Date	9/24/2021	**Funding Source**	-	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
8	Inactive	Si se presentan casos de actos fraudulentos, prácticas prohibidas o investigaciones que afecten contratos vinculados al Programa, entonces podrían suspenderse procesos o revisarse decisiones contractuales, lo que podría atrasar la entrega final de obras y afectar el cierre operativo y fiduciario.	1 - Low	4 - High	Medium Low	Macroeconomic environment

Details

Associated Outputs	- Ampliación y Rehabilitación Cañas-Limonal. Ruta 1. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles. - Diseño de Intercambiadores La Lima y Taras. Ruta 2. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles. - Otros tramos viales: Ruta Nacional 35 (En la Operación CR-L1151 se presentan los indicadores de resultados para la RN35) - Terminales de transbordadores rehabilitadas - Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado (incluye vía, puentes e intercambiadores). Ruta 1. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Time - Scope - Cost
Associated Outcomes	- Disminuir los costos de operación vehicular - Incrementar la seguridad vial y portuaria - Reducir tiempos de viaje de personas y bienes	**Responsible**	MOPT	**Probability Factors**	La existencia de investigaciones actuales a nivel nacional de posibles casos de actos fraudulentos o corruptos por parte de empresas contratistas del programa elevan la probabilidad de problemas en caso que se acusen formalmente y se demuestren los hechos denunciados.
Description of Impact	Secuelas de actos corruptos encontrados en años anteriores, pueden ralentizar las obras y relicitaciones.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	Dar seguimiento a la ejecución del programa con el apoyo de OII.	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	Hasta finalización y entrega de las obras del programa	**Budget**	0	**Responsible**	Bank
Completion Date	10/2/2024	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status	
2	Realizar talleres de capacitación y concientización dirigidos a miembros del organismo ejecutor con apoyo de OII	MITIGATE	INACTIVE	

Details

Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	Bank
Completion Date	9/24/2021	**Funding Source**	-	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
9	Inactive	Modificación del plan de inversiones del programa posterior a la aprobación legislativa reduce el impacto de la operación y afecta el logro de los objetivos	1 - Low	2 - Medium Low	Low	Political stability

Details

Associated Outputs	- Terminales de transbordadores rehabilitadas	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Time
Associated Outcomes	- Incrementar la seguridad vial y portuaria	**Responsible**	MOPT	**Probability Factors**	Existe un riesgo bajo de cambio en el plan de inversión dado que se han comprometido más del 90% de los fondos del programa.
Description of Impact	Los cambios del plan de inversión podrían afectar el cumplimiento de resultados del programa.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	Mantener comunicación periodica con actores gubernamentales para anticipar cambios y advertir implicaciones negativas de estos cambios	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	hasta el compromiso del 100% de los recursos	**Budget**	0	**Responsible**	Bank
Completion Date	10/2/2024	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
10	Inactive	Atrasos en la ejecución de las inversiones en el sector portuario de CR atrasa el logro de objetivos específicos del sector en mas de 12 meses	1 - Low	2 - Medium Low	Low	Macroeconomic environment

Details

Associated Outputs	- Terminales de transbordadores rehabilitadas	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Scope - Time
Associated Outcomes		**Responsible**	MOPT	**Probability Factors**	Se considera una probablidad baja dado que la última obra portuaria tiene fecha de finalizacion mayo 2023 y no se anticipan atrasos.
Description of Impact	Se reduce el impocto a medio-bajo, dado que los objetivos del sector portuario se han alcanzado parcialmente con la finalización de las obras de puerto caldera.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	Mantener monitoreo del avance de las obras previstas a realizar por el GCR bajo los esquemas público y privado.	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	Finalización de obras de la terminal de transbordadores	**Budget**	0	**Responsible**	Bank
Completion Date	3/24/2023	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
11	Inactive	Atraso en la entrega de las obras en el rompeolas genera reclamos del administrador del Puerto de Caldera ante el GCR	4 - High	3 - Medium High	High	Macroeconomic environment

Details

Associated Outputs		**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	
Associated Outcomes		**Responsible**	-	**Probability Factors**	-
Description of Impact	-				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	Incorporación de cláusula contractual que condiciona al OE a acordar con el administrador del Puerto de Caldera una fecha de terminación de obras compatible con el PEP del programa	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	Executing Agency
Completion Date	9/24/2021	**Funding Source**	-	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
12	Inactive	Inestabilidad macroeconómica derivada de la situación fiscal deficitaria y el aumento de la deuda del gobierno genera restricciones presupuestales que reducen los montos a desembolsar en al menos 20%	1 - Low	3 - Medium High	Low	Macroeconomic environment

Details

Associated Outputs	- Ampliación y Rehabilitación Cañas-Limonal. Ruta 1. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles. - Otros tramos viales: Ruta Nacional 35 (En la Operación CR-L1151 se presentan los indicadores de resultados para la RN35) - Terminales de transbordadores rehabilitadas - Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado (incluye vía, puentes e intercambiadores). Ruta 1. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Time - Cost
Associated Outcomes	- Disminuir los costos de operación vehicular - Incrementar la seguridad vial y portuaria - Reducir tiempos de viaje de personas y bienes	**Responsible**	MOPT y Ministerio de Hacienda	**Probability Factors**	Aunque se encuentre actualmente en implementación algunas restricciones asociadas con la regla fiscal, se considera una probabilidad baja, dado que ya se realizaron los desembolsos programados para el 2022. El riesgo se mantiene activo para monitorear la situación en años siguientes.
Description of Impact	La aplicación de la regla fiscal y otras restricciones presupuestarias podrían afectar el ritmo de ejecución financiera programada y el atraso de las obras.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	Monitoreo de la situación macroeconómica del país.	MITIGATE	INACTIVE	

Details

Estimated Completion Date	Actividad recurrente a lo largo del año	**Budget**	0	**Responsible**	Banco y MOPT
Completion Date	12/31/2023	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
13	Inactive	Si se presentan protestas y apelaciones, los atrasos para lograr la adjudicación de las obras generarán una reducción de la ejecución financiera anual planeada del programa en más de un 20%	4 - High	2 - Medium Low	Medium High	Macroeconomic environment

Details

Associated Outputs	- Otros tramos viales: Ruta Nacional 35 (En la Operación CR-L1151 se presentan los indicadores de resultados para la RN35)	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Time - Cost
Associated Outcomes	- Disminuir los costos de operación vehicular - Incrementar la seguridad vial y portuaria	**Responsible**	Unidad Ejecutora	**Probability Factors**	claridad de los DDL, aplicación clara de la evaluación de ofertas y nivel de competitividad de los oferentes.
Description of Impact	Los atrasos que podrían sufrir las licitaciones pendientes de ejecutarse en 2022 no afectan en más del 20% la ejecución financiera del año.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	Incorporar a los documentos de licitacion lecciones aprendidas de procesos anteriores para reducir la posibilidad de apelaciones	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	Fin de licitaciones de obras	**Budget**	0	**Responsible**	-
Completion Date	9/24/2021	**Funding Source**	-	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status	
2	Evaluar todas las ofertas para reducir los ciclos de procesos recursivos a un unico ciclo de apelaciones	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	Fin de licitaciones de obras	**Budget**	0	**Responsible**	Unidad Ejecutora
Completion Date	10/5/2023	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
14	Inactive	Los atrasos en la liberacion del derecho de via genera incremento en el costo de las obras viales de al menos 20%	1 - Low	2 - Medium Low	Low	Legislation and regulation

Details

Associated Outputs	- Otros tramos viales: Ruta Nacional 35 (En la Operación CR-L1151 se presentan los indicadores de resultados para la RN35)	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Cost
Associated Outcomes	- Disminuir los costos de operación vehicular - Incrementar la seguridad vial y portuaria - Reducir tiempos de viaje de personas y bienes	**Responsible**	MOPT	**Probability Factors**	A pesar de contar con muchos problemas para lograr las expropiaciones, no se ha documentado casos en que dicho problema represente un aumento sustancial del costo de las obras, por lo que se indica una probabilidad baja.
Description of Impact	El aumento de costo en las obras puede generar la necesidad de recortar el alcance del programa. Sin embargo, este riesgo actualmente solo aplica para las obras de carretera San Carlos a ser cofinanciadas por esta operacion pues los demas proyectos ya se completaron o no requieren liberación de derecho de vía.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	Implementar un Plan de Acción Predial, para establecer una priorización de la liberación del derecho de vía, con cual se debe de contar con la totalidad de al menos la entrada en posesión voluntaria previo a la ejecución de las obras.	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	Adjudicación del producto de Punta Sur Disenado y Construído.	**Budget**	0	**Responsible**	Executing Agency
Completion Date	10/2/2024	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
15	Materialized	Si persisten atrasos en la liberación del derecho de vía y en los procesos de expropiación de los tramos pendientes, entonces la ejecución de las obras podría verse reprogramada, lo que podría reducir la ejecución financiera anual del Programa y afectar la secuencia de cierre de los contratos	2 - Medium Low	2 - Medium Low	Medium Low	Legislation and regulation

Details

Associated Outputs	- Diseño de Intercambiadores La Lima y Taras. Ruta 2. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles. - Otros tramos viales: Ruta Nacional 35 (En la Operación CR-L1151 se presentan los indicadores de resultados para la RN35) - Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado (incluye vía, puentes e intercambiadores). Ruta 1. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Cost - Time
Associated Outcomes	- Disminuir los costos de operación vehicular - Incrementar la seguridad vial y portuaria - Reducir tiempos de viaje de personas y bienes	**Responsible**	Unidad Ejecutora	**Probability Factors**	Capacidad de las instituciones para procesar los casos de expropiación. Limitaciones de incoporar cambios en el diseño de manera oportuna para reducir la necesidad de expropiaciones.
Description of Impact	Los atrasos en la disponibilidad de terrenos afectan el avance de las obras, generando una reducción de la ejecución financiera y ampliando los plazos de ejecución. Sin embargo, este riesgo actualmente solo aplica para las obras de carretera San Carlos a ser cofinanciadas por esta operacion pues los demas proyectos ya se completaron o no requieren liberación de derecho de vía.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	Implementar un Plan de Acción Predial, para establecer una priorización de la liberación del derecho de vía, con cual se debe de contar con la totalidad de al menos la entrada en posesión voluntaria previo a la ejecución de las obras.	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	Adjudicación del producto de Punta Sur Disenado y Construído.	**Budget**	0	**Responsible**	Executing Agency
Completion Date	10/2/2024	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status	
2	Incorporacion a la UEP de expertos en gestion de expropiaciones que agilicen los procesos y eliminen la dependencia de la oficina de terrenos del MOPT	MITIGATE	INACTIVE	

Details

Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	-
Completion Date	9/24/2021	**Funding Source**	-	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
16	Materialized	Si las empresas contratistas presentan limitaciones de liquidez o restricciones financieras para sostener el ritmo de ejecución, entonces podría ralentizar la ejecución de las obras, lo que podría afectar los cronogramas contractuales y reducir la ejecución financiera anual programada.	1 - Low	3 - Medium High	Low	Macroeconomic environment

Details

Associated Outputs	- Ampliación y Rehabilitación Cañas-Limonal. Ruta 1. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles. - Otros tramos viales: Ruta Nacional 35 (En la Operación CR-L1151 se presentan los indicadores de resultados para la RN35) - Terminales de transbordadores rehabilitadas - Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado (incluye vía, puentes e intercambiadores). Ruta 1. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Cost - Time
Associated Outcomes	- Disminuir los costos de operación vehicular - Incrementar la seguridad vial y portuaria - Reducir tiempos de viaje de personas y bienes	**Responsible**	Contatista y Unidad Ejecutora	**Probability Factors**	Problemas organizativos de los contratistas, supervisión poco efectiva por parte del Contratante. La implementación de anticipos de obra (de hasta 20%) pretenden reducir la probabilidad de ocurrencia.
Description of Impact	Los bajos rendimientos de ejecución de las obras repercuten en una disminución de la facturación, afectando la proyección de gastos y extendiendo el plazo de ejecución de las obras.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	Supervisar la contratación de personal de la unidad ejecutora para garantizar su idoneidad	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	MOPT
Completion Date	9/24/2021	**Funding Source**	-	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status	
2	Incluir indicadores de gestión en el MANOP que permitan monitorear la eficiencia de la coordinación entre la UE y el CAS	MITIGATE	INACTIVE	

Details

Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	Executing Agency
Completion Date	12/23/2021	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status	
3	Establecer mecanismos apropiados de control de calidad de los pliegos de licitación, incluyendo sanciones e incentivos para mejorar la ejecución de obras.	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	Hasta finalización y entrega de las obras del programa	**Budget**	0	**Responsible**	Executing Agency
Completion Date	10/2/2024	**Funding Source**	-	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
17	Materialized	Si las empresas contratistas de obra mantienen limitaciones en su capacidad organizativa, de gestión de obra o de productividad, entonces podrían presentarse atrasos en la ejecución de los contratos, lo que podría disminuir la ejecución financiera anual del Programa y extender los plazos de cierre de las obras.	2 - Medium Low	2 - Medium Low	Medium Low	Macroeconomic environment

Details

Associated Outputs	- Ampliación y Rehabilitación Cañas-Limonal. Ruta 1. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles. - Otros tramos viales: Ruta Nacional 35 (En la Operación CR-L1151 se presentan los indicadores de resultados para la RN35) - Rehabilitación Playa Naranjo Paquera. Ruta 160. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles.	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Time - Cost
Associated Outcomes	- Disminuir los costos de operación vehicular - Incrementar la seguridad vial y portuaria - Reducir tiempos de viaje de personas y bienes	**Responsible**	Contatista y Unidad Ejecutora	**Probability Factors**	Problemas organizativos de los contratistas, supervisión poco efectiva por parte del Contratante.
Description of Impact	Los bajos rendimientos de ejecución de las obras repercuten en una disminución de la facturación, afectando la proyección de gastos y extendiendo el plazo de ejecución de las obras y las relicitaciones de procesos. Se reduce el impacto dado que actualmente solo se encuentran en ejecucion obras menores complementarias, cuyo atraso no se espera que tenga grandes impactos.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status
1	Incluir indicadores de gestión en el MANOP que permitan monitorear la eficiencia de la coordinación entre la UE y el CAS	MITIGATE	INACTIVE

Details

Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	Executing Agency
Completion Date	12/23/2021	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status
2	Supervisar la contratación de personal de la unidad ejecutora para garantizar su idoneidad	MITIGATE	INACTIVE

Details

Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	MOPT
Completion Date	9/24/2021	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status
3	Establecer un plan remedial para el proyecto Barranca - Limonal (ruta critica) a partir del cual se establecen nuevos hitos de construcción y de productividad de maquinaria y frentes de trabajo.	MITIGATE	INACTIVE

Details

Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	Unidad Ejecutora
Completion Date	3/24/2023	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status
4	Establecer mecanismos apropiados de control de calidad de los pliegos de licitación, incluyendo sanciones e incentivos para mejorar la ejecución de obras.	MITIGATE	COMPLETE

Details

Estimated Completion Date	Licitación de todos los productos del programa	**Budget**	0	**Responsible**	Executing Agency
Completion Date	3/21/2025	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
18	Inactive	Si se reciben ofertas económicas que superen en más del 20% el valor de referencia, podría ocurrir un recorte en el alcance de los productos, afectando al cumplimiento de los objetivos de desarrollo	3 - Medium High	3 - Medium High	High	Macroeconomic environment

Details

Associated Outputs	- Otros tramos viales: Ruta Nacional 35 (En la Operación CR-L1151 se presentan los indicadores de resultados para la RN35)	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Scope - Cost
Associated Outcomes	- Disminuir los costos de operación vehicular - Reducir tiempos de viaje de personas y bienes	**Responsible**	Executing Agency	**Probability Factors**	Riesgo se ha materializado en los procesos de adquisición de otros proyectos de infraestructura donde el valor ofertado se encuentra por encima del valor de referencia.
Description of Impact	Limitaciones de presupuesto y requerimiento de contrapartida para asegurar la adjudicación.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	Mantener comunicación con actores gubernamentales para anticipar cambios, advertir implicaciones negativas de estos cambios y buscar financiamiento complementario con fondos propios para asegurar la adjudicación.	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	Apertura de oferta económica de Punta Sur Diseñada y Construída	**Budget**	0	**Responsible**	Executing Agency
Completion Date	3/21/2025	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
19	Inactive	Si el Gobierno de Costa Rica no cumple oportunamente con las condiciones previas requeridas para el uso de los recursos de cofinanciamiento, entonces se retrasará la aprobación de inicio de obras vinculadas a la RN-35, lo que podría afectar el cronograma de ejecución y el cumplimiento de metas físicas y financieras del Programa.	3 - Medium High	3 - Medium High	High	Political stability

Details

Associated Outputs	- Otros tramos viales: Ruta Nacional 35 (En la Operación CR-L1151 se presentan los indicadores de resultados para la RN35)	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Scope - Time
Associated Outcomes	- Disminuir los costos de operación vehicular - Reducir tiempos de viaje de personas y bienes	**Responsible**	Executing Organization	**Probability Factors**	Materialización del riesgo depende de otras instancias gubernamentales encargadas de la aprobación del presupuesto. El Organismo Ejecutor deberá defender mediante un proceso demócratico el presupuesto que espera disponer ante la Asamblea Legislativa.
Description of Impact	Disponibilidad de presupuesto es necesaria para desarrollar el proceso de licitación y adjudicar la obra de manera oportuna				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	Dar seguimiento del trámite legislativo proyecto (Ley No. 24420)	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	Aprobación de la ley en asamblea legislativa	**Budget**	0	**Responsible**	Executing Agency
Completion Date	3/21/2025	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
20	Active	Si se presentan atrasos en la ejecución de la RN-35 y no se logran alinear la ejecución financiera con el plazo del Programa , entonces podría requerirse una extensión de plazo superior a 6 meses, o en su defecto, producirse la cancelación de recursos no ejecutados, lo que podría afectar la eficiencia financiera y el logro de resultados del Programa.	4 - High	4 - High	High	Scope and planning

Details

Associated Outputs	- Otros tramos viales: Ruta Nacional 35 (En la Operación CR-L1151 se presentan los indicadores de resultados para la RN35)	**Source of Risk**	Project	**Type of Impact**	- Time
Associated Outcomes	- Disminuir los costos de operación vehicular - Reducir tiempos de viaje de personas y bienes	**Responsible**	MOPT	**Probability Factors**	Con base en el avance actual del proceso de licitación se considera probable que haya atrasos superiores a los 6 meses.

Description of Impact	Considerando que la operacion ya cuentan con extensiones de plazo superiores a los 48 meses, cualquier extension adicional se considera de alto impacto.					

Response Actions

1	**Response Description**		**Management Strategy**		**Status**	
	Acelerar el cumplimiento de las condiciones previas (No Objeción de diseño, y el Plan de Acción Ambiental y Social) para el inicio de obras.		MITIGATE		COMPLETE	
	Details					
	Estimated Completion Date	Q2 2026	**Budget**	0	**Responsible**	OE
	Completion Date	10/2/2026	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-
2	**Response Description**		**Management Strategy**		**Status**	
	Evaluar extensión del plazo del Programa en función del avance de las intervenciones en RN-35, y que contempla un análisis del uso de los recursos remanentes.		MITIGATE		COMPLETE	
	Details					
	Estimated Completion Date	Q2 2026	**Budget**	0	**Responsible**	Banco / OE / Prestario
	Completion Date	10/2/2026	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-
3	**Response Description**		**Management Strategy**		**Status**	
	Seguimiento al plan para la ejecución prioritaria de los fondos 3071/OC-CR y 3072/CH-CR, como parte de la ejecución de la operación CR-L1151.		MITIGATE		ACTIVE	
	Details					
	Estimated Completion Date	Hasta la fecha de último desembolso	**Budget**	0	**Responsible**	MOPT
	Completion Date	11/26/2026	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-
4	**Response Description**		**Management Strategy**		**Status**	
	Dar seguimiento de los recursos remanentes en particular se requiere un detalle de los compromisos que actualmente se llevan con el Programa, para apoyar la toma de decisiones y con esto planificar para el cierre del Programa.		MITIGATE		ACTIVE	
	Details					
	Estimated Completion Date	Q2 2026	**Budget**	0	**Responsible**	Banco
	Completion Date	11/26/2026	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-
5	**Response Description**		**Management Strategy**		**Status**	
	Analizar opciones de para cubrir gastos de la carretera San Carlos con cargo a la CR-L1032 de manera prioritaria.		MITIGATE		COMPLETE	
	Details					
	Estimated Completion Date	Diciembre 2025	**Budget**	0	**Responsible**	OE
	Completion Date	9/24/2025	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
21	Active	Si el OE no inicia oportunamente las obras en el Tramo Barranca-Limonal y La Angostura con recursos de contrapartida, entonces el producto no estará concluido al momento del cierre del Programa, lo que podría impedir demostrar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo planteados.	2 - Medium Low	3 - Medium High	Medium High	Political stability

Details

Associated Outputs	- Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado (incluye vía, puentes e intercambiadores). Ruta 1. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Scope
Associated Outcomes	- Disminuir los costos de operación vehicular - Reducir tiempos de viaje de personas y bienes	**Responsible**	MOPT	**Probability Factors**	Se considera una probabilidad medio baja, considerando que el proceso de licitación ya ha iniciado.
Description of Impact	El tramo Barranca - Limonal contribuye sustancialmente a los objetivos de la operación, por lo que su conclusión de manera oportuna tiene un impacto alto para el exito de la operación.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	Seguimiento de la documentación requerida para el proyecto Barranca - Limonal como parte del modificatorio no. 1 al contrato de préstamo, que debe presentarte previo a la fase constructiva de las intervenciones en RN-35, al corresponder a hitos que evidencian el buen avance en la ejecución del proyecto.	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	Q3 2026	**Budget**	0	**Responsible**	MOPT
Completion Date	4/1/2026	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status	
2	Seguimiento al proceso de licitación para la conclusión de las obras de Barranca - Limonal y La Angostura.	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	Adjudicación del proceso	**Budget**	0	**Responsible**	MOPT
Completion Date	10/2/2026	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
22	Active	Si no se define e implementa una estrategia para la medición de los resultados del tramo Barranca-Limonal y La Angostura entonces no se contará con evidencia suficiente para evaluar su contribución a los indicadores del Programa, lo que podría afectar la demostración del logro de los objetivos de desarrollo	2 - Medium Low	3 - Medium High	Medium High	Technical Design

Details

Associated Outputs	- Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado (incluye vía, puentes e intercambiadores). Ruta 1. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles	**Source of Risk**	Project	**Type of Impact**	- Scope
Associated Outcomes	- Disminuir los costos de operación vehicular - Incrementar la seguridad vial y portuaria	**Responsible**	MOPT	**Probability Factors**	El producto se ejecuta fuera del financiamiento directo del Programa con aporte local, pese al compromiso de obtención de los recursos y cumplir con los estándares ambientales y sociales del Banco para la licitación del proyecto no se estableció una metodología para la medición de los indicadores, por lo que se requiere realizar coordinación entre el OE y el Banco para poder ejecutar la evaluación final.
Description of Impact	La falta de medición de resultados podría limitar la evaluabilidad del Programa, afectando la capacidad de demostrar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo ante el cierre operativo.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	Aprovechando la Evaluación Final del Programa, se podría acordar entre las partes la estrategia para la medición de resultados en el tramo Barranca-Limonal y La Angostura	MITIGATE	ACTIVE	

Details

Estimated Completion Date	Q2 2026	**Budget**	0	**Responsible**	Unidad Ejecutora
Completion Date	11/1/2026	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

MATERIALIZED RISKS

Issue ID	Issue Description
1	Los problemas de capacidad de ejecución del contratista del proyecto Barranca Limonal conducen a una terminación anticipada del contrato respectivo.

Details

Associated Risk	Si las empresas contratistas de obra mantienen limitaciones en su capacidad organizativa, de gestión de obra o de productividad, entonces podrían presentarse atrasos en la ejecución de los contratos, lo que podría disminuir la ejecución financiera anual del Programa y extender los plazos de cierre de las obras.	**Action**	Se ejecutó una terminación anticipada del contrato y finiquito respectivo. Por medio del convenio modificatorio 1 se establece el compromiso del GdCR para completar las obras con fondos de contrapartida.	**Expected Completion Date**	12/31/2024
Operation Impact	La obra Barranca Limonal se posterga en el tiempo y debe ser cubierta con fondos de contrapartida.	**Lesson Learned**	La identificación temprana de problemas de capacidad de ejecución por parte de los contratistas debe acompañarse de mecanismos de toma de decisión que permitan definir de manera oportuna la implementación de medidas de mitigación o la terminación anticipada del contrato.	**Completion Date**	

Issue ID	Issue Description
2	Los problemas de capacidad de ejecución del contratista del proyecto Barranca Limonal conducen a una terminación anticipada del contrato respectivo.

Details

Associated Risk	Si las empresas contratistas de obra mantienen limitaciones en su capacidad organizativa, de gestión de obra o de productividad, entonces podrían presentarse atrasos en la ejecución de los contratos, lo que podría disminuir la ejecución financiera anual del Programa y extender los plazos de cierre de las obras.	**Action**	Se ejecutó una terminación anticipada del contrato y finiquito respectivo. Por medio del convenio modificatorio 1 se establece el compromiso del GdCR para completar las obras con fondos de contrapartida.	**Expected Completion Date**	12/31/2024
Operation Impact	La obra Barranca Limonal se posterga en el tiempo y debe ser cubierta con fondos de contrapartida.	**Lesson Learned**	La identificación temprana de problemas de capacidad de ejecución por parte de los contratistas debe acompañarse de mecanismos de toma de decisión que permitan definir de manera oportuna la implementación de medidas de mitigación o la terminación anticipada del contrato.	**Completion Date**	12/31/2024

Issue ID	Issue Description					
3	Los problemas de capacidad financiera del contratista del proyecto Barranca Limonal conducen a una terminación anticipada del contrato respectivo.					
	Details					
	Associated Risk	Si las empresas contratistas presentan limitaciones de liquidez o restricciones financieras para sostener el ritmo de ejecución, entonces podría ralentizar la ejecución de las obras, lo que podría afectar los cronogramas contractuales y reducir la ejecución financiera anual programada.	**Action**	Se ejecutó una terminación anticipada del contrato y finiquito respectivo. Por medio del convenio modificatorio 1 se establece el compromiso del GdCR para completar las obras con fondos de contrapartida.	**Expected Completion Date**	12/31/2024
	Operation Impact	La obra Barranca Limonal se posterga en el tiempo y debe ser cubierta con fondos de contrapartida.	**Lesson Learned**	La identificación temprana de problemas de capacidad de ejecución por parte de los contratistas debe acompañarse de mecanismos de toma de decisión que permitan definir de manera oportuna la implementación de medidas de mitigación o la terminación anticipada del contrato.	**Completion Date**	

Issue ID	Issue Description					
4	Los problemas de capacidad financiera del contratista del proyecto Barranca Limonal conducen a una terminación anticipada del contrato respectivo.					
	Details					
	Associated Risk	Si las empresas contratistas presentan limitaciones de liquidez o restricciones financieras para sostener el ritmo de ejecución, entonces podría ralentizar la ejecución de las obras, lo que podría afectar los cronogramas contractuales y reducir la ejecución financiera anual programada.	**Action**	Se ejecutó una terminación anticipada del contrato y finiquito respectivo. Por medio del convenio modificatorio 1 se establece el compromiso del GdCR para completar las obras con fondos de contrapartida.	**Expected Completion Date**	12/31/2024
	Operation Impact	La obra Barranca Limonal se posterga en el tiempo y debe ser cubierta con fondos de contrapartida.	**Lesson Learned**	La identificación temprana de problemas de capacidad de ejecución por parte de los contratistas debe acompañarse de mecanismos de toma de decisión que permitan definir de manera oportuna la implementación de medidas de mitigación o la terminación anticipada del contrato.	**Completion Date**	12/31/2024

Issue ID	Issue Description					
5	Durante la ejecución de los contratos de obra se identificaron situaciones asociadas a la gestión socioambiental que requirieron ser atendidas como contigencias.					
	Details					
	Associated Risk	Si la gestión socioambiental no identifica y atiende oportunamente impactos residuales, pasivos o compromisos pendientes, entonces podrían mantenerse afectaciones a beneficiarios o terceros, lo que podría afectar el logro de los objetivos del Programa y generar contingencias durante el cierre.	**Action**	1. Implementación de medidas de mitigación y compensación socioambiental. 2. Fortalecimiento del monitoreo ambiental y social durante la ejecución. 3. Atención de requerimientos derivados de salvaguardas y compromisos contractuales. 4. Ejecución de obras complementarias para cierre de pasivos socioambientales.	**Expected Completion Date**	7/31/2024
	Operation Impact	Las situaciones socioambientales generaron ajustes en el alcance de algunas intervenciones y la ejecución de obras complementarias (a través procesos de adquisiciones adicionales), lo que implicó extensiones en plazos de cierre de contratos así como el uso de contingencias del Programa.	**Lesson Learned**	La gestión socioambiental requiere líneas base robustas, monitoreo continuo y mecanismos de atención temprana de impactos, a fin de evitar la acumulación de pasivos y minimizar la necesidad de intervenciones correctivas durante etapas avanzadas del proyecto.	**Completion Date**	7/31/2024

Issue ID	Issue Description					
6	Se han presentado retrasos en los procesos de liberación del derecho de vía, lo que ha afectado la disponibilidad oportuna de áreas para la ejecución de obras.					
	Details					
	Associated Risk	Si persisten atrasos en la liberación del derecho de vía y en los procesos de expropiación de los tramos pendientes, entonces la ejecución de las obras podría verse reprogramada, lo que podría reducir la ejecución financiera anual del Programa y afectar la secuencia de cierre de los contratos	**Action**	1. Implementación de planes de acción predial con priorización de tramos críticos. 2. Coordinación interinstitucional para agilizar procesos de expropiación. 3. Ajustes en la programación de obras y ejecución por frentes disponibles.	**Expected Completion Date**	7/31/2024
	Operation Impact	Los atrasos en la liberación del derecho de vía generaron reprogramaciones en la ejecución de obras, afectando el ritmo de avance físico y financiero y propiciaron una de las causas de la terminación anticipada del contrato de Barranca - Limonal y La Angostura, que conllevo en su postergación en el tiempo y que fuera cubierta con fondos de contrapartida.	**Lesson Learned**	La disponibilidad oportuna del derecho de vía es un factor crítico para la ejecución de proyectos viales, por lo que debe asegurarse desde etapas tempranas mediante planificación predial, diseños optimizados y mecanismos ágiles de gestión de expropiaciones. Dentro de los nuevos contratos de préstamo del Banco, se incluyen obligaciones especiales al Prestatario en relación con la posesión legal de los inmuebles, las servidumbres y otros derechos necesarios así como derechos sobre las aguas, para cada una de las obras por realizar y previo al inicio de las obras.	**Completion Date**	7/31/2024

FINDINGS AND RECOMMENDATIONS

Progress

Advances in Execution and Dissemination

Output Definition	Advances in Execution	Category	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2026
1.01 Diseño de Intercambiadores La Lima y Taras. Ruta 2. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles.	Servicios de diseño para los siguientes proyectos: 1- Biirmania - Santa Cecilia y La Cruz - Santa Cecilia, Diseño de los intercambios Taras - La La Lima y 3. Diseño de Palmar Norte - Paso Canoas. Completado. Entregado desde 2019	P	-	-	-	-	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5
		P (a)	-	-	-	-	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6
		A	-	-	-	-	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6
1.02 Tramo Barranca-Limonal rehabilitado y ampliado (incluye vía, puentes e intercambiadores). Ruta 1. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles	Contratación de la Ampliación y Rehabilitación de la Ruta Nacional Nº1, Carretera Interamericana Norte, Sección Barranca - Limonal, y de la Ruta Nacional Nº17, Sección La Angostura En proceso. El Contrato de obra principal se terminó anticipadamente. Actualmente, se han ejecutado obras de emergencia para proteger la inversión y garantizar la seguridad de los usuarios, y actualmente se ejecutan obras para mejoramiento del corredor para completar los pasivos ambientales-sociales del corredor ante la terminación anticipada, lo cual es un compromiso del Organismo Ejecutor ante el Banco.	P	-	-	-	-	-	49	-	-	-	-	-	-	-	49
		P (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	49
		A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03 Ampliación y Rehabilitación Cañas-Limonal. Ruta 1. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles.	Contratación de la Ampliación y Rehabilitación de la Ruta Nacional Nº1, Carretera Interamericana, Sección Limonal - Cañas Construcción de obras terminada en 2023, se llevan obras complementarias para atención de los pasivos ambientales y sociales del corredor.	P	-	-	-	-	20.5	-	-	-	-	-	-	-	-	20.5
		P (a)	-	-	-	-	-	-	-	20.5	20.5	-	-	-	-	20.5
		A	-	-	-	-	-	-	-	-	20.5	-	-	-	-	20.5
1.04 Rehabilitación Playa Naranjo Paquera. Ruta 160. Km de la red vial primaria mejorados y ampliados a cuatro carriles.	Contratación de Mejoramiento y Rehabilitación de la Ruta Nacional No.160, Sección Playa Naranjo - Paquera Completado. Construcción terminada desde 2021, se llevan obras complementarias para atención de los pasivos ambientales y sociales del corredor.	P	-	-	-	-	22.5	-	-	-	-	-	-	-	-	22.5
		P (a)	-	-	-	-	-	-	22.5	-	-	-	-	-	-	22.5
		A	-	-	-	-	-	-	22.5	-	-	-	-	-	-	22.5
1.05 Otros tramos viales: Ruta Nacional 35 (En la Operación CR-L1151 se presentan los indicadores de resultados para la RN35)	Otros tramos viales: Ruta Nacional 35 (En la Operación CR-L1151 se presentan los indicadores de resultados para la RN35) Se han completado los siguientes productos: Diseño RN 35 Bernardo Soto - Sifón (Punta Sur), Construcción de intercambios Taras y La Lima (Etapa de diseño), Rehabilitación Palmar Norte - Paso Canoas (Etapa de diseño), Rehabilitación La Cruz - Santa Cecilia - Birmania (Etapa de diseño), Barreras de seguridad vial en la Ruta Nacional No. 1 Carretera Interamericana Norte, sección Cañas - Liberia, Construcción Ruta Nacional No. 35, Sección: Bernardo Soto - Sifón (Etapa de diseño), entre otros estudios. Por otro lado se mantiene en proceso las Intervenciones en Ruta Nacional No. 35 que se ejecuta bajo la operación CR-L1151, pero que se cofinancia a partir de la operación CR-L1032.	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	18
		P (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	18
		A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01 Terminales de transbordadores rehabilitadas	Ampliación y Mejora de la Terminal de Transbordadores del Puerto de Paquera, Cantón de Puntarenas (Costa Rica) Construída. Obras finalizadas desde 2023.	P	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		P (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
		A	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
2.02 Rompeolas de Caldera rehabilitado	Contratación de Diseño y Construcción para la Rehabilitación y Reforzamiento del Rompeolas de Puerto Caldera Construída. Obras finalizadas desde 2021.	P	-	-	-	-	320	-	-	-	-	-	-	-	-	320
		P (a)	-	-	-	-	-	-	594	-	-	-	-	-	-	594
		A	-	-	-	-	-	-	594	-	-	-	-	-	-	594
2.03 Rompeolas de Caldera ampliado	Contratación de Diseño y Construcción para la Rehabilitación y Reforzamiento del Rompeolas de Puerto Caldera Construída. Obras finalizadas desde 2021.	P	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	66
		P (a)	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-	38
		A	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-	38
2.04 Plan Maestro Caldera desarrollado	Servicios de consultoría para realizar el Plan Maestro Portuario del Litoral Pacífico, con énfasis en Puerto Caldera. Estudio realizado. Estudio entregado desde 2021.	P	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		P (a)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		A	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Outcome Statement	Advance in the Achievement of Outcome
Disminuir los costos de operación vehicular	El Organismo Ejecutor se encuentra pendiente de presentar el Informe de Evaluación Final del Programa, el cual permitirá medir este indicador. Para el tramo Barranca – Limonal y La Angostura, se deberá definir una estrategia específica de medición de resultados, dado que las obras serán ejecutadas con recursos de contrapartida.
Reducir tiempos de viaje de personas y bienes	El Organismo Ejecutor se encuentra pendiente de presentar el Informe de Evaluación Final del Programa, el cual permitirá medir este indicador. Para el tramo Barranca – Limonal y La Angostura, se deberá definir una estrategia específica de medición de resultados, dado que las obras serán ejecutadas con recursos de contrapartida.
Incrementar la seguridad vial y portuaria	El Organismo Ejecutor realiza actualmente el proceso de contratación para evaluación de resultados.

Have the outputs and/or outcomes of the operation been disseminated? No

Sustainability and Innovation

Sustainability

Is the operation meant to be sustainable?	Yes

Los proyectos de obras que resultan de este programa, garantiza mejores condiciones de viaje para los usuarios de las vias y mejores condiciones maritimas protuarias, las mismas tendran un mantenimiento rutinario y contaran con seguimiento continuo por parte del MOPT para garantizar la sostenibilidad de las obras y durabilidad de las mismas.

Innovation

Did the TC introduce any key innovations (new processes or new products)?	Yes

Type of innovation	Key Innovation	Extent of success
Process Innovation	Uso de la Metodología BIM.	Se desarrolla un proyecto piloto que consiste en la aplicación de la metodología BIM para la construcción de la rehabilitación y ampliación en un tramo de carretera de 25.6 km entre San Gerardo y Barranca, perteneciente a la Ruta 1, ubicado en la provincia de Puntarenas, en Costa Rica. El piloto se desarrolla en fases, las cuales consisten en: La adecuación de los diseños constructivos a formato 5D. Inclusión de las cláusulas contractuales en los pliegos de licitación, para solicitar a los oferentes tanto de la obra, como de la supervisión, los requerimientos para la aplicación de la metodología BIM. El proceso de capacitación institucional para generar las habilidades necesarias como BIM Managers. La ejecución de la obra utilizando la metodología en cuestión. El análisis comparativo de los procesos de ejecución con otros proyectos realizados de manera convencional.

FINDINGS AND RECOMMENDATIONS

Partners & Consultancies

No Information available for this section.

Consultancies Hired Through Project Resources

No Information available for this section.

FINDINGS AND RECOMMENDATIONS

Stories from the Field

Type of Story	Story Link	Comments
Challenge		El COVID 19 ha sido todo un reto para la ejecución de las obras, en especial por la importanción de materiales, maquinaria y recurso humano, lo cual estuvo detenido por unos meses. Por suerte en Costa Rica la obra civil no se detuvo y se pudo trabajar de forma continua aunque si fue más lenta.
Challenge		Es muy importante considerar en la programación de los proyectos la duración de los procesos de licitación para la contratación de las obras, ya que en estos contratos tan grandes se dan muchas apelaciones que retrasan la adjudicación, debido a esto se utilizó la estrategia de sacar licitaciones escalonadas, de forma que en la siguiente licitación se tomaran los insumos de lecciones aprendidas para evitar apelaciones a los siguientes carteles, lo que funciono de una manera bastante acertada.
Challenge		Lograr adquirir los predios en el momento oportuno, ha dificultado mucho el correcto avance de las obras, lo que ha implicado realizar un esfuerzo adicional en la gestión de expropiaciones y cambios en los diseño para evitar contratiempos por esta situación.
Challenge		Es muy importante que tanto la firma Supervisora, como el contratista conozcan perfectamente como es el manejo de los contratos FIDIC, es necesario solicitar que al menos el Ingeniero responsable haya llevado el curso de FIDIC, nivel I. Tambien es un reto para el Banco pues debe promocianar el conocimiento sobre los contratos FIDIC en el Sector y en la región.
Success		Se logró superar los procesos de apelacionesde dos licitaciones, adjudicando dos obras viales y una marítima portuaria.

EVALUATION TRACKING

Evaluacion expost

Evaluation

Evaluation Methodology as per DEM:	Cost-Benefit Analysis Ex Post
Current Evaluation Methodology:	Cost-Benefit Analysis Ex Post
Stage:	Pre-Internvention (Ex Ante)
Main Topic of the Intervention:	TRANSPORT
Other Topics of the Intervention:	TRANSPORT
Main Topic of the Evaluation:	TRANSPORT
Other Topics of the Evaluation:	TRANSPORT

Status of the evaluation:	Active
Expected Date of Final Evaluation Report:	11/13/2020
Responsible:	External
Information on Responsible:	MOPT

Funding

Source of funding:	
Amount in USD (Thousands):	
Code:	
Total amount in USD (Thousands) spent to date in data collection:	40

Comments

3/14/2016	
edgarz	

Documents

Stage	Type of document	Name	Document Description	Document Date	Document Number	Document Permissions	Document User
Pre-Internvention (Ex Ante)	Monitoring & Evaluation Plan (As per DEM)	Enlace Electrónico requerido #4. Plan de Seguimiento y Evaluación	Plan Monitoreo y Evaluacion		EZSHARE-1378825871-4	All	edgarz
Pre-Internvention (Ex Ante)	Evaluation Report Ex-Ante (from DEM)	Enlace Electrónico Opcional #2. Evaluación Económica Obra Vial: Limonal - Barranca	Evaluación Económica Limonal-Barranca		EZSHARE-1378825871-3	Only me	edgarz
Pre-Internvention (Ex Ante)	Evaluation Report Ex-Ante (from DEM)	Enlace Electrónico Opcional #3- Evaluación económica Rompeolas Puerto Caldera - POD	Evaluación Económica Rompeolas		EZSHARE-1378825871-2	Only me	edgarz

Validation Process


Date	User	Role	Action	Comment	Classification	Workflow
10/02/2026	MARIANOA	Team Leader	Completed by Team Leader		Problem	Progress Monitoring Report September Validation Workflow

MONITORING INDICATORS

Stage 2: After Eligibility


		Benchmark Indicator Value			
Indicator (I)	**Project Indicator Value**	**Satisfactory**	**Alert**	**Problem**	**Traffic Light**
Synthetic Indicator (SI)	1.60	2.5 <= I	2<=I<2.5	I<2	PROBLEM
Accumulated disbursements to country's historic disbursements	0.77	1 >= I > 0.9	0.9 >= I >=0.83	0.83 > I >= 0	PROBLEM
Cost Performance Index (annual - CPI(a)	0.69	0.80 <= I <= 2.00	0.40 <= I < 0.80	0.00 <= I < 0.40	ALERT
Schedule Performance Index (annual)- SPI(a)	0.54	0.80 <= I <= 2.00	0.40 <= I < 0.80	0.00 <= I < 0.40	ALERT
Environmental and social safeguards performance rating	Partially Satisfactory	N/A	N/A	N/A	For tracking purpose only

Accumulated disbursements as proportion of the total amount

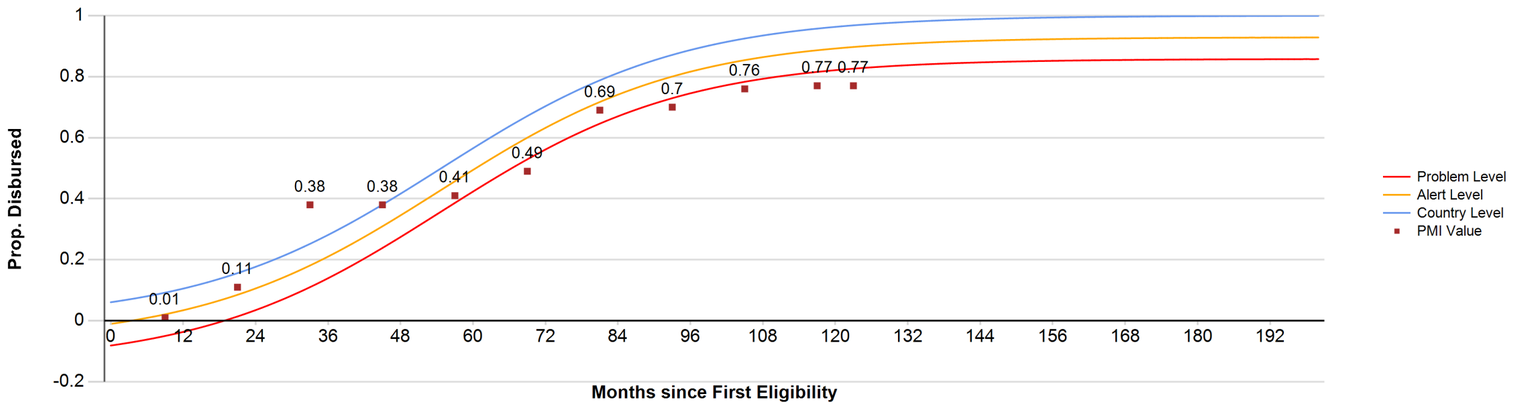


PV, AC, EV, PV(a), EV(a)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PV	0.00	361,300.00	4,935,100.00	113,904,000.00	323,147,600.00	403,990,000.00	403,990,000.00	403,990,000.00	403,990,000.00	403,990,000.00	403,990,000.00	403,990,000.00
AC	0.00	137.00	3,937,135.93	30,593,426.56	48,625,819.47	102,126,978.76	153,148,484.27	213,718,366.32	241,937,300.82	264,710,762.53	275,161,396.31	280,661,216.85
EV	0.00	137.00	3,937,135.93	30,593,426.56	26,171,423.33	29,784,852.91	78,993,433.57	79,983,211.28	169,527,065.90	169,698,513.20	177,826,096.72	154,336,012.78
PV(a)	0.00	361,300.00	4,822,652.00	69,007,320.56	65,660,702.86	93,005,158.10	248,148,553.18	216,563,365.61	329,649,877.73	265,583,017.46	277,879,727.23	361,252,385.60
EV(a)	0.00	137.00	3,937,135.93	30,593,426.56	48,924,324.97	100,724,152.77	150,266,169.99	105,099,344.19	228,228,889.81	263,921,990.39	278,743,323.99	194,207,847.69

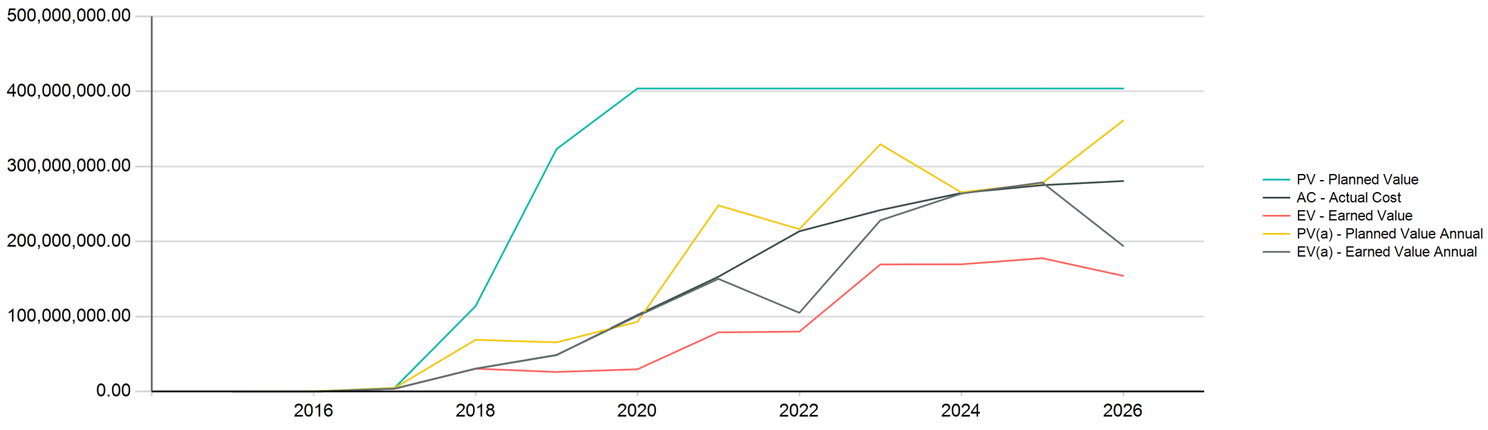

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CPI(a)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.01	0.99	0.98	0.49	0.94	1.00	1.01	0.69
SPI(a)	1.00	0.00	0.82	0.44	0.75	1.08	0.61	0.49	0.69	0.99	1.00	0.54

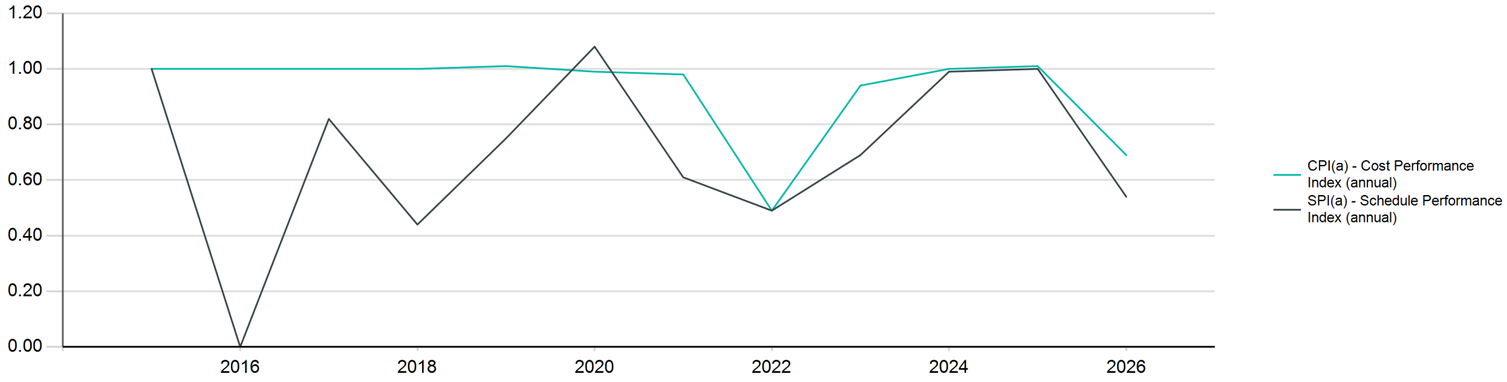
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
2016
2018
2020
2022
2024
2026
CPI(a) - Cost Performance Index (annual)
SPI(a) - Schedule Performance Index (annual)
