PMR Operational Report

Operation Number	CR-L1157	**Chief of Operations Validation Date**	
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2026	**Division Chief Validation Date**	
Last Update	10/02/26	**Country Representative Validation Date**	
PMR Validation Stage	Completed by Team Leader		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Second Renewable Energy, Transmission and Distribution of Electricity Program	**Loan Number**	6061/OC-CR
Executing Agency	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	**Sector/Subsector**	ENERGY-LOW-CARBON ENERGY TECHNOLOGIES
Team Leader	MEJIA REYES, EDWIN ORLANDO	**Overall Stage**	Effective/Pending Eligibility
Operation Type	Loan Operation	**Country**	Costa Rica
Lending Instrument	Investment Loan	**PMR required**	YES
Borrower	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD	**Convergence related Operation(s)**	

Events Data

Supervision	
Signature	04/09/26
Ratification	
Legal Effectiveness	04/09/26
Total Eligibility	
Partial Eligibility	
First Disbursement	
Original Disbursement Expiration	04/09/32
Current Disbursement Expiration	04/09/32

Preparation

On pipeline	01/28/25
Start date	02/03/25
PP Approved	
ERM	
PCD Approved	09/08/25
DLP Approved by OPC	09/15/25
Negotiation	09/30/25
Operation Approved	10/31/25

Objective

The general objective of this second Program is to contribute to a more reliable, efficient, and sustainable electricity supply. The specific objectives are: (i) to restore the operational availability and efficiency of the PHVG; (ii) to improve the reliability of the transmission network; and (iii) to increase the efficiency of the public lighting system managed by ICE.

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B
Risk	High
Safeguard Performance Rating	Satisfactory
Safeguard Performance Rating - Rationale	El programa fue aprobado en octubre de 2025 y aún está en proceso de firmas del contrato de préstamo. Durante la preparación se cumplieron los requisitos establecidos en el MPAS y NDAS según la tipología de los proyectos. Ninguna actividad objeto de financiamiento por el programa ha iniciado.

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval	

	Total Cost and Source					Available Funds (US$)			
Operations	**Original IDB**	**Current IDB**	**Local Counterpart**	**Co-Financing / Country**	**Total Original Cost**	**Current IDB**	**Disb. Amount to Date**	**% Disbursed**	**Undisbursed Amount**
CR-L1157	200,000,000	200,000,000	115,080,000		315,080,000	200,000,000	-	0.00%	200,000,000
Aggregated	**200,000,000**	**200,000,000**	**115,080,000**		**315,080,000**	**200,000,000**	**-**	**0.00%**	**200,000,000**

Development Effectiveness Matrix

Economic Analysis

Undefined	Yes
Cost benefit analysis	No
Cost effectiveness analysis	No
General economic analysis (Economic rate of return)	No

Evaluation

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Undefined	Yes
Random assignment	No
Non-experimental method	No
Ex-post cost benefit analysis	No
Ex-post cost effectiveness analysis	No
Before/after or With/without comparison	No

No Data Available

Printed on: October 14, 2026 4:27:10 PM

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Contribuir a un suministro eléctrico más confiable, eficiente y sostenible.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		EOP 2032
1.0	Generación de Energía Renovable	%	94.5	2025	2031	P	97.9
						A	-

Details

Means of Verification: Informe anual del DOCSE

Observations: Informes anuales del ICE, específicamente de la División de Generación y/o de la División Operación y Control del Sistema Eléctrico (DOCSE). Línea base corresponde al promedio simple de los tres años anteriores (2022 a 2024)

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		EOP 2032
1.1	Energía no suministrada	MWh	424	2025	2031	P	384
						A	-

Details

Means of Verification: Informes operativos anuales del ICE.

Observations: Energía que no pudo ser suministrada a los usuarios del sistema eléctrico debido a interrupciones o fallas, reflejando la confiabilidad y la eficiencia en la prestación del suministro. Línea base corresponde al promedio simple de los tres años anteriores (2022 a 2024)

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Restablecer la disponibilidad operativa y eficiencia de la planta hidroeléctrica Ventanas-Garitas

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	EOP 2032
1.0	Tiempo total de interrupciones forzadas	Number (#)	477	2025	P	-	-	-	-	-	200	-	200
					A	-	-	-	-	-	-	-	200

Details

Means of Verification: Informes operativos anuales de la División de Generación del ICE

Observations: Suma anual de horas en que la planta PHVG estuvo fuera de operación por fallas imprevistas, reflejando su nivel de disponibilidad y confiabilidad operativa. Valores corresponden al promedio de 2023-2024.

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution	2.16 Electricity generated from renewable sources (GWh) (C)								

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	EOP 2032
1.1	Tiempo total de interrupciones programadas	Number (#)	3443	2025	P	-	-	-	-	-	2,500	-	2,500
					A	-	-	-	-	-	-	-	2,500

Details

Means of Verification: Informes operativos anuales de la División de Generación del ICE

Observations: Suma anual de horas en que la planta PHVG estuvo fuera de operación por mantenimientos programados, reflejando su eficiencia operativa y capacidad de planificación. Valores corresponden al promedio de 2023-2024.

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution	2.16 Electricity generated from renewable sources (GWh) (C)								

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	EOP 2032
1.2	Mujeres contratadas durante la modernización de PHVG	%	0	2025	P	-	-	-	-	-	5	-	5
					A	-	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Reporte UEP – ICE

Observations: Porcentaje promedio de mujeres contratadas en actividades de obra civil, montaje electromecánico y servicios auxiliares durante la ejecución del componente de modernización de la PHVG. Este indicador busca reflejar el grado de inclusión laboral femenina.

Evaluation Methodology: -

Gender-related	Yes	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

Specific Development Objectives Nbr. 2: Mejorar la confiabilidad de la red de transmisión

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	EOP 2032
2.0	Duración promedio de las fallas en equipos de transformación	min	188	2025	P	-	-	-	-	-	174	-	174
					A	-	-	-	-	-	-	-	174

Details

Means of Verification: Informe de la División de Transmisión – ICE para ARESEP

Observations: Tiempo promedio que duran las interrupciones registradas en los transformadores de potencia. Valores corresponden a promedio de los dos años anteriores al año de reporte.

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	EOP 2032
2.1	Tasa de falla de transformadores de potencia	%	8.7	2025	P	-	-	-	-	-	-	-	7.4
					A	-	-	-	-	-	-	-	7.4

Details

Means of Verification: Informe de la División de Transmisión – ICE para ARESEP

Observations: Mide qué proporción de la capacidad total de los transformadores de potencia en la red de transmisión ha fallado durante un período determinado. Valores corresponden a promedio de los dos años anteriores al año de reporte.

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution								

Specific Development Objectives Nbr. 3: Incrementar la eficiencia del parque de alumbrado público gestionado por el ICE

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	EOP 2032
3.0	Consumo de electricidad anual del sistema de alumbrado público	MWh/año	22338	2025	P	-	-	19,800	17,182	14,600	14,600	-	14,600
					A	-	-	-	-	-	-	-	14,600

Details

Means of Verification: Informe de Gestión de Mantenimiento de la División de Distribución del ICE

Observations: Energía eléctrica consumida en un año por el sistema de alumbrado público que será reemplazado como parte del presente programa (40.000 luminarias).

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution								

RESULTS MATRIX

OUTPUTS PHYSICAL PROGRESS

Component Nbr. 1: Modernización de la PHVG

	Output	Unit of Measure		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	EOP 2032
1.1	Casa de máquinas modernizada.	#	P	0	0	0	0	1	0	0	1
			P (a)	0	0	0	0	1	0	0	1
			A	0	-	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification:

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**			

Milestone				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	EOP 2032
	Equipos electromecánicos principales para generación eléctrica, instalados.	#	P	0	0	0	1	0	-	0	1
			P (a)	0	0	0	1	0	-	0	1
			A	0	-	-	-	-	-	-	0
	Transformadores de potencia de PHVG instalados.	#	P	0	0	0	1	1	-	0	2
			P (a)	0	0	0	1	1	-	0	2
			A	0	-	-	-	-	-	-	0

1.2

Output	Unit of Measure		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	EOP 2032
Obras de captación de agua modernizadas.	#	P	0	0	0	0	0	3	0	3
		P (a)	0	0	0	0	0	3	0	3
		A	0	-	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification:

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

Milestone				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	EOP 2032
	Equipos electromecánicos para tomas de agua (Virilla y Ciruelas) instalados.	#	P	0	0	0	1	1	-	0	2
			P (a)	0	0	0	1	1	-	0	2
			A	0	-	-	-	-	-	-	0
	Intervención en el embalse San Miguel completada.	#	P	0	0	0	0	0	1	0	1
			P (a)	0	0	0	0	0	1	0	1
			A	0	-	-	-	-	-	-	0

1.3

Output	Unit of Measure		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	EOP 2032
Estudios técnicos de proyectos de inversión desarrollados.	#	P	0	1	1	0	0	0	0	2
		P (a)	0	1	1	0	0	0	0	2

Estudios técnicos de proyectos de inversión desarrollados.	#	A	0	-	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification:

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

Component Nbr. 2: Modernización y ampliación de la infraestructura de transmisión

	Output	Unit of Measure		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	EOP 2032
2.1	Transformadores de potencia y reactores instalados.	#	P	0	0	9	13	4	0	0	26
			P (a)	0	0	9	13	4	0	0	26
			A	0	-	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification:

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

Component Nbr. 3: Sustitución de luminarias convencionales por LED

	Output	Unit of Measure		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	EOP 2032
3.1	Luminarias LED instaladas.	#	P	0	0	13,115	13,530	13,355	0	0	40,000
			P (a)	0	0	13,115	13,530	13,355	0	0	40,000

Luminarias LED instaladas.	#	A	0	-	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification:

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

OUTPUTS FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1: Modernización de la PHVG

Component revised cost: 231,300,000

	Output	Unit of Measure		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	EOP 2032
1.1	Casa de máquinas modernizada.	#	P	2,229,094	17,176,906	56,208,083	25,025,336	16,305,874	21,605,707	0	138,551,000
			P (a)	2,229,094	17,176,906	56,208,083	25,025,336	16,305,874	21,605,707	0	138,551,000
			A	-	-	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification:

Gender-related		**Indigenous people-related**		**Afrodescendats-related**		**Persons with disabilities-related**		**LGBTQ+ individuals-related**	
IF indicator					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	EOP 2032
1.2	Obras de captación de agua modernizadas.	#	P	8,151,324	26,392,381	26,517,149	29,733,108	1,455,038	0	0	92,249,000
			P (a)	8,151,324	26,392,381	26,517,149	29,733,108	1,455,038	0	0	92,249,000
			A	-	-	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification:

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	EOP 2032
1.3	Estudios técnicos de proyectos de inversión desarrollados.	#	P	0	335,227	164,773	0	0	0	0	500,000
			P (a)	0	335,227	164,773	0	0	0	0	500,000
			A	-	-	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification:

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

Component Nbr. 2: Modernización y ampliación de la infraestructura de transmisión

Component revised cost: 73,599,999

	Output	Unit of Measure		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	EOP 2032
2.1	Transformadores de potencia y reactores instalados.	#	P	9,296,429	13,944,647	28,214,224	868,002	12,108,438	9,168,259	0	73,599,999
			P (a)	9,296,429	13,944,647	28,214,224	868,002	12,108,438	9,168,259	0	73,599,999
			A	-	-	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification:

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

Component Nbr. 3: Sustitución de luminarias convencionales por LED

Component revised cost: 10,100,001

	Output	Unit of Measure		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	EOP 2032
3.1	Luminarias LED instaladas.	#	P	0	8,048,990	387,374	387,374	256,263	1,020,000	0	10,100,001
			P (a)	0	8,048,990	387,374	387,374	256,263	1,020,000	0	10,100,001
			A	-	-	-	-	-	-	-	0

Details

Means of Verification:

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

Other Costs

		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Cost
Monitoreo y evaluaciones realizadas.	P	-	-	-	40,000	-	40,000	-	80,000
	P (a)	-	-	-	40,000	-	40,000	-	80,000
	A	-	-	-	-	-	-	-	-

Total Costs

		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Cost
Total Cost	P	19,676,847	65,898,151	111,491,603	56,053,820	30,125,613	31,833,966	-	315,080,000
	P (a)	19,676,847	65,898,151	111,491,603	56,053,820	30,125,613	31,833,966	-	315,080,000
	A	-	-	-	-	-	-	-	-

CORPORATE INDICATORS

IF INDICATORS

No Information available for the section.

Change Matrix

No information available for the section

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Status of the Implementation

Durante el primer semestre de 2026 se alcanzó el principal hito del período: la firma del Contrato de Préstamo 6061/OC-CR, luego de la aprobación de la Autoridad Presupuestaria en marzo. No hubo desembolsos ni avances físicos. El trabajo se concentró en preparar las adquisiciones prioritarias y los arreglos de ejecución, con supervisión cercana: una misión de administración en marzo, reuniones de seguimiento en abril y mayo, y una misión en junio que incluyó una visita técnica a la PHVG.

En adquisiciones, el ICE ajustó los documentos de licitación de la LPI de equipos electromecánicos de la PHVG (US$72,7 millones). Incorporó las observaciones de una firma especializada contratada por el Banco, cuyo informe final fue satisfactorio. Esto dejó el proceso listo para su publicación, que ocurrió en julio. El Aviso General de Adquisiciones se publicó en junio. Los documentos de licitación de luminarias LED pasaron por varias rondas de revisión para alinearlos con el documento estándar vigente del Banco. En cuanto a las adquisiciones anticipadas, se firmaron los contratos de puentes grúa y de reactores, y el informe de grúas se remitió al Banco en abril.

Durante el período se materializó un riesgo identificado en la preparación. Los transformadores de potencia se adjudicaron a un proveedor de un país no elegible, por lo que solo el lote de reactores puede financiarse. Para sustituirlos, el ICE identificó inversiones alineadas con el objetivo de confiabilidad de la red de transmisión: sistemas de protección y control, equipos de alta tensión en el Anillo Miravalles e hilo guarda OPGW. Este cambio requiere ajustar la Matriz de Resultados del Componente 2.

Likelihood of Achieving Development Objectives

High	Se mantiene alta, dado que los objetivos de desarrollo del Programa continúan siendo alcanzables. Durante el período se registraron avances relevantes en los procesos de adquisiciones estratégicas, el cumplimiento de condiciones de elegibilidad y la preparación de los arreglos institucionales para la ejecución. Aunque no se reportan aún avances físicos ni desembolsos, esta situación es consistente con la etapa inicial de implementación. Los riesgos identificados se encuentran bajo seguimiento y cuentan con medidas de mitigación definidas, por lo que se prevé el logro de los resultados previstos.

Lesson Learned

Category	Lesson Learned	Entered in System
Project Management Capacity	Involucrar desde el inicio a los especialistas técnicos en la estructuración del programa fortalece la apropiación de objetivos, mejora la calidad de la información y facilita la toma de decisiones durante la ejecución. La revisión de especificaciones por expertos externos en procesos complejos como la PHVG mejoró la calidad de los documentos de licitación antes de pedir la No Objeción.	10/2/2026
Intra/Inter Coordination	Las reuniones periódicas de seguimiento con acuerdos formales, responsables y plazos definidos mejoran la coordinación entre áreas técnicas y permiten resolver oportunamente factores que afectan el avance.	10/2/2026
Legal aspects and public processes	La preparación anticipada de condiciones regulatorias, institucionales y operativas en paralelo con los procesos de contratación contribuyen a reducir riesgos de implementación y facilitar el inicio oportuno de las actividades del programa. En adquisiciones anticipadas bajo sistema nacional, hacer un seguimiento cercano a la elegibilidad de origen antes de adjudicar evita no tener financiamiento elegible.	10/2/2026
Acquisitions and Procurement - Provider Performance and Supervision	El acompañamiento técnico continuo y el intercambio de conocimientos durante la preparación de los procesos de adquisición contribuyen al fortalecimiento de las capacidades de la Unidad Ejecutora para gestionar contrataciones complejas. Esta práctica favorece una mejor calidad de los productos generados, una mayor consistencia en los procesos y una preparación más sólida para la etapa de ejecución. Además, revisar desde el inicio con el documento estándar vigente, y aplicar las observaciones de procesos anteriores, reduce rondas de revisión y tiempos.	10/2/2026

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
1	Active	Si la complejidad de las definiciones técnicas para las obras de modernización de la central Ventanas-Garita no se abordan conforme a lo programado en el cronograma de la licitación, podrían surgir retrasos en los procesos de compras y contrataciones planificadas, lo que impactaría en el cronograma de ejecución de la modernización en más de 6 meses	2 - Medium Low	2 - Medium Low	Medium Low	Technical and operational complexity

Details

Associated Outputs	- Casa de máquinas modernizada.	**Source of Risk**	Project	**Type of Impact**	- Time
Associated Outcomes		**Responsible**	Unidad Ejecutora	**Probability Factors**	Obras altamente especializadas que deben ser fabricadas y suministradas bajo estándares específicos para cada caso.
Description of Impact	Los impactos sobre el cronograma de salidas de plantas de generación puede ocasionar problemas de entrega oportuna de energía al sistema nacional.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
0	-	-	-	

Details

Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	-
Completion Date		**Funding Source**	-	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
2	Active	Si se producen disrupciones significativas en las cadenas de suministro globales, podrían surgir sobrecostos y/o retrasos en la entrega de equipos para los tres componentes del programa, lo que generaría retrasos en la ejecución superiores a 6 meses y posibles incrementos del presupuesto del programa superiores a un 15%.	2 - Medium Low	3 - Medium High	Medium High	Scope and planning

Details

Associated Outputs	- Casa de máquinas modernizada. - Estudios técnicos de proyectos de inversión desarrollados. - Luminarias LED instaladas. - Obras de captación de agua modernizadas. - Transformadores de potencia y reactores instalados.	**Source of Risk**	Project	**Type of Impact**	- Time - Cost
Associated Outcomes	- Incrementar la eficiencia del parque de alumbrado público gestionado por el ICE - Mejorar la confiabilidad de la red de transmisión - Restablecer la disponibilidad operativa y eficiencia de la planta hidroeléctrica Ventanas-Garitas	**Responsible**	Unidad Ejecutora	**Probability Factors**	Las cadenas de suministro globales se encuentran sujetas a potenciales disrupciones en años recientes, sin embargo, no se han reportado afectaciones específicas para la industria que superen los 6 meses de atraso o incrementos superiores al 15%.
Description of Impact	Incremento de costo podría afectar alcance de la operación si es sustancial. Atrasos en la entrega de equipos puede afectar las salidas de plantas generadores programadas y afectar le entrega de energía.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	Monitoreo constante del mercado y se preparará un estudio de mercado actualizado previo a las licitaciones, para identificar proveedores alternativos y condiciones de suministro. También se hará una asignación de presupuesto para contingencia e imprevistos, así como monitoreo constante de las herramientas de gestión y planificación del programa.	MITIGATE	ACTIVE	

Details

Estimated Completion Date	Entrega de los equipos confirmada	**Budget**	0	**Responsible**	Unidad Ejecutora
Completion Date	12/31/2028	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
3	Active	Si no se mantiene una estructura organizacional ejecutora adecuada, con roles y responsabilidades claramente definidos en el Manual Operativo del programa (MOP), la ejecución del programa podría verse afectada, lo que resultaría en retrasos en el cronograma del primer año y en la ruta crítica superiores a 6 meses.	1 - Low	2 - Medium Low	Low	Project management capacity

Details

Associated Outputs	- Casa de máquinas modernizada. - Estudios técnicos de proyectos de inversión desarrollados. - Luminarias LED instaladas. - Obras de captación de agua modernizadas.	**Source of Risk**	Institutional capacity	**Type of Impact**	- Time
Associated Outcomes	- Incrementar la eficiencia del parque de alumbrado público gestionado por el ICE - Mejorar la confiabilidad de la red de transmisión - Restablecer la disponibilidad operativa y eficiencia de la planta hidroeléctrica Ventanas-Garitas	**Responsible**	Unidad Ejecutora	**Probability Factors**	Dado que ya se conformó la unidad ejecutora de conformidad con los perfiles acordados con el Banco, la probabilidad se asocia a cambios que se realicen en su conformación, lo que se considera bajo.
Description of Impact	Atrasos sistemáticos por problemas internos del equipo de proyecto ponen en riesgo la entrega oportuna de productos.				

Response Actions

0

Response Description	Management Strategy	Status
-	-	-

Details

Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	-
Completion Date		**Funding Source**	-	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
4	Active	Si no se preparan oportunamente especificaciones técnicas robustas ni se realiza un agrupamiento adecuado de las adquisiciones, se podrían presentar licitaciones desiertas y/o con atrasos, lo que ocasionaría demoras de más de 12 meses y sobrecostos significativos.	2 - Medium Low	4 - High	Medium High	Scope and planning

Details

Associated Outputs	- Casa de máquinas modernizada. - Estudios técnicos de proyectos de inversión desarrollados. - Luminarias LED instaladas. - Obras de captación de agua modernizadas. - Transformadores de potencia y reactores instalados.	**Source of Risk**	Project	**Type of Impact**	- Cost - Time
Associated Outcomes	- Incrementar la eficiencia del parque de alumbrado público gestionado por el ICE - Mejorar la confiabilidad de la red de transmisión - Restablecer la disponibilidad operativa y eficiencia de la planta hidroeléctrica Ventanas-Garitas	**Responsible**	Unidad Ejecutora	**Probability Factors**	El ejecutor tiene buenos equipos técnicos para la identificación de especificaciones y serán complementados con expertos internacionales de apoyo. El principal factor de probabilidad está asociado al nivel de claridad de las especificaciones técnicas en los documentos.
Description of Impact	Demoras pueden ocasionar afectaciones en el cronograma de salidas de operación de las plantas.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status
1	Se implementará solicitudes de información y reuniones tempranas con potenciales oferentes para validar especificaciones	MITIGATE	ACTIVE

Details

Estimated Completion Date	Adjudicacion de todos los procesos	**Budget**	0	**Responsible**	Unidad Ejecutora
Completion Date	12/31/2028	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status
2	Se implementará ferias de proveedores y difusión internacional para ampliar la participación	MITIGATE	ACTIVE

Details

Estimated Completion Date	Adjudicacion de todos los procesos	**Budget**	0	**Responsible**	Unidad Ejecutora
Completion Date	12/31/2028	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status
3	Definición de paquetes/lotes que promuevan competencia y busquen evitar concentración de adjudicaciones elaboradas con apoyo de expertos internacionales	MITIGATE	ACTIVE

Details

Estimated Completion Date	Adjudicacion de todos los procesos	**Budget**	30000	**Responsible**	Unidad Ejecutora
Completion Date	12/31/2028	**Funding Source**	TECHNICA	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status
4	Preparación de estudios de mercado como insumo complementario para la estructuración de los DDL, criterios de calificación y ajustes contractuales.	MITIGATE	ACTIVE

Details

Estimated Completion Date	Adjudicacion de todos los procesos	**Budget**	0	**Responsible**	Unidad Ejecutora
Completion Date	12/31/2028	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
5	Active	Si se producen fluctuaciones significativas en el tipo de cambio y la inflación, podrían generarse variaciones considerables en los costos de mano de obra, materiales, equipos y suministros, lo que impactaría los presupuestos iniciales de las obras planificadas en más de un 15% respecto de las estimaciones originalmente establecidas	2 - Medium Low	2 - Medium Low	Medium Low	Macroeconomic environment

Details

Associated Outputs	- Casa de máquinas modernizada. - Estudios técnicos de proyectos de inversión desarrollados. - Luminarias LED instaladas. - Obras de captación de agua modernizadas. - Transformadores de potencia y reactores instalados.	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Cost
Associated Outcomes	- Incrementar la eficiencia del parque de alumbrado público gestionado por el ICE - Mejorar la confiabilidad de la red de transmisión - Restablecer la disponibilidad operativa y eficiencia de la planta hidroeléctrica Ventanas-Garitas	**Responsible**	Unidad Ejecutora	**Probability Factors**	Presiones inflacionarias a nivel mundial y efectos de tipo de cambio entre el CRC y USD mantienen la posibilidad de afectaciones, aunque es poco probable que sea superior a las reservas de imprevistos para el programa.
Description of Impact	Los sobrecostos podrían implicar limitación para alcanzar el alcance originalmente planeado.				

Response Actions

0

Response Description	Management Strategy	Status
-	-	-

Details

Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	-
Completion Date		**Funding Source**	-	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
6	Active	Si se imponen restricciones fiscales o se limita la asignación de crédito presupuestario, la disponibilidad de recursos para inversión podría verse afectada, lo que ocasionaría retrasos en el plan de ejecución y renovación de los equipos superiores a 6 meses.	1 - Low	2 - Medium Low	Low	Macroeconomic environment

Details

Associated Outputs	- Casa de máquinas modernizada. - Luminarias LED instaladas. - Obras de captación de agua modernizadas. - Transformadores de potencia y reactores instalados.	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Time
Associated Outcomes	- Incrementar la eficiencia del parque de alumbrado público gestionado por el ICE - Mejorar la confiabilidad de la red de transmisión - Restablecer la disponibilidad operativa y eficiencia de la planta hidroeléctrica Ventanas-Garitas	**Responsible**	Unidad Ejecutora	**Probability Factors**	El ICE está exento de cumplir con la regla fiscal, por lo que la probabilidad está asociada a cambios en la normativa o limitaciones propias de la institución.
Description of Impact	Limitaciones presupuestarias pueden atrasar el ritmo de ejecución y afectar potencialmente el cronograma de salida de operación de plantas generadoras.				

Response Actions

0

Response Description	Management Strategy	Status
-	-	-

Details

Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	-
Completion Date		**Funding Source**	-	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
7	Active	Si durante la ejecución de los contratos de obras, bienes y/o servicios, la instalación y puesta en operación de los equipos y componentes no se realiza conforme a lo planificado y/o con los criterios de calidad establecidos en el cartel, podría requerirse una extensión del plazo de desembolso del Programa superior a 12 meses.	2 - Medium Low	3 - Medium High	Medium High	Scope and planning

Details

Associated Outputs	- Transformadores de potencia y reactores instalados.	**Source of Risk**	Project	**Type of Impact**	- Time - Quality
Associated Outcomes	- Mejorar la confiabilidad de la red de transmisión	**Responsible**	-	**Probability Factors**	Existe historial de atrasos en suministro e instalación de equipos, asi como de atrasos en ejecución de obra complementaria.
Description of Impact	El ritmo de ejecución puede afectar potencialmente el cronograma de salida de operación de plantas generadoras.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	Se fortalecerá el monitoreo de la ejecución de los contratos de obras, bienes y/o servicios implementando una supervisión técnica asociada a esas actividades y a la correcta administración de los contratos, así como monitoreo constante de las herramientas de gestión y planificación del Programa.	MITIGATE	ACTIVE	

Details

Estimated Completion Date	Finalizacion de productos	**Budget**	0	**Responsible**	Unidad Ejecutora y administrador de contrato
Completion Date	12/31/2030	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
8	Materialized	Si el proceso de contratación anticipada de transformadores de potencia y reactores, llevado a cabo por el organismo ejecutor, resulta en la adjudicación a un proveedor de un país no elegible conforme a las políticas del Banco, será necesario identificar otros equipos a financiar y lanzar un nuevo proceso de adquisición conforme las políticas del Banco, lo cual podría retrasar la finalización del componente 2 en aproximadamente 12 meses.	2 - Medium Low	4 - High	Medium High	Scope and planning

Details

Associated Outputs	- Transformadores de potencia y reactores instalados.	**Source of Risk**	Project	**Type of Impact**	- Scope - Time
Associated Outcomes	- Mejorar la confiabilidad de la red de transmisión	**Responsible**	ICE - BID	**Probability Factors**	Aunque es probable que el proceso resulte en una adjudicación que no es elegible, la probabilidad de que esto represente un atraso de 12 meses o más es baja.
Description of Impact	El impacto se considera alto debido a la necesidad de reprogramar indicadores de resultado del componente 2 y al eventual impacto sobre el logro del objetivo de desarrollo si no se identifican productos apropiados para sustituir la compra de transformadores.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	Identificación de productos a ser ejecutados con fondos del programa que puedan ser elegibles, contribuyan al logro de los objetivos de desarrollo del componente 2 y puedan ser ejecutados dentro del plazo original de la operación.	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	firma de contrato de transformadores	**Budget**	0	**Responsible**	ICE
Completion Date	10/1/2026	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
9	Active	Si debido a un eventual incumplimiento del adjudicatario en la entrega de un bien o servicio dentro de los márgenes de calidad establecidos (contractuales o de la normativa internacional aplicable), podría ocurrir que el ICE no pueda recibir o aceptar el bien pactado, lo que generaría demoras de más de 12 meses en la ejecución del Programa.	1 - Low	4 - High	Medium Low	Scope and planning

Details

Associated Outputs	- Casa de máquinas modernizada. - Obras de captación de agua modernizadas. - Transformadores de potencia y reactores instalados.	**Source of Risk**	Project	**Type of Impact**	- Time
Associated Outcomes	- Incrementar la eficiencia del parque de alumbrado público gestionado por el ICE - Mejorar la confiabilidad de la red de transmisión - Restablecer la disponibilidad operativa y eficiencia de la planta hidroeléctrica Ventanas-Garitas	**Responsible**	Unidad Ejecutora	**Probability Factors**	Existen pocos registros de incumplimientos sustanciales de contratistas para los bienes de la operación.
Description of Impact	Debido a las características de los equipos a adquirir, los incumplimientos pueden implicar largos plazos de manufactura y suministro para reponer equipo que incumple estándares.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
0	-	-	-	

Details

Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	-
Completion Date		**Funding Source**	-	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
10	Active	Si se reciben ofertas que no cumplan con los requisitos indicados en los documentos de licitación, se podrían presentar licitaciones infructuosas, lo que ocasionaría demoras de más de 12 meses y sobrecostos significativos.	2 - Medium Low	4 - High	Medium High	Scope and planning

Details

Associated Outputs	- Casa de máquinas modernizada. - Luminarias LED instaladas. - Obras de captación de agua modernizadas. - Transformadores de potencia y reactores instalados.	**Source of Risk**	Project	**Type of Impact**	- Cost - Time
Associated Outcomes	- Incrementar la eficiencia del parque de alumbrado público gestionado por el ICE - Mejorar la confiabilidad de la red de transmisión - Restablecer la disponibilidad operativa y eficiencia de la planta hidroeléctrica Ventanas-Garitas	**Responsible**	Unidad Ejecutora	**Probability Factors**	Existen antecedentes en la operación anterior de licitaciones infructuosas.
Description of Impact	Los procesos infructuosos pueden implicar largos plazos de re-licitación afectando el cronograma de salida de plantas de generación.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status
1	Se implementará solicitudes de información y reuniones tempranas con potenciales oferentes para validar especificaciones	MITIGATE	ACTIVE

Details

Estimated Completion Date	Adjudicacion de todos los procesos	**Budget**	0	**Responsible**	Unidad Ejecutora
Completion Date	12/31/2028	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status
2	Se implementará ferias de proveedores y difusión internacional para ampliar la participación	MITIGATE	ACTIVE

Details

Estimated Completion Date	Adjudicacion de todos los procesos	**Budget**	0	**Responsible**	Unidad Ejecutora
Completion Date	12/31/2028	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status
3	Preparación de estudios de mercado como insumo complementario para la estructuración de los DDL, criterios de calificación y ajustes contractuales.	MITIGATE	ACTIVE

Details

Estimated Completion Date	Adjudicacion de todos los procesos	**Budget**	0	**Responsible**	Unidad Ejecutora
Completion Date	12/31/2028	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

MATERIALIZED RISKS

Issue ID	Issue Description
1	El proceso de contratación anticipada de transformadores de potencia resultó en la adjudicación a un proveedor de un país no elegible conforme a las políticas del Banco

Details

Associated Risk	Si el proceso de contratación anticipada de transformadores de potencia y reactores, llevado a cabo por el organismo ejecutor, resulta en la adjudicación a un proveedor de un país no elegible conforme a las políticas del Banco, será necesario identificar otros equipos a financiar y lanzar un nuevo proceso de adquisición conforme las políticas del Banco, lo cual podría retrasar la finalización del componente 2 en aproximadamente 12 meses.	**Action**	identificación de productos que puedan sustituir los transformadores y que a su vez contribuyan con el segundo objetivo específico de la operación.	**Expected Completion Date**	10/31/2026
Operation Impact	Con base en el taller de arranque se ajustarán los indicadores de resultado del componente 2 para representar apropiadamente los nuevos productos. Se debe validar que la teoría de cambio no se modifica sustancialmente con los nuevos productos.	**Lesson Learned**	Cuando se quiera incorporar procesos de licitaciones anticipadas en una operación se debe considerar desde el inicio otros productos o licitaciones que puedan sustituir la licitación anticipada en caso de que el proceso desarrollado por el organismo ejecutor con base en norma nacional no pueda adjudicarse de conformidad con las políticas del Banco.	**Completion Date**	12/31/2026

EVALUATION TRACKING

Evaluación de Medio Término

Evaluation

Evaluation Methodology as per DEM:	N/A
Current Evaluation Methodology:	Before & After
Stage:	Design
Main Topic of the Intervention:	ENERGY
Other Topics of the Intervention:	
Main Topic of the Evaluation:	ENERGY
Other Topics of the Evaluation:	

No hay cambios respecto a la evaluación planificada en etapa de preparación.

Status of the evaluation:	Active
Expected Date of Final Evaluation Report:	4/30/2032
Responsible:	External
Information on Responsible:	Equipo ejecutor del Programa

Funding

Source of funding:	
Amount in USD (Thousands):	
Code:	
Total amount in USD (Thousands) spent to date in data collection:	40

Comments

3/23/2026	
EMEJIAREYES	

Documents

Stage	Type of document	Name	Document Description	Document Date	Document Number	Document Permissions	Document User

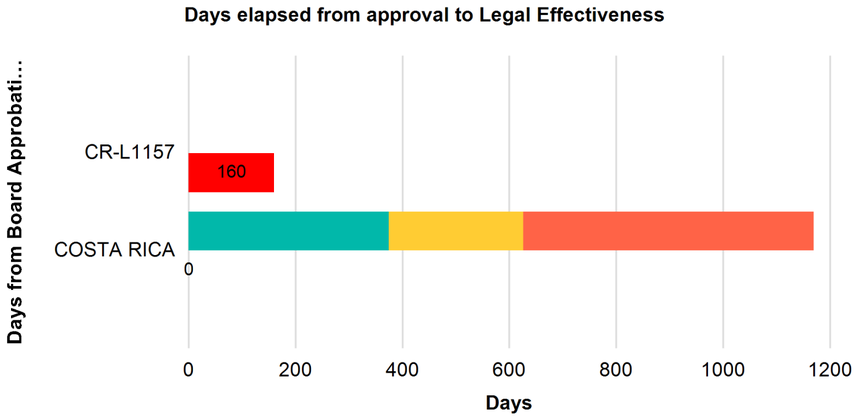
Validation Process

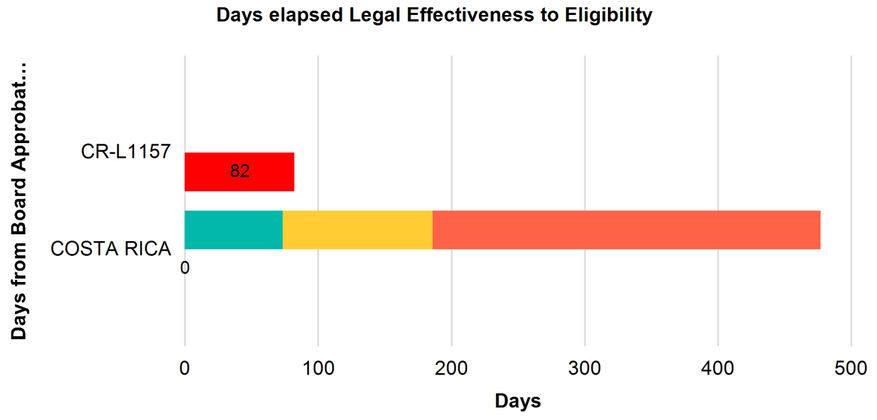
Date	User	Role	Action	Comment	Classification	Workflow
10/02/2026	EMEJIAREYES	Team Leader	Completed by Team Leader		Alert	Progress Monitoring Report September Validation Workflow


MONITORING INDICATORS


Stage 1: From Approval to Eligibility

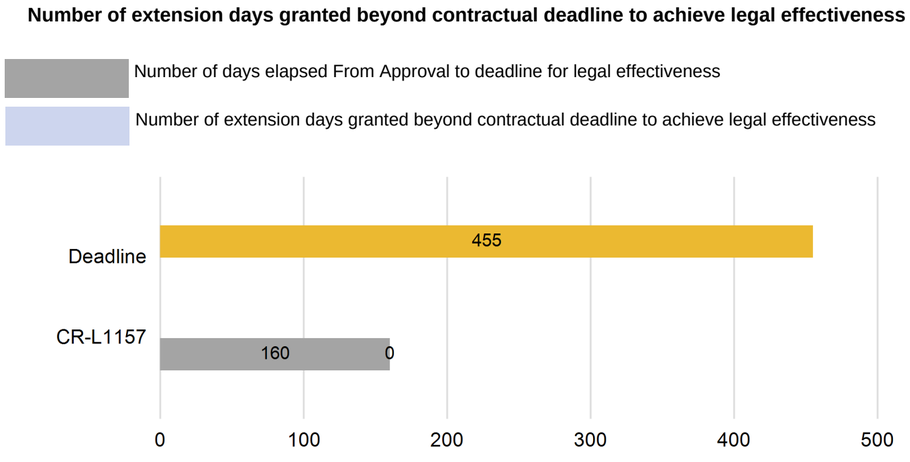
		Benchmark Indicator Value			
Indicator (I)	**Project Indicator Value**	**Satisfactory**	**Alert**	**Problem**	**Traffic Light**
Days elapsed from approval to Legal Effectiveness	160	0 <= I <= 375 days	375 days <= I <= 626.5 days	> 626.5	SATISFACTORY
Days elapsed Legal Effectiveness to Eligibility	82	0 <= I <= 73.28 days	73.28 days <= I <= 186.04 days	> 186.04	ALERT
% of General conditions prior achieved	0 %	N/A	N/A	626.5	For tracking purpose only
% of Special conditions prior achieved	0 %	N/A	N/A	626.5	For tracking purpose only
Number of extension days granted beyond contractual deadline to achieve legal effectiveness - CR-L1157	0	N/A	N/A	626.5	For tracking purpose only
Number of extension days granted beyond contractual deadline to achieve eligibility - CR-L1157	0	N/A	N/A	626.5	For tracking purpose only

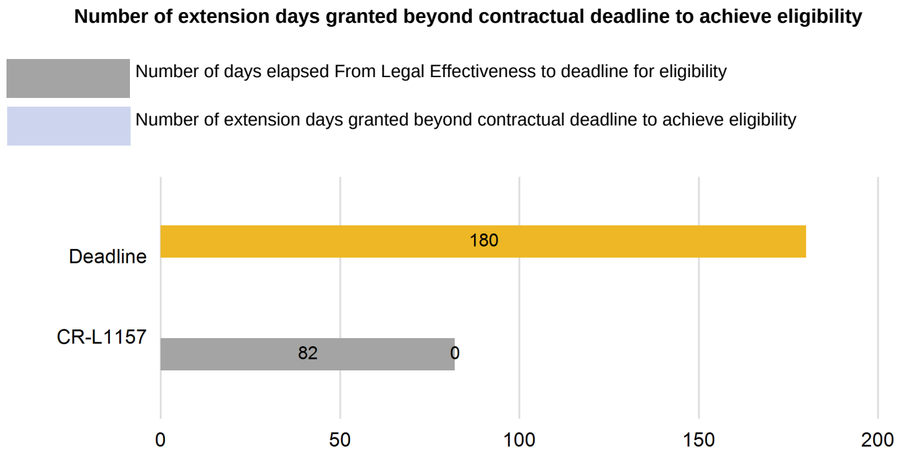

Days elapsed from approval to Legal Effectiveness
Days from Board Approbati...
CR-L1157
160
COSTA RICA
0
0
200
400
600
800
1000
1200
Days


Days elapsed Legal Effectiveness to Eligibility
Days from Board Approbat...
CR-L1157
82
COSTA RICA
0
0
100
200
300
400
500
Days


% of General Conditions Achieved Prior
CR-L1157
0
20
40
60
80
100
% Completed


% of Special Conditions Achieved Prior
CR-L1157
0
20
40
60
80
100
% Completed


Number of extension days granted beyond contractual deadline to achieve legal effectiveness
Number of days elapsed From Approval to deadline for legal effectiveness
Number of extension days granted beyond contractual deadline to achieve legal effectiveness
Deadline
455
CR-L1157
160
0
0
100
200
300
400
500


Number of extension days granted beyond contractual deadline to achieve eligibility
Number of days elapsed From Legal Effectiveness to deadline for eligibility
Number of extension days granted beyond contractual deadline to achieve eligibility
Deadline
180
CR-L1157
82
0
0
50
100
150
200
