CR-J0002

Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables

Préstamo: 5777/GR-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

1.80 PMR

Objetivo

El objetivo general de desarrollo de esta operación, al igual que en la operación asociada, Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia (4871/OC CR), es contribuir a reducir los niveles de homicidios y asaltos en Costa Rica. El objetivo de desarrollo específico de este proyecto es reducir la vulnerabilidad de la población migrante a la violencia, la marginalidad y la discriminación.

Ambiental y social

Categoría
B

Riesgo
Sustancial

Desempeño
Satisfactorio

Líder de Equipo BID

ANA MARIA SAIZ

Equipo Unidad ejecutora

Prestatario

REPUBLICA DE COSTA RICA

Organismo ejecutor

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

Hitos del proyecto

Aprobación	Efectividad	Elegibilidad
10/AUG/2023	05/OCT/2023	24/APR/2024
Primer desembolso	**Último desembolso**	**Extensión: 0 meses**
10/MAY/2024	-	05/APR/2027 (Actual)

Plazo de ejecución

Tiempo total 42 meses



37 meses
05/OCT/2023
Vigencia legal


5 meses
05/APR/2027
Plazo último desembolso vigente

Evolución

Desempeño PMR



Desembolsos y Proyecciones

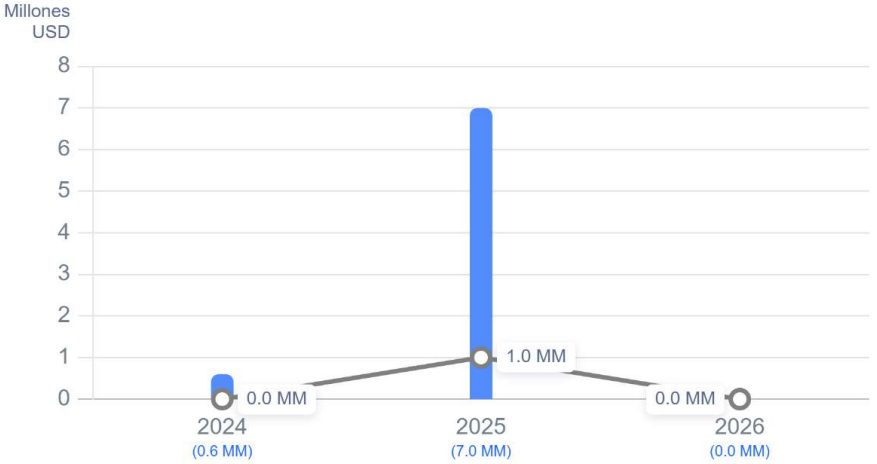

Información financiera

Saldos actuales (MM USD)

	Original	Cancelado	Ajustado	Vigente
BID	20	0	0	20
Local	0	0	0	0
Cofinanciación	0	0	0	0

Avance financiero (monto BID)




38 %
7.600.000 USD

62 %
12.400.000 USD

Desembolsos

Último desembolso realizado	Próximo desembolso proyectado	Mínimo a justificar para nuevo anticipo
22/AUG/2025	30/APR/2027	2.515.577,1 USD

Avance por componente (monto BID)

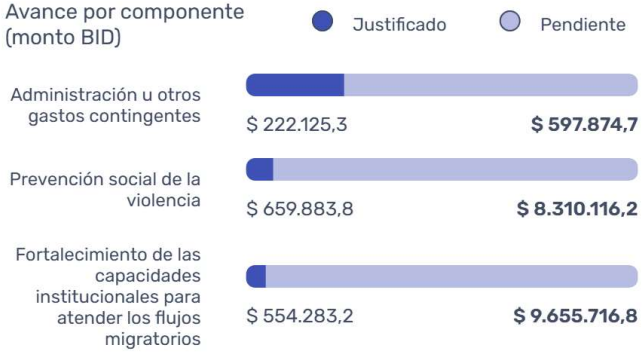

CR-J0002

Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables

Préstamo: 5777/GR-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

1.80 PMR

Información financiera complementaria

Contrapartida local

Monto: 0 (USD)


Justificado	Pendiente
0 %	**0 %**
0 USD	0 USD

PARI PASSU

Desvío -100% = 0 USD

	BID	Local
Contractual	100%	0%
Actual	0%	0%

Desembolsos del año (MM USD)

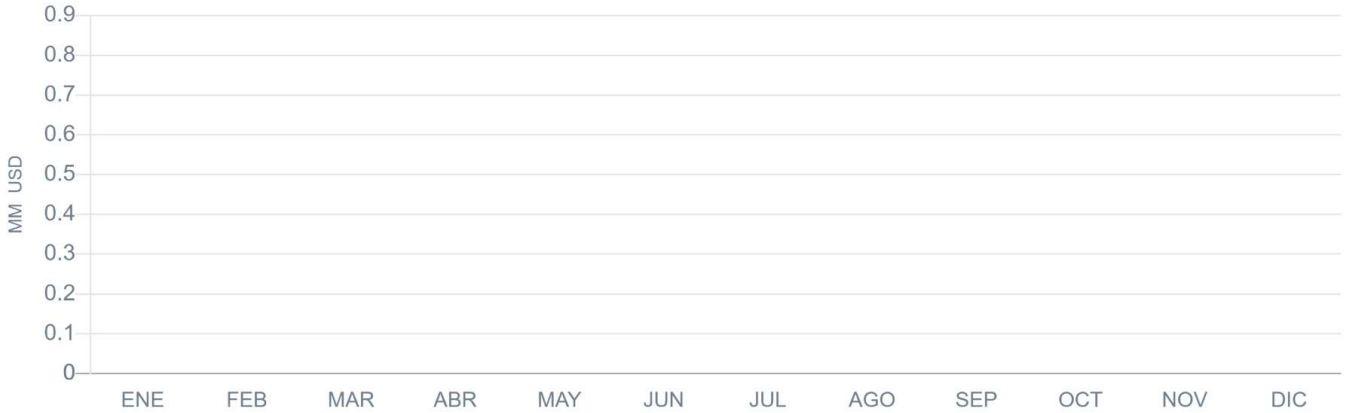

Proyección anual **USD 0** · Desembolsado **0% = USD 0** · Pendiente: **100.00% = USD 0**

Anticipos

Último anticipo realizado

Monto	Fecha	Plan 360
7.000.000 USD	25/AGO/2025	20/AGO/2026

Justificado a la fecha (USD)

Última justificación	Fecha	Saldo de anticipo	% a justificar	Mínimo para nuevo desembolso
844.058,7	09/AGO/2026	6.163.707,7	50 %	2.515.577,1

No Habilitado

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS (EFAS)

Último presentado

Año de vencimiento	Firma Auditora	Vencimiento
2026	Crowe Horwath CR, S.A	30/ABR/2026
Estado	**Fecha de presentación**	**Dictamen**
Publicado	30/ABR/2026	Limpio

Próximo a presentar

Año de vencimiento	Firma Auditora	Vencimiento
2027	-	05/JUL/2027
Estado		
Obligatorio		

CR-J0002

Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables

Préstamo: 5777/GR-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

1.80 PMR

Acuerdos vigentes (1)

Origen del acuerdo	Tema crítico	Descripción del acuerdo	Seguimiento BID	Vencimiento	Último comentario
Revisión de Cartera	Alcance/Cumplimiento de la Matriz de Resultados	El OE y el Banco acordarán una metodología de medición de indicadores (fuente, responsable y cálculo), actividades necesarias para realizar las mediciones y definir un sustituto para indicador de resultado 1.2 (reacciones xenófobas en tweets).	ANA MARIA SAIZ	15/OCT/2026	En la misión de julio 2026 se definieron líneas de acción para esta propuesta, pero aun se encuentra en proceso. 18/SEP/2026 • ALVARO BORBON MUNOZ

CR-J0002

Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables

Préstamo: 5777/GR-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

1.80 PMR

Riesgos

1	3	2	3
Severidad BAJO	Severidad MEDIA BAJA	Severidad MEDIA ALTA	Severidad ALTO

Entorno Económico-Financiero

- Si el límite de gasto que impone la "Regla fiscal", es superado en cada año de ejecución del proyecto, se podría generar la suspensión de los pagos requeridos por el Programa, afectando el cronograma previsto en la operación
- Si las ofertas de construcción y obra son superiores a lo estimado, podría suceder que el presupuesto establecido no sea suficiente, provocando un impacto en las obras por construir.
- Si los pagos necesarios para ejecutar los productos no se pueden incorporar en el ciclo presupuestario oportunamente, se podrían generar ventanas de inactividad para la operación, generando riesgos a nivel operativo, legal y financiero

Entorno macroeconómico

- Si las ofertas de construcción y obra son superiores a lo estimado, podría suceder que el presupuesto establecido no sea suficiente, provocando un impacto en las obras por construir.
- Si los pagos necesarios para ejecutar los productos no se pueden incorporar en el ciclo presupuestario oportunamente, se podrían generar ventanas de inactividad para la operación, generando riesgos a nivel operativo, legal y financiero

Capacidad para operar y mantener los productos del proyecto

- Si los recursos dedicados al mantenimiento son insuficientes, la vida útil de las obras contempladas en el Programa puede verse limitada.

Legislación y regulación

- Si los pagos necesarios para ejecutar los productos no se pueden incorporar en el ciclo presupuestario oportunamente, se podrían generar ventanas de inactividad para la operación, generando riesgos a nivel operativo, legal y financiero

Planificación

- Si la unidad coordinadora estuviera ejecutando varias obras simultáneamente en distintas localidades, la supervisión y gestión oportuna de cada contrato puede verse afectada.

Sostenibilidad

- Si los recursos dedicados al mantenimiento son insuficientes, la vida útil de las obras contempladas en el Programa puede verse limitada.

CR-J0002

Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables

Préstamo: 5777/GR-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

1.80 PMR

Adquisiciones

Clasificación Plan de Adquisiciones

0.96

Estado Actual

Aprobado

Fecha de última no objeción al plan

23/SEP/2026

Procesos con fechas expiradas

2 procesos por USD 126.000

% Compras realizadas

90%

Composición del plan de adquisiciones

Montos totales según estado del proceso y fuente (USD)

Monto BID Aprobado Vigente	**$ 20.000.000**
Monto del plan de adquisiciones	**$ 12.830.042,5**
Procesos contratados	**$ 10.696.682,5**
Contratos en ejecución	$ 10.517.068,5
Contratos finalizados	$ 179.614
Procesos pendientes	**$ 2.133.360**
En proceso	$ 460.000
Previsto	$ 1.673.360
Monto Aporte Local	**$ 0**
Monto del plan de adquisiciones	**$ 0**
Monto sin asignar en el plan de adquisiciones	**$ 0**
Monto Cofinanciamiento	**$ 0**

Avance de los procesos de adquisiciones por producto de la matriz de resultados

Porcentajes del costo por producto — Contratado — Pendiente — Sin asignar en el plan

Componente 1 — 42% | 52%

- Campaña de comunicación contra la xenofobia realizada — 150%
- Programas de formación para la prevención de la trata de personas y tráfico ilegal de migrantes ejecutados — 116%
- Centro de inclusión Social de Mora construido. — 15% | 85%
- Procesos formativos para el fortalecimiento de los Centros Cívicos por la Paz y Casas de Justicia — 51% | 11% | 38%
- Adquisición de vehículos para facilitar la movilización de Centros Cívicos por la Paz y Casas de Justicia — 100%
- Centro Cívico de Upala construido, equipado y en funcionamiento — 90% | 10%

Componente 2 — 16% | 77%

- Unidad de refugio construida, equipada y en funcionamiento — 99%
- Actualización de plataforma tecnológica de la DGME — 105%
- Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes — 23% | 71%
- Ampliación de Centro de atención temporal para personas migrantes construido y equipado (CATEM Sur) — 99%

Componente 3 — 100%

- Administración del proyecto — 100%
- Monitoreo y Evaluación — 100%

CR-J0002

Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables

Préstamo: 5777/GR-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

1.80 PMR

Adquisiciones

Avance de los procesos de adquisiciones por producto de la matriz de resultados

Porcentajes del costo por producto — Contratado — Pendiente — Sin asignar en el plan

Componente 3	100%
Auditorías	100%

CR-J0002

Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables

Préstamo: 5777/GR-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

1.80 PMR

Supervisión

Proyectado vs finalizado

Avance Planificado Avance Real

Productos Críticos

Actividades

Recursos transaccionales para supervisión

Total Gastado

USD 0

Total Comprometido

USD 27.922

Total Disponible

USD 0
