CR-L1137

Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia

Préstamo: 4871/OC-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

2.40 PMR

Objetivo

El objetivo general del proyecto es contribuir a la disminución de los homicidios y asaltos en Costa Rica. Los objetivos específicos son: (i) mejorar la efectividad policial para prevenir el delito en los distritos priorizados; y (ii) reducir los comportamientos delictivos de adolescentes y jóvenes vulnerables a la violencia, en distritos con desventajas concentradas.

Ambiental y social

Categoría
B

Riesgo
Moderado

Desempeño
Insatisfactorio

Líder de Equipo BID

NORMA CONSTANZA PENA ARANGO

Equipo Unidad ejecutora

Prestatario

REPUBLICA DE COSTA RICA

Organismo ejecutor

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

Hitos del proyecto

Aprobación	Efectividad	Elegibilidad
25/SEP/2019	17/MAR/2021	12/MAY/2021
Primer desembolso	**Último desembolso**	**Extensión: 12 meses**
10/DEC/2021	-	17/MAR/2027 (Actual)

Plazo de ejecución

Tiempo total 72 meses

Transcurrido — Pendiente


68 meses	4 meses
17/MAR/2021	**17/MAR/2027**
Vigencia legal	Plazo último desembolso vigente

Evolución

Desempeño PMR — Satisfactorio · Alerta · Problema



Desembolsos y Proyecciones — Proyección original · Monto desembolsado

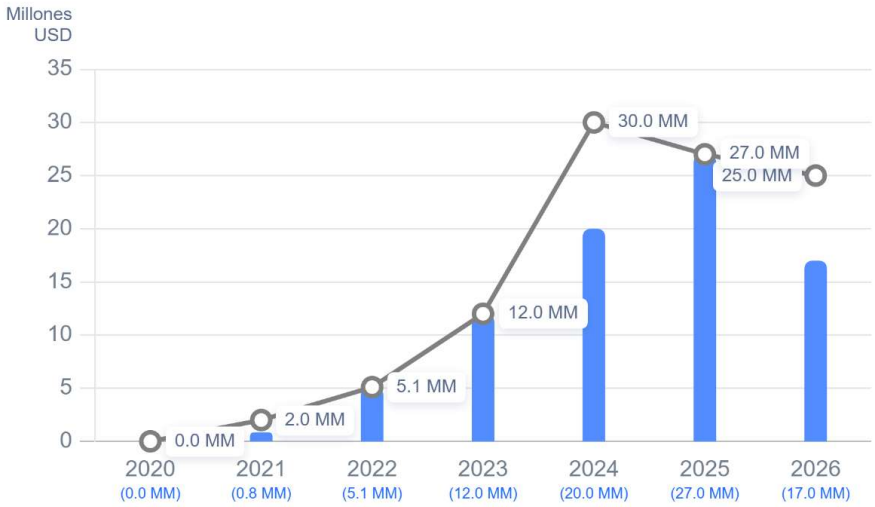

Información financiera

Saldos actuales (MM USD)

	Original	Cancelado	Ajustado	Vigente
BID	100	0	0	100
Local	0	0	0	0
Cofinanciación	0	0	0	0

Avance financiero (monto BID)

Realizado — Pendiente

82 %	18 %
81.923.616,8 USD	18.076.383,2 USD

Desembolsos

Último desembolso realizado	Próximo desembolso proyectado	Mínimo a justificar para nuevo anticipo
05/JUN/2026	30/NOV/2026	0 USD

Avance por componente (monto BID) — Justificado · Pendiente

	Justificado	Pendiente
Administración del Proyecto (incluye evaluaciones y auditorías)	$ 4.044.382,6	**$ 455.617,4**
Componente #1: Efectividad policial	$ 53.767.331,8	**$ 9.232.668,2**
Componente #2: Prevención social de la violencia	$ 23.494.299,4	**$ 9.005.700,6**

CR-L1137

Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia

Préstamo: 4871/OC-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

2.40 PMR

Información financiera complementaria

Contrapartida local

Monto: 0 (USD)


Justificado	Pendiente
0 %	**100 %**
1.252.255,6 USD	-1.252.255,6 USD

PARI PASSU

Desvío 0% = 0 USD

	BID	Local
Contractual	100%	0%
Actual	100%	0%

Desembolsos del año (MM USD)

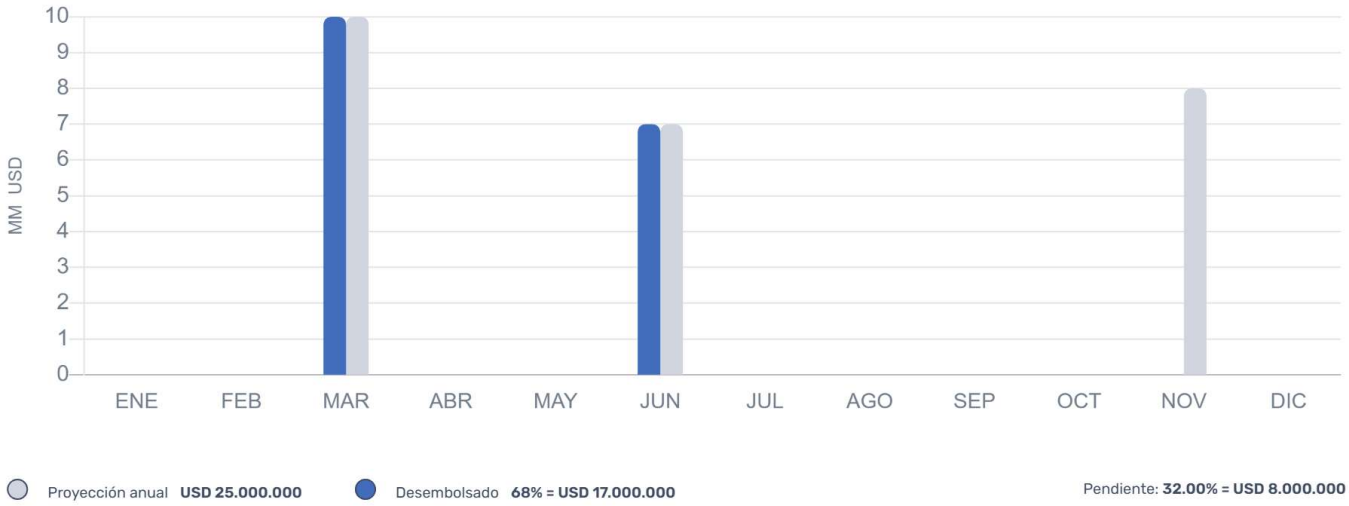

Proyección anual **USD 25.000.000** Desembolsado **68% = USD 17.000.000** Pendiente: **32.00% = USD 8.000.000**

Anticipos

Último anticipo realizado

Monto	Fecha	Plan 150
7.000.000 USD	05/JUN/2026	02/NOV/2026

Justificado a la fecha (USD)

Última justificación	Fecha	Saldo de anticipo	% a justificar	Mínimo para nuevo desembolso
3.681.742,7	30/OCT/2026	617.602,9	80 %	0

Habilitado

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS (EFAS)

Último presentado

Año de vencimiento	Firma Auditora	Vencimiento
2026	CROWE HORWATH CR	30/ABR/2026

Estado	Fecha de presentación	Dictamen
Publicado	30/ABR/2026	Limpio

Próximo a presentar

Año de vencimiento	Firma Auditora	Vencimiento
-	-	-

Estado

-

CR-L1137

Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia

Préstamo: 4871/OC-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

2.40 PMR

Acuerdos vigentes (1)

Origen del acuerdo	Tema crítico	Descripción del acuerdo	Seguimiento BID	Vencimiento	Último comentario
Revisión de Cartera	Alcance/Cumplimiento de la Matriz de Resultados	El OE formalizará el cambio de medición de los indicadores con base en los distritos intervenidos antes de 31 de julio, asegurando que en la próxima reunión de cartera se visualicen los datos.	NORMA CONSTANZA PENA ARANGO	31/JUL/2026	Se presentó la memoria de cálculo y propuesta de modificación de indicadores, la cual está en revisión del banco para formalizarla. 18/SEP/2026 • ALVARO BORBON MUNOZ

CR-L1137

Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia

Préstamo: 4871/OC-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

2.40 PMR

Riesgos

2	2	4	4
Severidad BAJO	Severidad MEDIA BAJA	Severidad MEDIA ALTA	Severidad ALTO

Entorno Económico-Financiero

- Falta de asignación de recursos públicos para el adecuado funcionamiento de los CCP podría afectar el alcance de resultados y la sostenibilidad de las intervenciones de prevención.
- Prórroga en la fecha de terminación de las obras, afectando el Plazo para Desembolsos del Programa.
- Retrasos en la obtención de productos dentro del Plazo para Desembolsos del Programa como consecuencia de solicitudes de información sobre los requisitos de la obra por parte de los oferentes.

Planificación

- Demoras en la ejecución de las obras debido a la complejidad de la realización de múltiples obras simultáneamente en distintas localidades.
- Si se experimentan dificultades para la obtención oportuna de terrenos, el Programa se vería en problemas para cumplir con el plazo máximo para licitar y de adjudicar obras, conforme lo establecido en el Contrato de Préstamo.
- Los recursos dedicados al mantenimiento pueden ser insuficientes, lo cual puede limitar la vida útil de las obras y tecnología contempladas.

Sostenibilidad

- Los recursos dedicados al mantenimiento pueden ser insuficientes, lo cual puede limitar la vida útil de las obras y tecnología contempladas.
- Falta de asignación de recursos públicos para el adecuado funcionamiento de los CCP podría afectar el alcance de resultados y la sostenibilidad de las intervenciones de prevención.

Capacidad para operar y mantener los productos del proyecto

- Los recursos dedicados al mantenimiento pueden ser insuficientes, lo cual puede limitar la vida útil de las obras y tecnología contempladas.

Entorno Institucional

- Si la coordinación interinstitucional no es efectiva, se podrían experimentar problemas para la implementación e institucionalización de los productos.

Entorno Legal

- Si se dieran retrasos por apelaciones en los procesos de licitación, se verían afectados los plazos para la obtención de los productos establecidos en la matriz de resultados.

Legislación y regulación

- Si se dieran retrasos por apelaciones en los procesos de licitación, se verían afectados los plazos para la obtención de los productos establecidos en la matriz de resultados.

CR-L1137

Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia

Préstamo: 4871/OC-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

2.40 PMR

Adquisiciones

Clasificación Plan de Adquisiciones

0.96

Estado Actual

Aprobado

Fecha de última no objeción al plan

21/OCT/2026

Procesos con fechas expiradas

27 procesos por USD 570.800

% Compras realizadas

90%


Composición del plan de adquisiciones

Montos totales según estado del proceso y fuente (USD)

Monto BID Aprobado Vigente	**$ 100.000.000**
Monto del plan de adquisiciones	**$ 105.037.462,1**
Procesos contratados	**$ 94.410.962,1**
Contratos en ejecución	$ 94.091.103,1
Contratos finalizados	$ 319.859,0
Procesos pendientes	**$ 10.626.500**
En proceso	$ 215.000
Previsto	$ 10.411.500
Monto Aporte Local	**$ 0**
Monto del plan de adquisiciones	**$ 0**
Monto sin asignar en el plan de adquisiciones	**$ 0**
Monto Cofinanciamiento	**$ 0**

Avance de los procesos de adquisiciones por producto de la matriz de resultados

Porcentajes del costo por producto — Contratado — Pendiente — Sin asignar en el plan

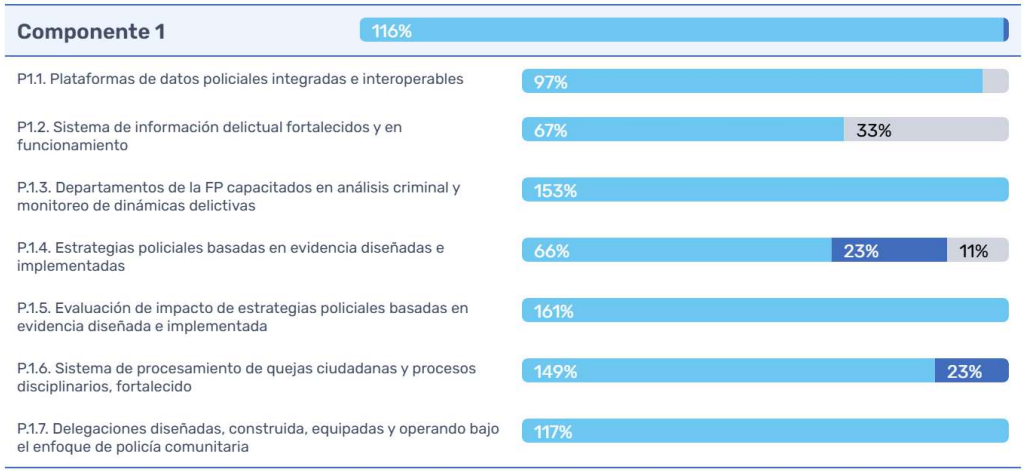



CR-L1137

Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia

Préstamo: 4871/OC-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

2.40 PMR

Adquisiciones

Avance de los procesos de adquisiciones por producto de la matriz de resultados

Porcentajes del costo por producto — Contratado — Pendiente — Sin asignar en el plan

Componente 2	36%	31%	33%
P.2.6. Evaluación de impacto de los CCP diseñada e implementada	16%	32%	52%
P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento	35%	31%	34%

Componente 3	100%
Administración del Proyecto	100%
Auditorías	100%
Monitoreo y Evaluación	100%

CR-L1137

Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia

Préstamo: 4871/OC-CR

Reporte extendido **Cartera Inteligente**

Creación: 03/11/2026

2.40 PMR

Supervisión

Proyectado vs finalizado

Avance Planificado Avance Real

Productos Críticos

Actividades

Recursos transaccionales para supervisión

Total Gastado

USD 15.381

Total Comprometido

USD 101.875

Total Disponible

USD -6.700
