PMR Operational Report

Operation Number	CR-L1156	**Chief of Operations Validation Date**	
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2026	**Division Chief Validation Date**	
Last Update	10/02/26	**Country Representative Validation Date**	
PMR Validation Stage	Completed by Team Leader		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Support for Strengthening and Expanding the National Care System in Costa Rica	**Loan Number**	6017/OC-CR
Executing Agency	MINISTERIO DE HACIENDA	**Sector/Subsector**	SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
Team Leader	JARA MALES, PATRICIA CAROLINA	**Overall Stage**	Signed/Pending Ratification
Operation Type	Loan Operation	**Country**	Costa Rica
Lending Instrument	Policy-Based Financing	**PMR required**	YES
Borrower	REPUBLICA DE COSTA RICA	**Convergence related Operation(s)**	

Events Data

Supervision	
Signature	11/13/25
Ratification	
Legal Effectiveness	
Total Eligibility	
Partial Eligibility	
First Disbursement	
Original Disbursement Expiration	
Current Disbursement Expiration	

Preparation

On pipeline	10/02/24
Start date	10/23/24
PP Approved	01/07/25
PCR Approved	05/14/25
ERM	12/12/24
DLP Approved by OPC	05/21/25
Negotiation	06/03/25
Operation Approved	06/25/25

Objective

Improve the living conditions of care-dependent populations (elderly persons with functional dependency and persons with disabilities with high support needs), as well as the well-being of caregivers, by: (i) strengthening the institutional framework of SINCA through the joint action of its member institutions; and (ii) strengthening the coverage and quality of care services for dependent persons and support for caregivers.

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	N/A
Risk	N/A
Safeguard Performance Rating	
Safeguard Performance Rating - Rationale	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval	

	Total Cost and Source					Available Funds (US$)			
Operations	**Original IDB**	**Current IDB**	**Local Counterpart**	**Co-Financing / Country**	**Total Original Cost**	**Current IDB**	**Disb. Amount to Date**	**% Disbursed**	**Undisbursed Amount**
CR-L1156	250,000,000	250,000,000			250,000,000	250,000,000	-	0.00%	250,000,000
Aggregated	**250,000,000**	**250,000,000**			**250,000,000**	**250,000,000**	-	**0.00%**	**250,000,000**

Development Effectiveness Matrix

Economic Analysis

Undefined	Yes
Cost benefit analysis	No
Cost effectiveness analysis	No
General economic analysis (Economic rate of return)	No

Evaluation

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Undefined	Yes
Random assignment	No
Non-experimental method	No
Ex-post cost benefit analysis	No
Ex-post cost effectiveness analysis	No
Before/after or With/without comparison	No

No Data Available

Printed on: October 14, 2026 5:06:25 PM

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: mejorar las condiciones de vida de las poblaciones dependientes del cuidado(personas mayores con dependencia funcional y personas con discapacidad con altas necesidades de apoyo), así como el bienestar de las personas cuidadoras, por medio de: (i) fortalecimiento de la institucionalidad del SINCA a través de la actuación conjunta de las instituciones que lo conforman; y (ii) Fortalecimiento de la cobertura y calidad de los servicios de atención a la dependencia y de apoyo a los cuidadores.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		EOP 0
1.0	Tasa de pobreza entre personas mayores de 65 años	Porcentaje	20.9	2023	2028	P	18.9
						A	-

Details

Means of Verification: Reporte de evaluación final del proyecto.

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): Yes

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		EOP 0
1.3	Porcentaje de personas cuidadoras con síntomas de depresión	Porcentaje	28	2024	2028	P	25
						A	-

Details

Means of Verification: Encuesta de cuidadoras del BID

Observations: Fabiani, B., Stampini, M., Aranco, N., Benedetti, F., y Ibarrarán, P. (2024). Cuidadoras de personas mayores: sobrecargadas y mal pagadas: evidencia de una encuesta del Banco Interamericano de Desarrollo en América Latina y el Caribe. Versión 1: junio 2024. https://doi.org/10.18235/0013053

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): Yes

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		EOP 0
1.3	Índice de ampliación del acceso a beneficios del SINCA por condición de dependencia severa*	Porcentaje	0	2024	2028	P	50
						A	-

Details

Means of Verification: Reporte de evaluación final del proyecto.

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	Yes	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		EOP 0
1.4	Aumento en la cobertura de los beneficios del SINCA entre personas con dependencia severa y en situación de pobreza	Puntos porcentuales	0	2024	2028	P	20
						A	-

Details

Means of Verification: Reporte de evaluación final del proyecto.

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	Yes	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Fortalecer la institucionalidad del SINCA a través de la actuación conjunta de las instituciones que la conforman.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2028	EOP 0
1.0	Porcentaje de baremos aplicados a través de módulo en SINIRUBE que cumple con los criterios de calidad definidos por la Secretaría Técnica del SINCA	Porcentaje	0	2024	P	-	-
					A	-	-

Details

Means of Verification: Informe de supervisión realizado por la Secretaría Técnica del SINCA

Observations: Se incluirá un reporte específico sobre baremos aplicados en territorios indígenas en el marco del Modelo Intercultural.

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	Yes	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2028	EOP 0
1.3	Porcentaje de las personas baremadas a través del SINIRUBE que cuentan con una clasificación de riesgo de vulnerabilidad a amenazas ambientales, definida por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).	Porcentaje	0	2024	P	-	90
					A	-	-

Details

Means of Verification: Reporte de GEOSINIRUBE

Observations: Es un portal de georeferenciación, alojado en la plataforma del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado que permitirá tener acceso a información sobre cuáles hogares viven en zonas de amenazas naturales y las condiciones de vulnerabilidad que estos poseen.

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No

IF Contribution	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2028	EOP 0
1.4	Porcentaje de cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de Acción (2024-2026) de la Política Nacional de Cuidados (PNC).	Porcentaje	0	2024	P	-	80
					A	-	-

Details

Means of Verification: Informe de cumplimiento del Plan de Acción (2024- 2026) de la Política Nacional de Cuidados (PNC) realizado por la ST

Observations: Si bien hubo un Plan de acción para el periodo 2021-2024, las instituciones responsables no han reportado en su totalidad información que permita a la Secretaría Técnica del SINCA generar un informe de cumplimiento del periodo; y el Plan 2024-2026 fue oficializado en octubre el 2024, por lo cual no se cuenta con información sobre su avance.

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	Indigenous people-related	No	Afrodescendats-related	No	Persons with disabilities-related	No	LGBTQ+ individuals-related	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2028	EOP 0
1.5	Número de los servicios y beneficios del catálogo de servicios de cuidados del SINCA que se gestionan mediante la ventanilla única	Numero	0	2025	P	-	6
					A	-	-

Details

Means of Verification: Reporte de asignación de beneficios y servicios mediante ventanilla única, realizado por SINIRUBE

Observations: La Ventanilla única es más amplia, pero para estos efectos se consideran estos servicios y beneficios: IMAS (Atención a familias; mejoramiento de vivienda); CONAPDIS (Modalidad residencial, Asistente personal); CONAPAM (Hogar de larga estancia, Abandono, Red Cuido).

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	Indigenous people-related	No	Afrodescendats-related	No	Persons with disabilities-related	No	LGBTQ+ individuals-related	No
IF Contribution									

Specific Development Objectives Nbr. 2: Fortalecimiento de la cobertura y calidad de los servicios de atención a la dependencia y de apoyo a los cuidadores

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2028	EOP 0
2.0	Número de mujeres cuidadoras de personas adultas en situación de dependencia severa en situación de pobreza, que cuentan con una transferencia para reconocimiento del trabajo no remunerado	Numero	2518	2024	P	-	4,800
					A	-	-

Details

Means of Verification: Reporte de asignación del Motivo 7 de Atención a familias, emitido por IMAS

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	Yes	Indigenous people-related	No	Afrodescendats-related	No	Persons with disabilities-related	No	LGBTQ+ individuals-related	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2028	EOP 0
2.3	Número de hombres cuidadores de personas adultas en situación de dependencia severa en situación de pobreza, que cuentan con una transferencia para reconocimiento del trabajo no remunerado	Numero	829	2024	P	-	1,200
					A	-	-

Details

Means of Verification: Reporte de asignación del Motivo 7 de Atención a familias, emitido por IMAS

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	Yes	Indigenous people-related	No	Afrodescendats-related	No	Persons with disabilities-related	No	LGBTQ+ individuals-related	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2028	EOP 0
2.4	Número de personas que acceden al Hub Digital para el Autocuidado.	Numero	0	2024	P	-	2,000
					A	-	-

Details

Means of Verification: Reporte de la plataforma Cuidar.cr

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	Indigenous people-related	No	Afrodescendats-related	No	Persons with disabilities-related	No	LGBTQ+ individuals-related	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2028	EOP 0
2.5	Número de personas cuidadoras informales que activan su acreditación para acceso preferencial a instituciones públicas (QR).	Numero	0	2024	P	-	2,000
					A	-	-

Details

Means of Verification: Reporte de la plataforma Cuidar.cr

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	Indigenous people-related	No	Afrodescendats-related	No	Persons with disabilities-related	No	LGBTQ+ individuals-related	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2028	EOP 0
2.6	Número de personas cuidadoras formales inscritas en el sitio cuidar.cr.	Numero	0	2024	P	-	1,000
					A	-	-

Details

Means of Verification: Reporte de la plataforma Cuidar.cr

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	Indigenous people-related	No	Afrodescendats-related	No	Persons with disabilities-related	No	LGBTQ+ individuals-related	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2028	EOP 0
2.7	Porcentaje Organizaciones de Bienestar Social (OBS) que brindan servicios de cuidados que han mejorado la calidad de sus servicios como resultado de la fiscalización.	Porcentaje	0	2024	P	-	10
					A	-	-

Details

Means of Verification: Reportes de Departamento de Acción Social y Administración de Instituciones (DASAI)

Observations:

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	Indigenous people-related	No	Afrodescendats-related	No	Persons with disabilities-related	No	LGBTQ+ individuals-related	No
IF Contribution									

RESULTS MATRIX

OUTPUTS PHYSICAL PROGRESS

Component Nbr. 1: Componente 1. Estabilidad macroeconómica

	Output	Unit of Measure		2024	2025	2026	2027	2028	EOP 0
1.1	1.1.1. Marco económico consistente con los objetivos del programa y la Carta de Política Sectorial.	Informe	P	1	0	0	0	0	1
			P (a)	1	0	0	0	0	1
			A	1	0	-	-	-	1

Details

Means of Verification:

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

Component Nbr. 2: Componente 2: Gobernanza, financiamiento e inteligencia de datos para la articulación del sistema de cuidados

	Output	Unit of Measure		2024	2025	2026	2027	2028	EOP 0
2.1	2.1.1. Promoción de la eficiencia y reducción de las brechas de cobertura en las poblaciones de interés SINC), a través de una estimación de costos y proyección de gastos para distintos escenarios de cobertura y glosas presupuestarias identificadas como inversión en cuidados	Dos documentos	P	1	1	0	0	0	2
			P (a)	1	1	0	0	0	1
			A	1	0	-	-	-	1

Details

Means of Verification:

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

2.2

Output	Unit of Measure		2024	2025	2026	2027	2028	EOP 0
2.2.1. Fortalecimiento del sistema de valoración de la dependencia para la asignación de beneficios	Dos documentos	P	0	2	0	0	0	2
		P (a)	0	2	0	0	0	0
		A	0	0	-	-	-	0

Details

Means of Verification:

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**			

2.3

Output	Unit of Measure		2024	2025	2026	2027	2028	EOP 0
2.3.1. Desarrollo y aprobación del mecanismo de monitoreo del Plan de Acción de la Política Nacional de Cuidados 2024-2026 que permita dar seguimiento a la ejecución de compromisos sectoriales y facilite la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas contenidas en el Plan.	Mecanismo de monitoreo	P	0	1	0	0	0	1
		P (a)	0	1	0	0	0	0
		A	0	0	-	-	-	0

Details

Means of Verification:

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**			

2.4

Output	Unit of Measure		2024	2025	2026	2027	2028	EOP 0
2.4.1. Diseño de un módulo de cuidados de larga duración a ser incluido en una encuesta nacional por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)	Modulo de cuidados	P	1	0	0	0	0	1

2.4.1. Diseño de un módulo de cuidados de larga duración a ser incluido en una encuesta nacional por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)	Modulo de cuidados	P (a)	1	0	0	0	0	1
		A	1	0	-	-	-	1

Details

Means of Verification:

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

2.5

Output	Unit of Measure		2024	2025	2026	2027	2028	EOP 0
2.5.1. Fortalecimiento del sistema de interoperabilidad para facilitar el acceso de los usuarios a los servicios para la atención de la dependencia y apoyo a los cuidados	Sistema de interoperabilidad	P	0	1	0	0	0	1
		P (a)	0	1	0	0	0	0
		A	0	0	-	-	-	0

Details

Means of Verification:

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	Yes	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

Component Nbr. 3: Componente 3: Fortalecimiento de la oferta de servicios y prestación de atención a la dependencia

3.1

Output	Unit of Measure		2024	2025	2026	2027	2028	EOP 0
3.1.1. Introducción de un modelo inclusivo de focalización que amplie el acceso a la protección social del estado	Modelo inclusivo de focalización1	P	1	1	0	0	0	2
		P (a)	1	1	0	0	0	2

3.1.1. Introducción de un modelo inclusivo de focalización que amplie el acceso a la protección social del estado	Modelo inclusivo de focalización1	A	1	1	-	-	-	2

Details

Means of Verification:

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2024	2025	2026	2027	2028	EOP 0
3.2	3.2.1. Reconocimiento y apoyo a los cuidados informaleslite el acceso preferencial en trámites con instituciones públicas	Tres documentos	P	2	1	0	0	0	3
			P (a)	2	1	0	0	0	2
			A	2	0	-	-	-	2

Details

Means of Verification:

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2024	2025	2026	2027	2028	EOP 0
3.3	3.3.1. Integración de los servicios de apoyo a los cuidados mediante un portal con diseño inclusivo que facilite la comunicación, transacciones y gestiones para proveedores y usuarios de los servicios de cuidados	Portal con diseño inclusivo	P	1	0	0	0	0	1
			P (a)	1	0	0	0	0	1
			A	1	0	-	-	-	1

Details

Means of Verification:

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2024	2025	2026	2027	2028	EOP 0
3.4	3.4.1. Aseguramiento de la capacidad del sistema para el funcionamiento continuo y eficaz de la valoración de la dependencia	Dos documentos	P	1	1	0	0	0	2
			P (a)	1	1	0	0	0	1
			A	1	0	-	-	-	1

Details

Means of Verification:

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	Yes	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2024	2025	2026	2027	2028	EOP 0
3.5	3.5.1. Mejoramiento de la calidad de la atención que ofrecen Organizaciones de Bienestar Social (OBS) dedicadas al cuidado de larga duración	Plan Nacional de Fiscalización de OBS	P	0	1	0	0	0	1
			P (a)	0	1	0	0	0	0
			A	0	0	-	-	-	0

Details

Means of Verification:

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2024	2025	2026	2027	2028	EOP 0
3.6	3.6.1. Promoción de la autonomía económica de mujeres en condición de pobreza y vulnerabilidad	Dos documentos	P	0	2	0	0	0	2
			P (a)	0	2	0	0	0	0
			A	0	0	-	-	-	0

Details

Means of Verification:

Gender-related	Yes	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

OUTPUTS FINANCIAL PROGRESS

Other Costs

Total Costs

CORPORATE INDICATORS

IF INDICATORS

No Information available for the section.

Change Matrix

No information available for the section

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Status of the Implementation

La operación está a la espera de ser ratificada por la Asamblea Legislativa en Costa Rica. Este proceso se ha visto retrasado debido al cambio de Gobierno.

Likelihood of Achieving Development Objectives

High	La operación sigue teniendo una relevancia importante para el partido oficialista y el país, por lo cual, por el momento el retraso por cambio de gobierno solo implicaría un retraso en la fecha de ratificacion. La COF sigue monitoreando el avance del proyecto en la corriente legislativa, y mientras tanto el sector sigue ejecutando productos relevantes mediante la CT CR-T1295.

Lesson Learned

Category	Lesson Learned	Entered in System

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
1	Active	Debido al cambio de gobierno a realizarse durante este año 2026, la ratificación de la operación podrían atrasarse más allá de lo previsto incluso extendiéndose para el 2027.	3 - Medium High	3 - Medium High	High	Political stability

Details

Associated Outputs		**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	
Associated Outcomes		**Responsible**	-	**Probability Factors**	-
Description of Impact	-				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
0	-	-	-	

Details

Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	-
Completion Date		**Funding Source**	-	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
2	Active	Si hay demoras en la aprobación que deben dar distintas instituciones autónomas adscritas al SINCA para ejecutar medidas incluidas en el programa de reformas, podría ponerse en riesgo la concreción oportuna de algunos compromisos.	2 - Medium Low	2 - Medium Low	Medium Low	Rule of law

Details

Associated Outputs		**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	
Associated Outcomes		**Responsible**	-	**Probability Factors**	-
Description of Impact	-				

Response Actions

0

Response Description	Management Strategy	Status
-	-	-

Details

Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	-
Completion Date		**Funding Source**	-	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
3	Active	Si por motivo del cambio de administración derivado del propio del ciclo político se producen demoras en la ejecución de algunas medidas, se podría afectar la finalización de las reformas en la segunda fase.	1 - Low	4 - High	Medium Low	Rule of law

Details

Associated Outputs		**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	
Associated Outcomes		**Responsible**	-	**Probability Factors**	-
Description of Impact	-				

Response Actions

0

Response Description	Management Strategy	Status
-	-	-

Details

Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	-
Completion Date		**Funding Source**	-	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
4	Inactive	Si hay un posible mal funcionamiento del baremo, componente estructural del sistema de valoración de la dependencia, podría introducir distorsiones en el mecanismo de asignación de beneficios sociales.	2 - Medium Low	4 - High	Medium High	Technical Design

Details

Associated Outputs		**Source of Risk**	Project	**Type of Impact**	
Associated Outcomes		**Responsible**	-	**Probability Factors**	-
Description of Impact	-				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
0	-	-	-	

Details

Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	-
Completion Date		**Funding Source**	-	**Status Description**	-

MATERIALIZED RISKS

EVALUATION TRACKING

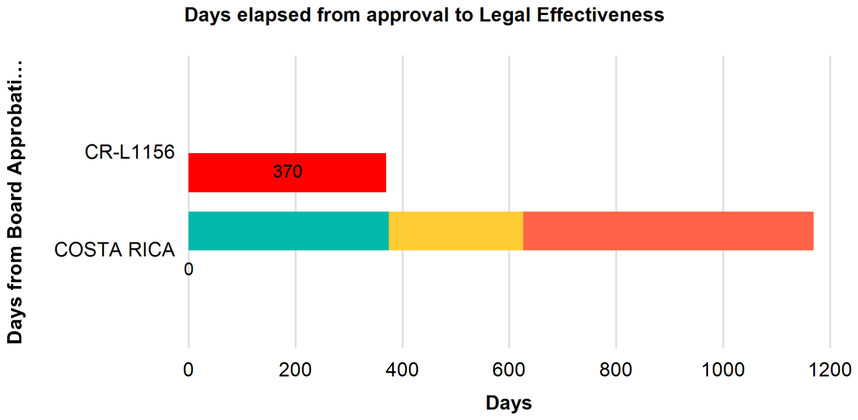
Validation Process

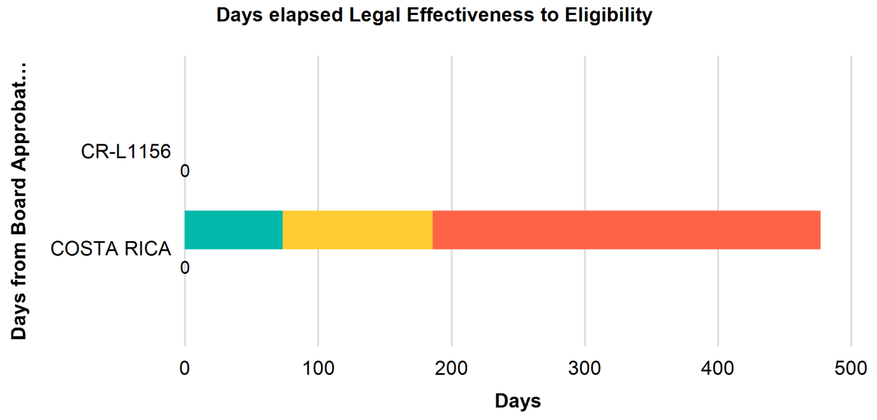
Date	User	Role	Action	Comment	Workflow
10/02/2026	pjaramales	Team Leader	Completed by Team Leader		Progress Monitoring Report September Validation Workflow


MONITORING INDICATORS


Stage 1: From Approval to Eligibility

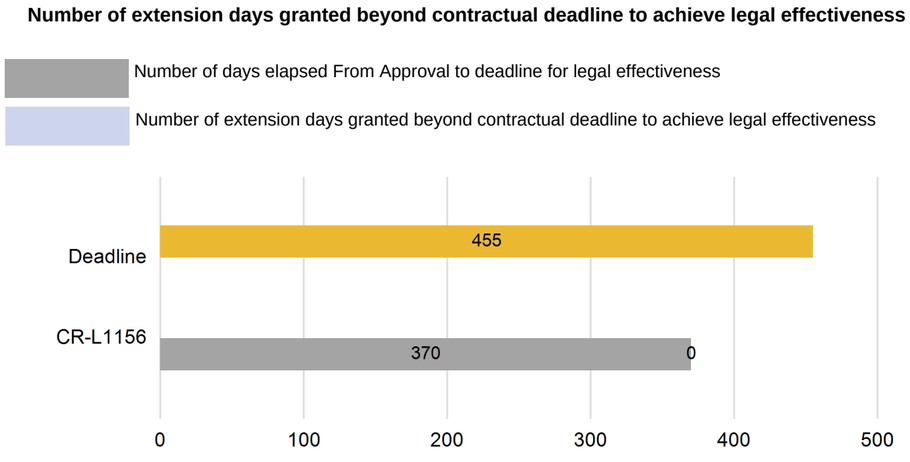
		Benchmark Indicator Value			
Indicator (I)	**Project Indicator Value**	**Satisfactory**	**Alert**	**Problem**	**Traffic Light**
Days elapsed from approval to Legal Effectiveness	370	0 <= I <= 375 days	375 days <= I <= 626.5 days	> 626.5	For tracking purpose only
Days elapsed Legal Effectiveness to Eligibility	0	0 <= I <= 73.28 days	73.28 days <= I <= 186.04 days	> 186.04	For tracking purpose only
% of General conditions prior achieved	0 %	N/A	N/A	626.5	For tracking purpose only
% of Special conditions prior achieved	0 %	N/A	N/A	626.5	For tracking purpose only
Number of extension days granted beyond contractual deadline to achieve legal effectiveness - CR-L1156	0	N/A	N/A	626.5	For tracking purpose only
Number of extension days granted beyond contractual deadline to achieve eligibility - CR-L1156	0	N/A	N/A	626.5	For tracking purpose only

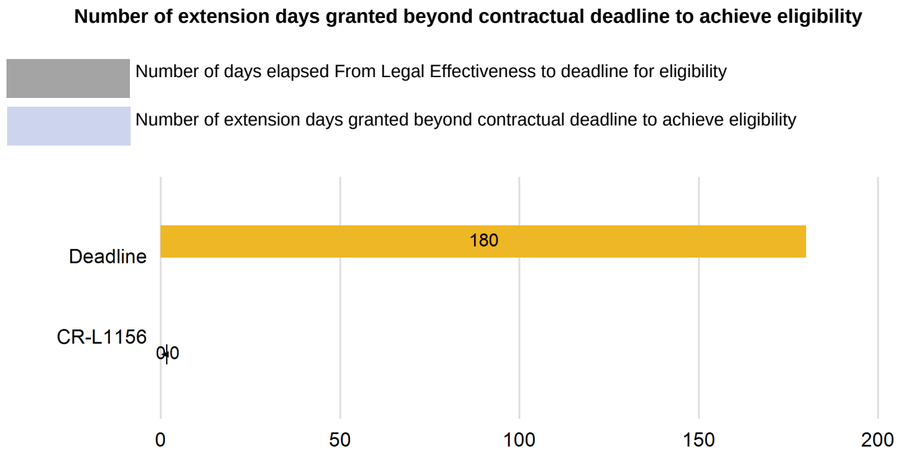

Days elapsed from approval to Legal Effectiveness
Days from Board Approbati...
CR-L1156
370
COSTA RICA
0
0
200
400
600
800
1000
1200
Days


Days elapsed Legal Effectiveness to Eligibility
Days from Board Approbat...
CR-L1156
0
COSTA RICA
0
0
100
200
300
400
500
Days


% of General Conditions Achieved Prior
CR-L1156
0
20
40
60
80
100
% Completed


% of Special Conditions Achieved Prior
CR-L1156
0
20
40
60
80
100
% Completed


Number of extension days granted beyond contractual deadline to achieve legal effectiveness
Number of days elapsed From Approval to deadline for legal effectiveness
Number of extension days granted beyond contractual deadline to achieve legal effectiveness
Deadline
455
CR-L1156
370
0
0
100
200
300
400
500


Number of extension days granted beyond contractual deadline to achieve eligibility
Number of days elapsed From Legal Effectiveness to deadline for eligibility
Number of extension days granted beyond contractual deadline to achieve eligibility
Deadline
180
CR-L1156
0
0
50
100
150
200
