PMR Operational Report

Operation Number	CR-L1137	**Chief of Operations Validation Date**	
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2026	**Division Chief Validation Date**	
Last Update	10/02/26	**Country Representative Validation Date**	
PMR Validation Stage	Completed by Team Leader		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Citizen Security and Violence Prevention Program	**Loan Number**	4871/OC-CR
Executing Agency	MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ	**Sector/Subsector**	SOCIAL INVESTMENT-CITIZEN SAFETY
Team Leader	POSADAS, ARNALDO ENRIQUE	**Overall Stage**	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	**Country**	Costa Rica
Lending Instrument	Investment Loan	**PMR required**	YES
Borrower	REPUBLICA DE COSTA RICA	**Convergence related Operation(s)**	

Events Data

Supervision

Signature	03/17/20
Ratification	
Legal Effectiveness	03/17/21
Total Eligibility	05/12/21
Partial Eligibility	05/12/21
First Disbursement	12/10/21
Original Disbursement Expiration	03/17/26
Current Disbursement Expiration	03/17/27

Preparation

On pipeline	08/07/18
Start date	
PP Approved	11/19/18
ERM	09/27/18
POD Approved	07/15/19
DLP Approved by OPC	07/29/19
Negotiation	08/29/19
Operation Approved	09/25/19

Objective

The general objective of the program is to help reduce homicides and assaults in Costa Rica. The specific objectives are: (i) to improve the effectiveness of policing to prevent crime in the priority districts; and (ii) to reduce criminal behavior among adolescents and young people who are susceptible to violence in highly disadvantaged districts.

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	**Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?**	NO
Risk	Substantial	**Date of approval**	
Safeguard Performance Rating	Unsatisfactory		
Safeguard Performance Rating - Rationale	La operación fue determinada como de riesgo moderado, por tanto, no tenía supervisión de ESG. Sin embargo, el jefe de Equipo informó al Guidance Service que el 25 de marzo se presentó un accidente fatal en uno de los proyectos, por tanto, la operación se recalifica a riesgo sustancial, y de conformidad con los protocolos de supervisión establecidos, se determina que a causa del suceso indicado el desempeño es insatisfactorio.		

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

	Total Cost and Source					Available Funds (US$)			
Operations	**Original IDB**	**Current IDB**	**Local Counterpart**	**Co-Financing / Country**	**Total Original Cost**	**Current IDB**	**Disb. Amount to Date**	**% Disbursed**	**Undisbursed Amount**
CR-L1137	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	81,923,616.76	81.92%	18,076,383.24
Aggregated	**100,000,000**	**100,000,000**	**0**	**0**	**100,000,000**	**100,000,000**	**81,923,616.76**	**81.92%**	**18,076,383.24**

Development Effectiveness Matrix


Economic Analysis

Undefined	No
Cost benefit analysis	Yes
Cost effectiveness analysis	No
General economic analysis (Economic rate of return)	No

Evaluation

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Undefined	Yes
Random assignment	No
Non-experimental method	No
Ex-post cost benefit analysis	No
Ex-post cost effectiveness analysis	No
Before/after or With/without comparison	No

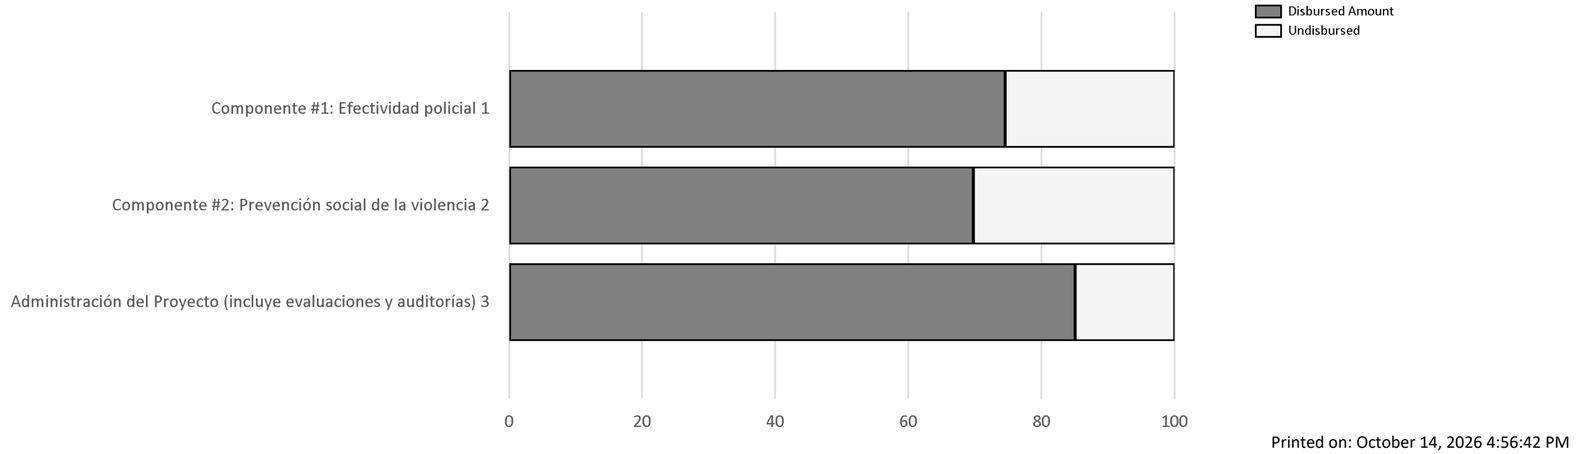

Printed on: October 14, 2026 4:56:42 PM

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Contribuir a la disminución de los homicidios en Costa Rica

Observation: La línea de base es cambiada para recoger el promedio de la tasa de homicidios por cien mil habitantes, a nivel nacional, registrada entre los años 2016 y 2020. Por otra parte, la meta es cambiada tomando en cuenta el trabajo de proyecciones de este crimen que ha elaborado el Ministerio de Seguridad Pública (MSP). Con el cambio de línea de base se busca reflejar la evolución de este crimen durante los años anteriores al comienzo del Programa, en vez de fijarla con relación a un año en particular (2017) como se presentó originalmente. En cuanto al cambio en la meta de este indicador, con este se busca responder con más precisión tanto a las condiciones propias del país (tal como se perfila en las proyecciones del MSP que no existían al momento del diseño), así como reconocer el efecto que la pandemia COVID-19 ha tenido sobre la tasa de homicidio en el país (circunstancia tampoco prevista durante el diseño del Programa).

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		EOP 2027
0.0	I.1 Homicidios en Costa Rica	Crime information systems (#)	11.6	2016	2026	P	11.2
						A	-

Details

Means of Verification: Memorias del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)/Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Observations: La línea de base es cambiada en el Taller de Arranque para recoger el promedio de la tasa de homicidios por cien mil habitantes, a nivel nacional, registrada entre los años 2016 y 2020. Por otra parte, la meta es cambiada tomando en cuenta el trabajo de proyecciones de este crimen que ha elaborado el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): Yes

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

General Development Objectives Nbr. 1: Contribuir a la disminución de asaltos en Costa Rica

Observation: La línea de base resulta del promedio de la tasa de asaltos por cien mil habitantes, a nivel nacional, registrada entre los años 2015 y 2019. Igualmente, la meta se cambia tomando en cuenta la proyección que sobre estos crímenes realizó el MSP con posterioridad al diseño del Programa. Con el cambio de línea de base se busca reflejar la evolución de este crimen durante los años anteriores al comienzo del Programa, en vez de fijarla con relación a un año en particular (2017) como se presentó originalmente. En cuanto al cambio en la meta de este indicador, con este se busca responder con más precisión a: (i) las condiciones propias del país, tal como se perfila en las proyecciones de delitos elaboradas por el MSP, las cuales que no existían al momento del diseño y prevén un aumento en la incidencia de este tipo de delitos (en promedio la proyección para los próximos 10 años es de 321,5 asaltos por cada cien mil habitantes); y (ii) reconocer el efecto que la pandemia COVID-19 ha tenido sobre la tasa de asaltos en el país (circunstancia tampoco prevista durante el diseño del Programa). La meta planteada propone una reducción e incluso reversión de la tendencia prevista.

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		EOP 2027
1.0	I.2 Asaltos en Costa Rica	Tasa (# de asaltos/100.000 habitantes)	298.6	2015	2026	P	278.7
						A	-

Details

Means of Verification: Memorias del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)/Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)

Observations: La línea de base resulta del promedio de la tasa de asaltos por cien mil habitantes, a nivel nacional, registrada entre los años 2015 y 2019. Igualmente, la meta se cambia tomando en cuenta la proyección que sobre estos crímenes realizó el MSP con posterioridad al diseño del Programa.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): Yes

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: 1. Reducción de homicidios y asaltos en los distritos priorizados

Observation: R.1.1. Para la línea de base se utiliza la sumatoria por año de la cantidad de homicidios en los distritos priorizados y la sumatoria de la población de esos distritos para cada año (entre los años 2016 y 2020). R.1.2 Para la línea de base se utiliza la sumatoria por año de la cantidad de asaltos en los distritos priorizados y la sumatoria de la población de esos distritos para cada año (2015-2019). En ambos casos (R.1.1 y R.1.2) los cambios de línea de base buscan reflejar la evolución del crimen en los distritos priorizados durante los años anteriores al comienzo del Programa (en vez de fijarla con relación a un año en particular (2017) como se presentó originalmente). En cuanto a los cambios en la metas de estos indicadores, con ellos se busca responder con más precisión tanto a las condiciones propias del país (tal como se perfila en las proyecciones del Ministerio de Seguridad Pública que no existían al momento del diseño y que prevén un incrementeo en los próximos 10 años), así como reconocer el efecto que la pandemia COVID-19 ha tenido sobre la tasas criminales en el país (circunstancia tampoco prevista durante el diseño del Programa). Las metas planteadas proponen una reducción (e incluso reversión) de las tendencias previstas. Adicionalmente, los ajustes de las metas toman en cuenta que los efectos del programa van a irse manifestando durante el período de ejecución y podrán seguirse observando luego de terminado el financiamiento (temporalidad de las intervenciones).

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2026	2027	EOP 2027
0.0	R.1.1 Homicidios en distritos priorizados	Tasa (# de homicidios/100.00 0 habitantes)	16.4	2016	P	15.2	-	-	15.2
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Memorias del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)/Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)

Observations: Se utiliza la sumatoria por año de la cantidad de homicidios en los distritos priorizados y la sumatoria de la población de esos distritos para cada año.

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution								

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2026	2027	EOP 2027
0.1	R.1.2 Asaltos en distritos priorizados	Tasa (# de asaltos / 100.000 habitantes)	399.2	2015	P	366.8	-	-	366.8
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Memorias del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)/Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)

Observations: Se utiliza la sumatoria por año de la cantidad de asaltos en los distritos priorizados y la sumatoria de la población de esos distritos para cada año.

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution								

Specific Development Objectives Nbr. 1: 2. Reducción de comportamientos delictivos de adolescentes y jóvenes vulnerables a la violencia que participan en los CCP.

Observation: El indicador R.2.2 se refiere al promedio que en el total de menores aprehendidos en el país representan los menores residentes en las áreas de influencia de los Centros Cívicos por la Paz. Con el cambio de la línea de base se substituye el dato a nivel nacional que se consideró temporalmente durante el diseño. En vez de ello se establece un promedio de la cantidad de aprehensiones reportadas durante el período 2015-2019 (en los 10 distritos que serán el área de influencia de los CCP) en relación con el promedio nacional del mismo grupo etario. Por otra parte, la meta es substituida pasando de un 45% a un 30% para reflejar más precisamente las condiciones del país y el hecho de que los CCPs solo estarán funcionando plenamente durante los últimos años del período de ejecución del programa.

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2026	2027	EOP 2027
1.0	R.2.1 Exclusión escolar (fuera del sistema educativo) de jóvenes entre 12 y 17 años que participan en los CCP	%	7.2	2017	P	3.5	-	-	3.5
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Estadísticas del Ministerio de Educación Pública

Observations: Provisionalmente se incluye la línea de base nacional, que se actualizará al arranque para reflejar la línea de base en las áreas de intervención del programa. El estudio experimental para Check and Connect, muestra que el porcentaje de estudiantes que permaneció inscrito en la escuela se incrementó en 29% (Sinclair, et al.,1998). Una evaluación con diseño experimental con un seguimiento de 4 años soporta la evidencia encontrada en el estudio anterior sobre el efecto del programa en la deserción escolar (Sinclair et al., 2005). Según datos preliminares del Ministerio de Educación Pública (MEP) la exclusión escolar entre 2015 y 2017 en educación secundaria bajó de 14% a 10,3% en colegios donde opera el Programa "Yo me Apunto", sugiriendo una reducción de 3,7 puntos porcentuales. La meta final se calculó restando la disminución de la exclusión escolar reportada por el MEP en colegios "Yo me Apunto" (3,7%) a la línea base (7,2%), lo resulta en una meta de 3,5%.

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution								

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2026	2027	EOP 2027
1.1	R.2.2 Proporción de aprehensiones de jóvenes menores de edad en los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz con respecto al total país.	%	13.43	2015	P	9.4	-	-	9.4
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Dirección General de la Fuerza Pública

Observations: El indicador se refiere al promedio que en el total de menores aprehendidos en el país representan los menores residentes en las áreas de influencia de los Centros Cívicos por la Paz.

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No

IF Contribution	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS PHYSICAL PROGRESS

Component Nbr. 1: Componente 1: Efectividad policial

	Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
1.1	P1.1. Plataformas de datos policiales integradas e interoperables	# of agencies	P	0	0	0	0	1	0	0	-	1
			P (a)	0	0	0	0	0	0	0	1	1
			A	0	0	0	0	0	0	0	-	0

Details

Means of Verification: Informes Semestrales (UCP). El producto se integró con el producto 1.8 Centro de Mando. Su cumplimiento se reportará en conjunto con dicho producto. Los gastos a partir de 2025 se reportarán en el producto 1.8.

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution	2.10 Agencies and private sector organizations with strengthened digital capacity (C)				**Strategic Alignment**				

Disaggregation			**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Agencies with strengthened digital technology capacity	P	0	0	0	0	1
		P (a)	0	0	0	0	1
		A	0	0	0	0	0

1.2

2025	2026	2027	EOP 2027
0	0	-	1
0	1	-	1
-	-	-	0

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
P1.2. Sistema de información delictual fortalecidos y en funcionamiento	# of agencies	P	0	0	0	0	1	0	0	-	1
		P (a)	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		A	0	0	0	0	0	0	0	-	0

Details

Means of Verification: Informes Semestrales (UCP). El producto se integró con el producto 1.8 Centro de Mando. Su cumplimiento se reportará en conjunto con dicho producto. Los gastos a partir de 2025 se reportarán en el producto 1.8

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution	2.10 Agencies and private sector organizations with strengthened digital capacity (C)				**Strategic Alignment**				

Disaggregation			2020	2021	2022	2023	2024
	Agencies with strengthened digital technology capacity	P	0	0	0	1	0
		P (a)	0	0	0	1	0
		A	0	0	0	0	0

1.3

1.4

2025	2026	2027	EOP 2027
0	0	-	1
0	1	-	1
-	-	-	0

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
P.1.3. Departamentos de la FP capacitados en análisis criminal y monitoreo de dinámicas delictivas	# de departamentos	P	0	0	0	0	16	0	0	-	16
		P (a)	0	0	0	0	0	0	0	-	29
		A	0	0	0	29	0	0	0	-	29

Details

Means of Verification: Informes Semestrales (UCP).

Gender-related	No	Indigenous people-related	No	Afrodescendats-related	No	Persons with disabilities-related	No	LGBTQ+ individuals-related	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
P.1.4. Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas	# of agencies	P	0	0	0	0	0	1	0	-	1
		P (a)	0	0	0	0	0	1	1	-	1
		A	0	0	0	0	0	0	0	-	0

Details

Means of Verification: Informes Semestrales (UCP).

Gender-related	No	Indigenous people-related	No	Afrodescendats-related	No	Persons with disabilities-related	No	LGBTQ+ individuals-related	No
IF Contribution	2.11 Agencies with strengthened, transparent and accountable domestic resource mobilization, expenditure management, and policy management capacity (C)				**Strategic Alignment**				

Disaggregation			2020	2021	2022	2023	2024
	Agencies with strengthened digital technology capacity	P	0	0	0	0	1
		P (a)	0	0	0	0	1
		A	0	0	0	0	0

1.5

1.6

2025	2026	2027	EOP 2027
0	0	-	1
1	0	-	1
-	-	-	0

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
P.1.5. Evaluación de impacto de estrategias policiales basadas en evidencia diseñada e implementada	Evaluación	P	0	0	0	0	0	1	0	-	1
		P (a)	0	0	0	0	0	1	1	-	1
		A	0	0	0	0	0	0	0	-	0

Details

Means of Verification: nformes Semestrales (UCP).

Gender-related	No	Indigenous people-related	No	Afrodescendats-related	No	Persons with disabilities-related	No	LGBTQ+ individuals-related	No
IF Contribution					Strategic Alignment				

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
P.1.6. Sistema de procesamiento de quejas ciudadanas y procesos disciplinarios, fortalecido	# of agencies	P	0	0	0	0	1	0	0	-	1
		P (a)	0	0	0	0	0	1	1	-	1
		A	0	0	0	0	0	0	0	-	0

Details

Means of Verification: nformes Semestrales (UCP).

Gender-related	No	Indigenous people-related	No	Afrodescendats-related	No	Persons with disabilities-related	No	LGBTQ+ individuals-related	No
IF Contribution	2.11 Agencies with strengthened, transparent and accountable domestic resource mobilization, expenditure management, and policy management capacity (C)				Strategic Alignment				

	Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
1.7	P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria	Subnational governments (#)	P	0	0	0	4	7	10	14	-	35
			P (a)	0	0	0	2	6	2	4	6	17
			A	0	0	0	1	5	1	5	-	12

Details

Means of Verification: nformes Semestrales (UCP).

Gender-related		**Indigenous people-related**		**Afrodescendats-related**		**Persons with disabilities-related**		**LGBTQ+ individuals-related**	
IF Contribution				**Strategic Alignment**					

Milestone				**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**EOP 2027**
	Delegaciones Policiales diseñadas	Subnational governments (#)	P	0	0	4	7	10	14	0	-	35
			P (a)	0	0	4	11	11	1	0	-	21
			A	0	0	5	11	5	0	0	-	21
	Delegaciones Policiales construidas equipadas y operando	Subnational governments (#)	P	0	0	0	4	7	10	14	-	35
			P (a)	0	0	0	2	6	2	4	6	17
			A	0	0	0	1	5	1	5	-	12

Disaggregation		**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Delegaciones Policiales que atienden poblaciones indígenas en su área de influencia (Turrialba, Buenos Aires, Puerto Viejo de Talamanca)	P	0	0	0	0	0
	P (a)	0	0	0	0	0
	A	0	0	0	0	0

1.8

2025	2026	2027	EOP 2027
1	2	-	3
1	2	-	3
-	-	-	0

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
Centro de Mando y Control Policial (CMCP) diseñado, construido, equipado y en funcionamiento	Número	P	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		P (a)	-	-	-	-	-	0	0	1	1
		A	0	0	0	0	0	0	0	-	0

Details

Means of Verification:

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

Component Nbr. 2: Componente 2: Prevención social de la violencia

2.1	
2.2	

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
P.2.1. Modelo de atención de los CCP actualizado, fortalecido, y en funcionamiento en los CCPs de la red	# of agencies	P	0	0	0	0	0	1	0	-	1
		P (a)	0	0	0	0	0	0	1	-	1
		A	0	0	0	0	0	0	0	-	0

Details

Means of Verification: nformes Semestrales (UCP).

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution	2.11 Agencies with strengthened, transparent and accountable domestic resource mobilization, expenditure management, and policy management capacity (C)				**Strategic Alignment**				

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
P.2.2. Modelo de gestión de los CCP homologado, fortalecido y en funcionamiento en los CCPs de la red	# of agencies	P	0	0	0	0	0	1	0	-	1
		P (a)	0	0	0	0	0	0	1	-	1
		A	0	0	0	0	0	0	0	-	0

Details

Means of Verification: nformes Semestrales (UCP).

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution	2.11 Agencies with strengthened, transparent and accountable domestic resource mobilization, expenditure management, and policy management capacity (C)				**Strategic Alignment**				

2.3

2.4

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
P.2.3. Municipalidades y grupos de sociedad civil capacitados y utilizando las nuevas competencias adquiridas en prevención de violencia	#	P	0	0	3	4	4	4	0	-	15
		P (a)	0	0	3	4	4	4	0	-	15
		A	0	0	1	6	4	4	0	-	15

Details

Means of Verification: nformes Semestrales (UCP).

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
P.2.4. Estrategia de comunicación social de los CCP, diseñada e implementada	# of agencies	P	0	0	0	0	1	0	0	-	1
		P (a)	0	0	0	0	1	0	0	-	1
		A	0	0	0	0	1	0	0	-	1

Details

Means of Verification: nformes Semestrales (UCP).

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution	2.11 Agencies with strengthened, transparent and accountable domestic resource mobilization, expenditure management, and policy management capacity (C)				**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
2.5	P.2.5. Sistema de información integrado de los CCP, desarrollado e implementado	# of agencies	P	0	0	0	0	1	0	0	-	1
			P (a)	0	0	0	0	0	1	1	-	1
			A	0	0	0	0	0	0	0	-	0

Details

Means of Verification: nformes Semestrales (UCP).

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution	2.10 Agencies and private sector organizations with strengthened digital capacity (C)				**Strategic Alignment**				

Disaggregation			2020	2021	2022	2023	2024
	Agencies with strengthened digital technology capacity	P	0	0	0	0	1
		P (a)	0	0	0	0	1
		A	0	0	0	0	0

2.6

2025	2026	2027	EOP 2027
0	0	-	1
1	0	-	1
-	-	-	0

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
P.2.6. Evaluación de impacto de los CCP diseñada e implementada	Evaluación	P	0	0	0	0	0	1	0	-	1
		P (a)	0	0	0	0	0	0	1	-	1
		A	0	0	0	0	0	0	0	-	0

Details

Means of Verification: nformes Semestrales (UCP).

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

2.7

OUTPUTS FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1: Componente 1: Efectividad policial

Component revised cost: 119,834,530

1.1

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento	Centros Cívicos	P	0	0	0	0	1	3	4	-	8
		P (a)	0	0	0	0	3	2	1	4	8
		A	0	0	0	0	1	2	1	-	4

Details

Means of Verification: nformes Semestrales (UCP).

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

Milestone				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
	CCPs diseñados	Centros Cívicos	P	0	0	1	0	3	4	0	-	8
			P (a)	0	0	1	4	2	2	0	-	8
			A	0	0	2	4	0	2	0	-	8
	CCPs construidos, equipados y en funcionamiento	Centros Cívicos	P	0	0	0	0	1	3	4	-	8
			P (a)	0	0	0	0	3	2	1	4	8
			A	0	0	0	0	1	2	1	-	4
	Techados de Skate Parks Garabito y Santa Cruz construidos	Centros Cívicos	P	0	0	0	2	0	0	0	-	2
			P (a)	0	0	0	2	1	0	0	-	2
			A	0	0	0	1	1	0	0	-	2

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
P1.1. Plataformas de datos policiales integradas e interoperables	# of agencies	P	0	0	0	64,891	693,120	0	0	-	758,011

1.2

1.3

P1.1. Plataformas de datos policiales integradas e interoperables	# of agencies	P (a)	0	0	0	195,000	255,976	0	0	-	224,656.16
		A	0	0	17,510	4,680	202,466.16	0	0	-	224,656.16

Details

Means of Verification: Informes Semestrales (UCP). El producto se integró con el producto 1.8 Centro de Mando. Su cumplimiento se reportará en conjunto con dicho producto. Los gastos a partir de 2025 se reportarán en el producto 1.8.

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator	2.10 Agencies and private sector organizations with strengthened digital capacity (C)				**Strategic Alignment**				

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
P1.2. Sistema de información delictual fortalecidos y en funcionamiento	# of agencies	P	0	0	0	67,500	2,979,157	57,800	0	-	3,104,457
		P (a)	0	0	0	0	4,680	0	0	-	23,360
		A	0	0	17,510	4,680	1,170	0	0	-	23,360

Details

Means of Verification: Informes Semestrales (UCP). El producto se integró con el producto 1.8 Centro de Mando. Su cumplimiento se reportará en conjunto con dicho producto. Los gastos a partir de 2025 se reportarán en el producto 1.8

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator	2.10 Agencies and private sector organizations with strengthened digital capacity (C)				**Strategic Alignment**				

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
P.1.3. Departamentos de la FP capacitados en análisis criminal y monitoreo de dinámicas delictivas	# de departamentos	P	0	0	0	13,500	220,500	66,000	0	-	300,000
		P (a)	0	0	0	151,348	62,513	0	0	-	140,489.6
		A	0	0	34,226.5	96,930.59	9,332.51	0	0	-	140,489.6

Details

Means of Verification: Informes Semestrales (UCP).

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

1.4

1.5

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
P.1.4. Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas	# of agencies	P	0	0	36,068	442,733	977,900	146,300	0	-	1,603,001
		P (a)	0	0	36,068	129,352	59,013	683,150.38	806,934.43	-	1,399,764.24
		A	0	0	34,226.5	83,796.67	164,071.05	310,735.59	242,643.82	-	835,473.63

Details

Means of Verification: Informes Semestrales (UCP).

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator	2.11 Agencies with strengthened, transparent and accountable domestic resource mobilization, expenditure management, and policy management capacity (C)				**Strategic Alignment**				

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
P.1.5. Evaluación de impacto de estrategias policiales basadas en evidencia diseñada e implementada	Evaluación	P	0	0	0	0	94,167	55,833	0	-	150,000
		P (a)	0	0	0	0	10,000	52,848.33	43,162.5	-	130,000
		A	0	0	0	0	18,375	68,462.5	10,800	-	97,637.5

Details

Means of Verification: nformes Semestrales (UCP).

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

1.6

1.7

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
P.1.6. Sistema de procesamiento de quejas ciudadanas y procesos disciplinarios, fortalecido	# of agencies	P	0	0	0	40,000	144,450	65,550	0	-	250,000
		P (a)	0	0	0	42,990	50,813	331,486	132,506.09	-	365,000
		A	0	0	3,510	18,580	59,200	151,203.91	44,753.04	-	277,246.95

Details

Means of Verification: nformes Semestrales (UCP).

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator	2.11 Agencies with strengthened, transparent and accountable domestic resource mobilization, expenditure management, and policy management capacity (C)				**Strategic Alignment**				

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria	Subnational governments (#)	P	0	0	1,890,878	5,454,037	16,701,808	20,600,459	12,187,349	-	56,834,531
		P (a)	0	0	1,890,878	8,434,713.27	22,340,305	12,762,870.76	16,810,687.62	6,661,621.79	56,834,530
		A	0	0	400,247	4,173,815.45	13,528,670.97	15,259,487.17	12,836,195.66	-	46,198,416.25

Details

Means of Verification: nformes Semestrales (UCP).

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

Milestone				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
	Delegaciones Policiales diseñadas	Subnational governments (#)	P	-	-	-	-	-	-	-	-	4,840,000
			P (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	4,840,000
			A	-	-	-	-	-	-	-	-	986,570.54
	Delegaciones Policiales construidas equipadas y operando	Subnational governments (#)	P	-	-	-	-	-	-	-	-	51,994,531
			P (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	51,994,530
			A	-	-	-	-	-	-	-	-	45,211,845.71

1.8

Component Nbr. 2: Componente 2: Prevención social de la violencia

Component revised cost: 64,095,000

2.1

2.2

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
Centro de Mando y Control Policial (CMCP) diseñado, construido, equipado y en funcionamiento	Número	P	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		P (a)	-	-	-	-	-	607,500	2,247,328.85	719,443.75	3,882,200
		A	0	0	0	0	0	915,427.4	1,583,816.33	-	2,499,243.73

Details

Means of Verification:

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
P.2.1. Modelo de atención de los CCP actualizado, fortalecido, y en funcionamiento en los CCPs de la red	# of agencies	P	0	0	28,350	105,025	105,850	60,775	0	-	300,000
		P (a)	0	0	28,350	10,000	63,200	232,413.63	228,649.42	-	353,000
		A	0	0	0	4,578.73	29,506.28	90,265.57	55,564.52	-	179,915.1

Details

Means of Verification: nformes Semestrales (UCP).

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator	2.11 Agencies with strengthened, transparent and accountable domestic resource mobilization, expenditure management, and policy management capacity (C)				**Strategic Alignment**				

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
P.2.2. Modelo de gestión de los CCP homologado, fortalecido y en funcionamiento en los CCPs de la red	# of agencies	P	0	0	8,540	78,226	44,203	14,031	0	-	145,000
		P (a)	0	0	8,540	4,320	10,000	46,125	141,855	-	141,855

2.3

2.4

P.2.2. Modelo de gestión de los CCP homologado, fortalecido y en funcionamiento en los CCPs de la red	# of agencies	A	0	0	0	0	0	0	0	-	0

Details

Means of Verification: nformes Semestrales (UCP).

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator	2.11 Agencies with strengthened, transparent and accountable domestic resource mobilization, expenditure management, and policy management capacity (C)				**Strategic Alignment**				

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
P.2.3. Municipalidades y grupos de sociedad civil capacitados y utilizando las nuevas competencias adquiridas en prevención de violencia	#	P	0	0	12,482	26,790	33,513	24,715	0	-	97,500
		P (a)	0	0	12,482	23,335.75	26,558	21,428	22,748.16	-	97,495
		A	0	0	4,709.25	27,998	19,254.59	22,785	6,300	-	81,046.84

Details

Means of Verification: nformes Semestrales (UCP).

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
P.2.4. Estrategia de comunicación social de los CCP, diseñada e implementada	# of agencies	P	0	0	0	18,696	38,652	17,652	0	-	75,000
		P (a)	0	0	0	13,800	41,620	42,501.75	56,653	-	101,393
		A	0	0	1,013	11,372	14,685	17,670	1,440	-	46,180

Details

Means of Verification: nformes Semestrales (UCP).

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator	2.11 Agencies with strengthened, transparent and accountable domestic resource mobilization, expenditure management, and policy management capacity (C)				**Strategic Alignment**				

2.5

2.6

2.7

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
P.2.5. Sistema de información integrado de los CCP, desarrollado e implementado	# of agencies	P	0	0	7,500	68,000	12,000	0	0	-	87,500
		P (a)	0	0	7,500	32,600	20,950	96,086	77,492.5	-	109,170
		A	0	0	0	0	0	31,677.5	68,037.5	-	99,715

Details

Means of Verification: nformes Semestrales (UCP).

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator	2.10 Agencies and private sector organizations with strengthened digital capacity (C)				**Strategic Alignment**				

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
P.2.6. Evaluación de impacto de los CCP diseñada e implementada	Evaluación	P	0	0	0	0	40,000	160,000	0	-	200,000
		P (a)	0	0	0	28,200	30,887.5	12,060	91,087	-	102,087
		A	0	0	0	5,912.5	1,925	3,162.5	2,887.5	-	13,887.5

Details

Means of Verification: nformes Semestrales (UCP).

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

Output	Unit of Measure		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento	Centros Cívicos	P	0	0	867,990	4,802,982	5,855,235	11,354,034	8,714,759	-	31,595,000
		P (a)	0	0	867,990	5,657,555.69	10,800,000	11,867,703.99	7,250,463.69	3,853,062.96	31,595,000

Other Costs

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Cost
Administración del Proyecto	P	-	40,237	735,413	1,076,248	985,441	934,094	138,567	-	3,910,000
	P (a)	-	40,237	775,650	971,930	1,079,631.88	1,139,001.88	598,437.22	-	4,276,500
	A	-	12,699.83	703,887.85	959,108.91	1,031,586.55	970,779.64	136,359.4	-	3,814,422.18
Monitoreo y Evaluación	P	-	-	15,943	111,793	85,314	208,918	43,032	-	465,000
	P (a)	-	-	15,943	-	25,000	25,000	94,000	30,000	165,000
	A	-	-	-	-	-	41,000	12,000	-	53,000
Auditorías	P	-	-	25,000	25,000	25,000	50,000	-	-	125,000
	P (a)	-	-	25,000	6,000	15,000	15,000	15,000	7,500	58,500
	A	-	-	-	6,000	15,000	15,000	15,000	-	51,000

Total Costs

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Cost
Total Cost	P	-	40,237	3,628,164	12,395,421	29,036,310	33,816,161	21,083,707	-	100,000,000
	P (a)	-	40,237	3,668,401	15,701,144.71	34,896,147.38	27,935,175.72	28,617,005.48	11,271,628.5	100,000,000
	A	-	12,699.83	1,420,221.1	7,507,730.85	22,701,331.68	28,469,382.56	17,348,147.92	-	77,459,513.94

P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento	Centros Cívicos	A	0	0	203,381	2,110,278	7,606,088.57	10,571,725.78	2,332,350.15	-	22,823,823.5

Details

Means of Verification: nformes Semestrales (UCP).

Gender-related		**Indigenous people-related**		**Afrodescendats-related**		**Persons with disabilities-related**		**LGBTQ+ individuals-related**	
IF indicator				**Strategic Alignment**			

Milestone				**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**EOP 2027**
	CCPs diseñados	Centros Cívicos	P	-	-	-	-	-	-	-	-	2,300,000
			P (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	2,300,000
			A	-	-	-	-	-	-	-	-	980,795.38
	CCPs construidos, equipados y en funcionamiento	Centros Cívicos	P	-	-	-	-	-	-	-	-	28,565,000
			P (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	28,565,000
			A	-	-	-	-	-	-	-	-	21,217,345.53
	Techados de Skate Parks Garabito y Santa Cruz construidos	Centros Cívicos	P	-	-	-	-	-	-	-	-	730,000
			P (a)	-	-	-	-	-	-	-	-	730,000
			A	-	-	-	-	-	-	-	-	625,682.59

CORPORATE INDICATORS

IF INDICATORS

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Categories	EOP 2027
1	2.10 Agencies and private sector organizations with strengthened digital capacity	# of agencies	0	2016	P	3
					P (a)	3
					A	-

Details

Means of Verification: Informe de progreso basados en información del MJP

Observations: Este indicador se relaciona con el P.2.5. Sistema de información integrado de los CCP, desarrollado e implementado, cuyo cumplimiento está proyectado para el 2025. Este sistema estará siendo utilizado por los CCP's, Digepaz y Vicepaz, además, recogerá información de las instituciones que forman parte de los Centros Cívicos, a saber: PANI, MCJ, CPJ, etc. En los informes de progreso se incluirá a la UCP el número de instituciones que han hecho uso del sistema y las personas de estas instituciones que se capacitaron para utilizarlo.

Change Matrix

Section	Name	Reasons	Related Documents	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System	Agreed with Execution Agency
Output	P.1.4. Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas	Se actualiza la relación con el indicador corporativo según el IF.	N/A	Modify contribution IF indicator	Flag contribution to IF indicator	ROSINAH	9/30/2026	
Output	P.1.6. Sistema de procesamiento de quejas ciudadanas y procesos disciplinarios, fortalecido	Se actualiza la relación con el indicador corporativo según el IF.	N/A	Modify contribution IF indicator	Flag contribution to IF indicator	ROSINAH	9/30/2026	
Output	P.2.1. Modelo de atención de los CCP actualizado, fortalecido, y en funcionamiento en los CCPs de la red	Se actualiza la relación con el indicador corporativo según el IF.	N/A	Modify contribution IF indicator	Flag contribution to IF indicator	ROSINAH	9/30/2026	
Output	P.2.2. Modelo de gestión de los CCP homologado, fortalecido y en funcionamiento en los CCPs de la red	Se actualiza la relación con el indicador corporativo según el IF.	N/A	Modify contribution IF indicator	Flag contribution to IF indicator	ROSINAH	9/30/2026	
Output	P.2.4. Estrategia de comunicación social de los CCP, diseñada e implementada	Se actualiza la relación con el indicador corporativo según el IF.	N/A	Modify contribution IF indicator	Flag contribution to IF indicator	ROSINAH	9/30/2026	
Output	P.2.5. Sistema de información integrado de los CCP, desarrollado e implementado	Se actualiza la relación con el indicador corporativo según el IF.	N/A	Modify contribution IF indicator	Flag contribution to IF indicator	ROSINAH	9/30/2026	
Output	P1.1. Plataformas de datos policiales integradas e interoperables	Se actualiza la relación con el indicador corporativo según el IF.	N/A	Modify contribution IF indicator	Flag contribution to IF indicator	ROSINAH	9/30/2026	
Output	P1.2. Sistema de información delictual fortalecidos y en funcionamiento	Se actualiza la relación con el indicador corporativo según el IF.	N/A	Modify contribution IF indicator	Flag contribution to IF indicator	ROSINAH	9/30/2026	

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Status of the Implementation

Al 30 de junio de 2026 se han desembolsado USD $81,9 millones (81,9% del préstamo), incluido un anticipo de USD $7 millones recibido en junio 2026; se estima solicitar el siguiente desembolso en noviembre 2026. En el primer semestre 2026 se entregaron al MSP las delegaciones policiales (DP) de Hatillo, Abangares, Nicoya, Batán y San Ramón, para un total de 12 de 17 DP. La DP Desamparados Norte concluyó su construcción y se entregó en julio 2026; las DP Turrialba y Pococí presentan 81% y 82% de avance al cierre del periodo (finalizadas en agosto 2026). Las DP Limón y El Roble de Puntarenas están en etapa de diseño (anteproyecto y primera entrega) con inicio de obra programado para Q3-2026. El Centro de Mando y Control Policial (CMCP) presenta avance físico de 87% global (obras finalizaron, está pendiente el equipamiento tecnológico) con plazo a marzo 2027. Se formalizó ante el Banco las prioridades del gobierno para eliminar las licitaciones de las DP de Paquera y Alajuelita. En 2026 se entregó el CCP de Alajuela, para un total de 4 de 8 Centros Cívicos por la Paz (CCP). El contratista de los CCP Liberia, Pérez Zeledón, San José y Goicoechea se retiró de las obras (avances de 12%, 17%, 13% y 33%); se tramita la rescisión por incumplimiento y se incorporaron 4 procesos nuevos para concluirlas, cuya contratación se prevé formalizar en 2026 y la construcción en 2027, por lo que se solicitará una prórroga del plazo de desembolsos. Productos 1.4 y 1.5: finalizaron las capacitaciones y los Experimentos Aleatorios Controlados, se validó la metodología de evaluación de impacto y se contrató el licenciamiento ArcGIS; está pendiente parte del equipamiento del SIAC. 1.6: el Sistema de Gestión de Quejas y Denuncias está en etapa de cierre. Productos 2.1, 2.2, 2.5 y 2.6: en progreso (el sistema de información de los CCP concluyó su desarrollo) y 2.3: meta cumplida.

Likelihood of Achieving Development Objectives

Medium	El programa avanza hacia la consecución de sus objetivos con buenos resultados preliminares en los distritos atendidos. Sin embargo, es necesaria una revisión de las líneas de bases originalmente establecidas para mejor reflejar los territorios que realmente han sido priorizados por la operación.

Lesson Learned

Category	Lesson Learned	Entered in System
Project Management Capacity	Contar con un plan de respuesta temprana permite mitigar los impactos derivados del abandono de obras. La experiencia en la ejecución de los Centros Cívicos por la Paz evidenció la importancia de contar con un plan de acción claro y oportuno para atender situaciones excepcionales de abandono de obras por parte de contratistas. La implementación rápida de medidas administrativas, legales y operativas permite proteger las inversiones realizadas, resguardar los activos del proyecto y reducir los impactos sobre los cronogramas de ejecución. Ante la materialización de este tipo de situaciones, resultó fundamental adoptar un conjunto de acciones coordinadas que incluyeron la suspensión de los contratos y la toma de posesión de los sitios de obra, la contratación de servicios de seguridad para proteger la infraestructura, materiales y bienes existentes, así como la aplicación de los procedimientos establecidos en la normativa nacional para la terminación contractual. Esta experiencia demuestra que la existencia de protocolos de actuación previamente definidos y la capacidad de respuesta institucional son elementos clave para asegurar la continuidad de los proyectos, minimizar riesgos y preservar los avances alcanzados ante contingencias que afectan la ejecución contractual. La experiencia también evidenció la necesidad de reforzar estos protocolos.	10/2/2026
Others - Technical-Sectorial Dimensions	Definir y preservar estándares de calidad, sostenibilidad y desempeño durante todo el ciclo de vida de la infraestructura. La ejecución de múltiples obras evidenció la importancia de definir desde las etapas de diseño y contratación estándares mínimos de calidad, funcionalidad, sostenibilidad, confort y mantenimiento que se mantengan durante la adjudicación, construcción y operación de la infraestructura. La experiencia mostró que ajustes de diseño, optimizaciones de costos o diferencias en los criterios aplicados entre proyectos similares pueden generar variaciones en el desempeño esperado de las instalaciones y mayores requerimientos de adaptación, operación o mantenimiento en etapas posteriores. Los programas de infraestructura deberían establecer estándares técnicos mínimos y criterios de desempeño verificables desde la preparación de los proyectos, incorporando aspectos como confort climático, eficiencia energética, sostenibilidad, calidad constructiva y requerimientos de operación y mantenimiento, de manera que las decisiones adoptadas durante la ejecución preserven los objetivos definidos para el activo durante todo su ciclo de vida.	10/2/2026
Others - Technical-Sectorial Dimensions	La formación continua potencia las capacidades institucionales desarrolladas. En 2023, el Programa fortaleció las capacidades de la Fuerza Pública en análisis criminal mediante la implementación de un modelo institucional, la capacitación de funcionarios y el desarrollo de un curso especializado para la Academia Nacional de Policía. Estos esfuerzos permitieron consolidar capacidades para recopilar, procesar y utilizar información estratégica para la toma de decisiones en materia de seguridad. La experiencia evidenció que estas capacidades pueden ampliarse mediante oportunidades de actualización e intercambio técnico. En 2026, oficiales de la Fuerza Pública participaron en el Taller Regional de Investigación Criminal e Inteligencia para Delitos Complejos y Crimen Organizado, organizado por el BID y el Ministerio de Seguridad de Argentina, donde intercambiaron experiencias y buenas prácticas sobre investigación criminal, inteligencia, uso de tecnologías y cooperación internacional para enfrentar delitos complejos y crimen organizado. Esta participación fue posible gracias a recursos de CT y a sinergias con la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo, demostrando el valor de complementar los esfuerzos nacionales de fortalecimiento institucional con espacios regionales de aprendizaje e intercambio. Como lección, la combinación de procesos de capacitación, formación continua y cooperación regional contribuye a consolidar las capacidades desarrolladas.	10/2/2026
Others - Technical-Sectorial Dimensions	Fortalecer la gestión del conocimiento y la planificación de riesgos en la ejecución de obras. La ejecución simultánea de múltiples contratos demostró la importancia de contar con mecanismos sistemáticos para evaluar capacidades de ejecución, anticipar riesgos operativos y documentar oportunamente las situaciones críticas que surjan durante el desarrollo de las obras. La experiencia acumulada en proyectos con atrasos, reajustes, sustitución de contratistas o requerimientos de reprogramación constituye una fuente de información valiosa para mejorar la preparación, contratación y supervisión de futuras intervenciones. Los programas de infraestructura deberían fortalecer los procesos de análisis de riesgos, evaluación de capacidades de ejecución y sistematización de lecciones aprendidas, documentando de forma estructurada las causas de las situaciones críticas, las medidas adoptadas y sus resultados, con el fin de retroalimentar la planificación, contratación y seguimiento de futuras obras y apoyar una toma de decisiones más oportuna.	10/2/2026
Others - Technical-Sectorial Dimensions	La formación continua y la articulación territorial fortalecen la preparación y sostenibilidad de los Centros Cívicos por la Paz (CCPs). Entre 2023 y 2025, los procesos de fortalecimiento de capacidades dirigidos a municipalidades y organizaciones de la sociedad civil en los territorios donde se construirán y pondrán en marcha los Centros Cívicos por la Paz evidenciaron que la formación es más efectiva cuando se desarrolla mediante metodologías participativas, enfocadas en la reflexión crítica, el trabajo articulado entre actores institucionales y comunitarios, y la aplicación práctica de herramientas de prevención de la violencia. Asimismo, la experiencia demostró que, una vez alcanzadas las metas de capacitación en estos años, resulta fundamental mantener espacios de actualización, intercambio y acompañamiento para sostener el compromiso institucional y la participación de los actores clave. En este sentido, las capacitaciones complementarias implementadas en el primer semestre de 2026 han contribuido a mantener el interés y la articulación de las contrapartes, facilitando la preparación para la puesta en funcionamiento de los Centros Cívicos por la Paz en construcción y fortaleciendo las condiciones para la sostenibilidad de las acciones preventivas en los territorios.	10/2/2026
Intra/Inter Coordination, Legal aspects and public processes	La consolidación institucional es una etapa natural en la maduración del modelo de Centros Cívicos por la Paz (CCP). La experiencia acumulada durante la implementación de los Centros Cívicos por la Paz (CCP) ha demostrado que, conforme el modelo madura y amplía su alcance territorial, resulta necesario fortalecer los mecanismos institucionales que garanticen su sostenibilidad y gobernanza. Este proceso de consolidación representa una evolución natural del modelo, que va más allá de la construcción de infraestructura y la prestación de servicios para afianzar su permanencia y efectividad en el largo plazo. En este contexto, el Ministerio de Justicia y Paz, con el apoyo técnico de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), impulsa la formulación de un proyecto de ley orientado a fortalecer la gobernanza, la sostenibilidad y la rectoría del Ministerio sobre el modelo CCP. Esta experiencia ha evidenciado que las intervenciones interinstitucionales requieren marcos formales que definan responsabilidades, fortalezcan la coordinación entre actores y contribuyan a asegurar la continuidad operativa y financiera de los servicios brindados. La iniciativa busca consolidar los avances alcanzados y dotar al modelo de una base institucional más sólida para sostener y ampliar su impacto en la prevención de la violencia y la promoción de la inclusión social en los territorios.	10/2/2026

Intra/Inter Coordination, Project Management Capacity, Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors	La coordinación interinstitucional temprana y continua fortalece la ejecución y sostenibilidad de las intervenciones. La experiencia de implementación del programa demostró que la coordinación temprana y permanente entre la Unidad Coordinadora del Programa, las instituciones beneficiarias y los equipos técnicos es un factor clave para la ejecución exitosa de intervenciones de infraestructura, equipamiento y asistencia técnica. La participación activa de los actores involucrados desde las etapas iniciales permitió validar requerimientos, alinear expectativas y agilizar la toma de decisiones. Asimismo, los espacios regulares de coordinación contribuyeron a identificar riesgos y necesidades de manera anticipada, reduciendo ajustes durante la ejecución y minimizando reprocesos. Esto facilitó la adaptación de actividades y cronogramas sin afectar el cumplimiento de los objetivos del programa. Como principal aprendizaje, se identificó la conveniencia de gestionar la coordinación interinstitucional como un proceso continuo y estructurado. Para ello, resulta recomendable institucionalizar mecanismos de seguimiento periódico, definir responsabilidades para la toma de decisiones, establecer rutas de escalamiento para atender observaciones y mantener comunicación permanente entre las áreas técnicas, administrativas y operativas. Estas prácticas fortalecen la apropiación de los resultados, optimizan el uso de los recursos y contribuyen a la sostenibilidad de las intervenciones.	10/2/2026
Project Management Capacity, Environmental and Social Factors	Fortalecimiento de la cultura preventiva y mejora continua en la gestión ambiental, social y de seguridad en obra. La experiencia de ejecución de las obras resalta la importancia de mantener una gestión preventiva permanente en materia ambiental, social, de seguridad y salud ocupacional, con acompañamiento de ESG. Ante la ocurrencia de incidentes, resulta fundamental activar oportunamente los mecanismos de análisis, seguimiento y mejora continua, con el acompañamiento de los especialistas ambientales y sociales, de manera que las lecciones aprendidas se traduzcan en acciones concretas para fortalecer la gestión del proyecto. En este sentido, la identificación de causas, la implementación de medidas correctivas y preventivas, el refuerzo de las capacitaciones al personal, la actualización de los registros de incidentes y de los mecanismos de quejas y reclamos, así como el seguimiento al cumplimiento de la normativa aplicable, contribuyen a fortalecer la cultura de prevención y a reducir riesgos durante la ejecución de las obras. Para futuras intervenciones, se recomienda continuar promoviendo una gestión proactiva de los aspectos ambientales, sociales y de seguridad ocupacional, asegurando que los instrumentos de monitoreo, comunicación y respuesta se mantengan actualizados y operativos, favoreciendo así una ejecución más segura, eficiente y sostenible de los proyectos.	10/2/2026

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
1	Inactive	Atrasos en la ejecución al no contar oportunamente con el presupuesto requerido tras la vigencia del nuevo proceso de gestión presupuestaria, que requiere aprobación por la Asamblea Legislativa del presupuesto y sus posteriores modificaciones correspondiente a las entidades desconcentradas.	4 - High	4 - High	High	Legislation and regulation

Details

Associated Outputs	- P.1.3. Departamentos de la FP capacitados en análisis criminal y monitoreo de dinámicas delictivas - P.1.4. Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas - P.1.5. Evaluación de impacto de estrategias policiales basadas en evidencia diseñada e implementada - P.1.6. Sistema de procesamiento de quejas ciudadanas y procesos disciplinarios, fortalecido - P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria - P.2.1. Modelo de atención de los CCP actualizado, fortalecido, y en funcionamiento en los CCPs de la red - P.2.2. Modelo de gestión de los CCP homologado, fortalecido y en funcionamiento en los CCPs de la red - P.2.3. Municipalidades y grupos de sociedad civil capacitados y utilizando las nuevas competencias adquiridas en prevención de violencia - P.2.4. Estrategia de comunicación social de los CCP, diseñada e implementada - P.2.5. Sistema de información integrado de los CCP, desarrollado e implementado - P.2.6. Evaluación de impacto de los CCP diseñada e implementada - P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento - P1.1. Plataformas de datos policiales integradas e interoperables - P1.2. Sistema de información delictual fortalecidos y en funcionamiento	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Time - Scope
Associated Outcomes	- 1. Reducción de homicidios y asaltos en los distritos priorizados - 2. Reducción de comportamientos delictivos de adolescentes y jóvenes vulnerables a la violencia que participan en los CCP.	**Responsible**	MJP	**Probability Factors**	El Ministerio de Hacienda no ha autorizado a la UCP para hacer pagos con los recursos del programa por una interpretación de la normativa que rige los mecanismos presupuestarios para entidades desconcentradas. La resolución del problema ha estado tomando tiempo considerable.
Description of Impact	Si no se cuenta con el presupuesto aprobado, no podrían adjudicarse contratos. Los más inminentes serían los miembros de la UCP.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	La unidad coordinadora elevó la solicitud de resolucion al despacho del viceministro de Hacienda. El Banco estará solicitando apoyo a priorizar las gestiones que se requieran para que la Unidad coordinadora pueda contar con los permisos-usuarios para gestionar el presupuesto del Proyecto.	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	2022	**Budget**	0	**Responsible**	UC
Completion Date	9/29/2022	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
2	Inactive	Demoras en la ejecución de las obras debido a la complejidad de la realización de múltiples obras simultáneamente en distintas localidades.	3 - Medium High	3 - Medium High	High	Scope and planning

Details

Associated Outputs	- P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria - P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento	**Source of Risk**	Project	**Type of Impact**	- Time - Cost
Associated Outcomes	- 1. Reducción de homicidios y asaltos en los distritos priorizados - 2. Reducción de comportamientos delictivos de adolescentes y jóvenes vulnerables a la violencia que participan en los CCP.	**Responsible**	MJP y MSP	**Probability Factors**	Demoras en la contratación del Gestor. Dado que el proceso de licitación correspondiente fue declarado desierto, la Unidad Coordinadora evalúa alternativas para atender las demandas de supervisión del programa.
Description of Impact	Debido a que el primer año de ejecución aún no se contará con un Gestor técnico contratado, la complejidad de coordinar una gran cantidad de productos podría demorar el logro de los resultados.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	Este riesgo se mitigará mediante la agrupación las obras en paquetes licitatorios regionales, atractivos para empresas con suficiente capacidad técnico-financiera, y la conformación de un equipo experto que acompañará la supervisión de los procesos de pre inversión, contratación, diseño y ejecución de las obras.	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	Inicio de las licitaciones	**Budget**	0	**Responsible**	Bank
Completion Date	9/26/2023	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status	
2	Aplicación de metodologías de compresión del Programa de Trabajo, como lo son la intensificación de recursos y la ejecución rápida de acuerdo con las mejores prácticas de gestión de proyectos.	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	2024	**Budget**	0	**Responsible**	UCP
Completion Date	9/26/2023	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
3	Inactive	Demoras en la implementación del programa porque no se cuenta con los perfiles adecuados en el OE para gestión de proyectos.	1 - Low	3 - Medium High	Low	Project management capacity

Details

Associated Outputs	- P.1.3. Departamentos de la FP capacitados en análisis criminal y monitoreo de dinámicas delictivas - P.1.4. Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas - P.1.5. Evaluación de impacto de estrategias policiales basadas en evidencia diseñada e implementada - P.1.6. Sistema de procesamiento de quejas ciudadanas y procesos disciplinarios, fortalecido - P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria - P.2.1. Modelo de atención de los CCP actualizado, fortalecido, y en funcionamiento en los CCPs de la red - P.2.2. Modelo de gestión de los CCP homologado, fortalecido y en funcionamiento en los CCPs de la red - P.2.3. Municipalidades y grupos de sociedad civil capacitados y utilizando las nuevas competencias adquiridas en prevención de violencia - P.2.4. Estrategia de comunicación social de los CCP, diseñada e implementada - P.2.5. Sistema de información integrado de los CCP, desarrollado e implementado - P.2.6. Evaluación de impacto de los CCP diseñada e implementada - P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento - P1.1. Plataformas de datos policiales integradas e interoperables - P1.2. Sistema de información delictual fortalecidos y en funcionamiento	**Source of Risk**	Institutional capacity	**Type of Impact**	- Cost - Time
Associated Outcomes	- 1. Reducción de homicidios y asaltos en los distritos priorizados - 2. Reducción de comportamientos delictivos de adolescentes y jóvenes vulnerables a la violencia que participan en los CCP.	**Responsible**	MJP	**Probability Factors**	La UCP ha contratado personal de apoyo con perfiles aprobados por el Banco. Aunque no se ha podido contratar un Gestor técnico en los términos anticipados durante el diseño, la UCP se ha venido fortaleciendo con un equipo profesional dedicado y comprometido con el programa.
Description of Impact	El Programa podría demorar su ejecución si no logra asegurar personal con las capacidades técnicas, de gestión y experiencia adecauda. Así mismo, si no logra contratar en el menor tiempo posible al Gestor, la conformación de un euqipo técnico y su curva de aprendizaje sería muy extensa.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	La UCP la lanzó una convocatoria de profesionales en diferentes campos y se ha logrado contratar personal de apoyo con perfiles aprobados por el Banco para apoyar en las labores claves de ejecución mientras se determina el curso de acción a seguir con la contratación del gestor.	TRANSFER	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	2026	**Budget**	0	**Responsible**	Executing Agency
Completion Date	3/20/2023	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
4	Inactive	Falta de asignación de recursos públicos para el adecuado funcionamiento de los CCP podría afectar el alcance de resultados y la sostenibilidad de las intervenciones de prevención.	1 - Low	4 - High	Medium Low	Operation and maintenance capacity

Details

Associated Outputs	- P.2.1. Modelo de atención de los CCP actualizado, fortalecido, y en funcionamiento en los CCPs de la red - P.2.2. Modelo de gestión de los CCP homologado, fortalecido y en funcionamiento en los CCPs de la red - P.2.4. Estrategia de comunicación social de los CCP, diseñada e implementada - P.2.5. Sistema de información integrado de los CCP, desarrollado e implementado - P.2.6. Evaluación de impacto de los CCP diseñada e implementada - P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento	**Source of Risk**	Institutional capacity	**Type of Impact**	- Quality - Scope
Associated Outcomes	- 1. Reducción de homicidios y asaltos en los distritos priorizados - 2. Reducción de comportamientos delictivos de adolescentes y jóvenes vulnerables a la violencia que participan en los CCP.	**Responsible**	MJP	**Probability Factors**	Que el OE asegure el contar con el presupuesto ordinario suficiente para que una vez cerrada la operación, el impacto y los resultados puedan ser sostenibles en el tiempo.
Description of Impact	Los objetivos del Programa requieren una asignación, constante en el tiempo, de recursos económicos y humanos para garantizar una sostenibildiad del impacto y de los resultados en el tiempo. Esto aplica tanto para los productos programáticos como para el mantenimiento de las obras.				

Response Actions

1

Response Description	Management Strategy	Status	
La presentación a los Ministerios de Planificación y Hacienda de una proyección ajustada de personal de los CCP, basada en el nuevo dimensionamiento. El personal considerado incluye la coordinación del CCP, mediación comunitaria, apoyo socioemocional (personal del MJP), y apoyo a la permanencia escolar (personal del MEP). Las actividades deportivas serán coordinadas con los Consejos Deportivos Cantonales, lo cual será reflejado en los acuerdos interinstitucionales que se suscriban.	AVOID	INACTIVE	

Details

Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	Executing Agency
Completion Date	3/17/2026	**Funding Source**	LOCALCOU	**Status Description**	-

2

Response Description	Management Strategy	Status	
La suscripción de un convenio entre el OE y el Ministerio de Educación Pública (MEP), para la asignación de recursos que aseguren la oferta de actividades de permanencia educativa en los CCP.	TRANSFER	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	2023	**Budget**	0	**Responsible**	UCP
Completion Date	3/18/2025	**Funding Source**	OTHERS	**Status Description**	-

3

Response Description	Management Strategy	Status	
Ajustes aplicados en la variedad de servicios a ofrecer en los nuevos CCPs para incrementar su costo-efectividad. Se ha contemplado reducir la superficie techada de los CCP (20% promedio) y reducir la dispersión de la oferta de actividades recreativas concentrándolas en las tienen mayor demanda.	AVOID	INACTIVE	

Details

Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	Bank
Completion Date	3/17/2026	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
5	Active	Los recursos dedicados al mantenimiento pueden ser insuficientes, lo cual puede limitar la vida útil de las obras y tecnología contempladas.	1 - Low	2 - Medium Low	Low	Operation and maintenance capacity

Details

Associated Outputs	- P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria - P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento	**Source of Risk**	Institutional capacity	**Type of Impact**	- Quality - Cost
Associated Outcomes	- 1. Reducción de homicidios y asaltos en los distritos priorizados - 2. Reducción de comportamientos delictivos de adolescentes y jóvenes vulnerables a la violencia que participan en los CCP.	**Responsible**	MJP	**Probability Factors**	La inflación ha generado un incremento de los costos en general que pueden afectar las proyecciones sobre los montos requeridos para el mantenimiento de obras y equipos.

Description of Impact	Se podría poner en riesgo la sostenibilidad del proyecto y sus resultados.				

Response Actions

1	**Response Description**		**Management Strategy**		**Status**	
	Se suscribirá un convenio con la Municipalidad de San José, para adjudicar el contrato de obra de este centro cívico y asegurar su mantenimiento una vez entregada la obra.		TRANSFER		COMPLETE	
	Details					
	Estimated Completion Date	2025	**Budget**	0	**Responsible**	UCP
	Completion Date	9/25/2025	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-
2	**Response Description**		**Management Strategy**		**Status**	
	Se cargará el costo de mantenimiento de las DPs una vez cierre el Programa a la partida presupuestal dedicada del MSP.		MITIGATE		INACTIVE	
	Details					
	Estimated Completion Date	al finalizar la construcción	**Budget**	0	**Responsible**	UCP
	Completion Date	3/17/2026	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-
3	**Response Description**		**Management Strategy**		**Status**	
	Se incluirán fondos para el mantenimiento de las inversiones tecnológicas en las partidas presupuestarias correspondientes del MJP y del MSP e instituciones participantes en los CCPs. Cada institución participante en el CCP es responsable del mantenimiento de los activos tecnológicos que ocupe (Decreto 40876-JP-MCJ).		TRANSFER		INACTIVE	
	Details					
	Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	UCP
	Completion Date	3/17/2026	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

5

4	**Response Description**		**Management Strategy**		**Status**	
	Se suscribirán convenios con las municipalidades para facilitar recursos de mantenimiento para las instalaciones de los CCPs en el mediano y largo plazo, después de que finalice el programa.		TRANSFER		COMPLETE	
	Details					
	Estimated Completion Date	2025	**Budget**	0	**Responsible**	UCP
	Completion Date	3/20/2025	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-
5	**Response Description**		**Management Strategy**		**Status**	
	Se licitarán las obras con un mecanismo de diseño, construcción y mantenimiento durante el periodo de ejecución, que incentive al contratista para entregar edificaciones que minimicen estos costos.		MITIGATE		COMPLETE	
	Details					
	Estimated Completion Date	2022	**Budget**	0	**Responsible**	UCP
	Completion Date	2/28/2025	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

	Response Description		Management Strategy		Status	
	Se licitarán las obras con un mecanismo de diseño, construcción y mantenimiento durante el periodo de ejecución, que incentive al contratista para entregar edificaciones que minimicen estos costos.		TRANSFER		COMPLETE	
	Details					
6	**Estimated Completion Date**	2022	**Budget**	0	**Responsible**	UCP
	Completion Date	2/28/2025	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
6	Inactive	Si las nuevas autoridades de gobierno (central y local) presentan un enfoque diferente, el Programa podría experimentar dificultades en cuanto al alcance y la inversión a realizar.	2 - Medium Low	4 - High	Medium High	Political stability

Details

Associated Outputs	- P.1.3. Departamentos de la FP capacitados en análisis criminal y monitoreo de dinámicas delictivas - P.1.4. Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas - P.1.5. Evaluación de impacto de estrategias policiales basadas en evidencia diseñada e implementada - P.1.6. Sistema de procesamiento de quejas ciudadanas y procesos disciplinarios, fortalecido - P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria - P.2.1. Modelo de atención de los CCP actualizado, fortalecido, y en funcionamiento en los CCPs de la red - P.2.2. Modelo de gestión de los CCP homologado, fortalecido y en funcionamiento en los CCPs de la red - P.2.3. Municipalidades y grupos de sociedad civil capacitados y utilizando las nuevas competencias adquiridas en prevención de violencia - P.2.4. Estrategia de comunicación social de los CCP, diseñada e implementada - P.2.5. Sistema de información integrado de los CCP, desarrollado e implementado - P.2.6. Evaluación de impacto de los CCP diseñada e implementada - P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento - P1.1. Plataformas de datos policiales integradas e interoperables - P1.2. Sistema de información delictual fortalecidos y en funcionamiento	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Quality - Time - Scope
Associated Outcomes	- 1. Reducción de homicidios y asaltos en los distritos priorizados - 2. Reducción de comportamientos delictivos de adolescentes y jóvenes vulnerables a la violencia que participan en los CCP.	**Responsible**	Organismo Ejecutor	**Probability Factors**	Toma de posesión de las nuevas autoridades.
Description of Impact	Un desvío significativo del enfoque del programa podría afectar la consecución de sus metas.				

Response Actions

	Response Description		Management Strategy		Status	
	Desarrollo de canales de comunicación que faciliten la comprensión de los objetivos del Programa y las estrategias de ejecución por parte de las nuevas autoridades.		MITIGATE		COMPLETE	
	Details					
1	**Estimated Completion Date**	2022	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
	Completion Date	3/24/2023	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
7	Inactive	Si se retrasa la contratación del Gestor, la capacidad de gestión de la UCP se vería limitada, lo cual impactaría la ejecución de los productos en los plazos establecidos en la Matriz de Resultados.	3 - Medium High	2 - Medium Low	Medium High	Project management capacity

Details

Associated Outputs	- P.1.3. Departamentos de la FP capacitados en análisis criminal y monitoreo de dinámicas delictivas - P.1.4. Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas - P.1.5. Evaluación de impacto de estrategias policiales basadas en evidencia diseñada e implementada - P.1.6. Sistema de procesamiento de quejas ciudadanas y procesos disciplinarios, fortalecido - P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria - P.2.1. Modelo de atención de los CCP actualizado, fortalecido, y en funcionamiento en los CCPs de la red - P.2.2. Modelo de gestión de los CCP homologado, fortalecido y en funcionamiento en los CCPs de la red - P.2.3. Municipalidades y grupos de sociedad civil capacitados y utilizando las nuevas competencias adquiridas en prevención de violencia - P.2.4. Estrategia de comunicación social de los CCP, diseñada e implementada - P.2.5. Sistema de información integrado de los CCP, desarrollado e implementado - P.2.6. Evaluación de impacto de los CCP diseñada e implementada - P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento - P1.1. Plataformas de datos policiales integradas e interoperables - P1.2. Sistema de información delictual fortalecidos y en funcionamiento	**Source of Risk**	Institutional capacity	**Type of Impact**	- Time - Cost
Associated Outcomes	- 1. Reducción de homicidios y asaltos en los distritos priorizados - 2. Reducción de comportamientos delictivos de adolescentes y jóvenes vulnerables a la violencia que participan en los CCP.	**Responsible**	Organismo Ejecutor	**Probability Factors**	Ya se realizó un proceso de contratacion que se declaró desierto.

Description of Impact	La unidad coordinadora debe asumir todas las gestiones que originalmente estaba planeado que se asignaran al gestor.					

Response Actions

1	**Response Description**		**Management Strategy**		**Status**	
	Construcción de robusto cartel de licitación que incorpora lecciones aprendidas de otros Programas.		MITIGATE		COMPLETE	
	Details					
	Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	Banco y Organismo Ejecutor
	Completion Date	10/5/2021	**Funding Source**	TECHNICA	**Status Description**	-
2	**Response Description**		**Management Strategy**		**Status**	
	Atención oportuna y clara a solicitudes de aclaración de oferentes.		MITIGATE		COMPLETE	
	Details					
	Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
	Completion Date	3/23/2022	**Funding Source**	TECHNICA	**Status Description**	-
3	**Response Description**		**Management Strategy**		**Status**	
	Contratación de consultores individuales para apoyo temporal		MITIGATE		COMPLETE	
	Details					
	Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
	Completion Date	3/20/2023	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-
4	**Response Description**		**Management Strategy**		**Status**	
	Apoyo de Cooperación Técnica mientras se firma el contrato con el Gestor Técnico del Programa.		MITIGATE		COMPLETE	
	Details					
	Estimated Completion Date	-	**Budget**	200000	**Responsible**	Banco
	Completion Date	3/23/2022	**Funding Source**	TECHNICA	**Status Description**	-
5	**Response Description**		**Management Strategy**		**Status**	
	Plan de accion de parte de la unidad coordinadora para abordar todas las areas claves de la gestion del proyecto con consultores individuales , mientras analizan las lecciones aprendidas del proceso que se declaró desierto y las opciones para decidir el curso de acción de la contratacion del gestor.		MITIGATE		COMPLETE	
	Details					
	Estimated Completion Date	2022	**Budget**	0	**Responsible**	UC
	Completion Date	3/20/2023	**Funding Source**	OTHERS	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
8	Active	Si se dieran retrasos por apelaciones en los procesos de licitación, se verían afectados los plazos para la obtención de los productos establecidos en la matriz de resultados.	2 - Medium Low	3 - Medium High	Medium High	Legislation and regulation

Details

Associated Outputs	- P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria - P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Time
Associated Outcomes	- 1. Reducción de homicidios y asaltos en los distritos priorizados - 2. Reducción de comportamientos delictivos de adolescentes y jóvenes vulnerables a la violencia que participan en los CCP.	**Responsible**	Organismo Ejecutor	**Probability Factors**	Costa Rica es un país que cuenta con un regimen recursivo nacional que permite que los oferentes presenten recursos de apelación aún superado el plazo suspensivo que las politicas del Banco disponen.
Description of Impact	Atrasos en el cronograma de contratación y ejecución de las obras.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	Desarrollar un equipo de trabajo con adecuadas competencias para la elaboración de especificaciones técnicas, parámetros constructivos y carteles de licitación. Capacitación constante del equipo a cargo de los documentos (FIDIC, Políticas del BID, Apoyo de CT por parte de banco) Implementar acciones para asegurar la calidad de los documentos de licitación.	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	Inicio de las licitaciones	**Budget**	0	**Responsible**	Organismo Ejecutor
Completion Date	3/18/2025	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status	
2	Se aplican las mejores prácticas internacionales de procurement, basadas en la transparencia y en el estímulo de la participación igualitaria de los interesados, lo que genera confianza y credibilidad en procura de un mercado competitivo.	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	Inicio de las licitaciones	**Budget**	0	**Responsible**	UCP
Completion Date	2/28/2025	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status	
3	Se mantiene una capacitación constante del equipo en temas FIDIC.	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	2022	**Budget**	0	**Responsible**	Bank-UCP
Completion Date	9/24/2024	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status	
4	Se ha implementado la Notificación de Intención de Adjudicación para brindar oportunidad a los oferentes a presentar quejas ante la UCP previo a la adjudicación formal	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	Inicio de las licitaciones	**Budget**	0	**Responsible**	UCP
Completion Date	2/28/2025	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
9	Materialized	Si los incrementos en los costos de la construcción se mantienen, se limitará sensiblemente la capacidad del Programa para ejecutar todas las obras planificadas.	4 - High	4 - High	High	Macroeconomic environment

Details

9	**Associated Outputs**	- P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria - P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Cost - Scope - Time - Quality
	Associated Outcomes	- 1. Reducción de homicidios y asaltos en los distritos priorizados - 2. Reducción de comportamientos delictivos de adolescentes y jóvenes vulnerables a la violencia que participan en los CCP.	**Responsible**	Organismo Ejecutor	**Probability Factors**	La apertura de ofertas económicas (durante el proceso de evaluación relacionado con el paquete 1 de delegaciones policiales) reveló cotizaciones que superan el presupuesto estimado durante el diseño.
	Description of Impact	Se reduciría el alcance de los productos a financiar en ambos componentes y el plazo para concluir las obras debido al replanteamiento de algunos procesos (necesidad de ajuste en diseños).				
	Response Actions					

9	1	**Response Description**		**Management Strategy**		**Status**	
		Posterior a la recepcion de las ofertas del paquete 1 de delegaciones policiales, donde se evidenció que supera el estimado, la unidad coordinadora realizará un analisis a profundiad del presupuesto y las opciones que podrian implementarse con el fin de cumplir con las metas del programa.		MITIGATE		COMPLETE	
		Details					
		Estimated Completion Date	2022	**Budget**	0	**Responsible**	UCP
		Completion Date	6/30/2025	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-
	2	**Response Description**		**Management Strategy**		**Status**	
		El comité directivo del MJP y el MSP analizan los costos de las obras, para determinar y priorizar las que finalmente se ejecutarán en el periodo de ejecución del préstamo		ACCEPT		COMPLETE	
		Details					
		Estimated Completion Date	Apertura de las ofertas de obras	**Budget**	0	**Responsible**	UCP
		Completion Date	3/26/2026	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-
	3	**Response Description**		**Management Strategy**		**Status**	
		Inclusión en la contratación de los diseños de delegaciones policiales el análisis para la elaboración de planos prototipo en busca de economía en las obras a construir.		MITIGATE		COMPLETE	
		Details					
		Estimated Completion Date	Inicio de las licitaciones	**Budget**	0	**Responsible**	UCP
		Completion Date	9/24/2024	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-
	4	**Response Description**		**Management Strategy**		**Status**	
		Elaboración de modelos con escenarios que combinen todas las variables que puedan impactar el costo, de modo que cada paquete se planifique según la combinación más eficiente de criterios		MITIGATE		COMPLETE	
		Details					
		Estimated Completion Date	Inicio de las licitaciones	**Budget**	0	**Responsible**	UCP
		Completion Date	9/24/2024	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-
	5	**Response Description**		**Management Strategy**		**Status**	
		Se re planteó el esquema de licitacion para que sea de diseño separado de la construcción con el fin de tener un prototipo de diseño que derive en menores costos en los paquetes de delegaciones que faltan.		MITIGATE		COMPLETE	
		Details					
		Estimated Completion Date	Inicio de las licitaciones	**Budget**	0	**Responsible**	UCP
		Completion Date	1/1/2024	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
10	Inactive	Si se experimentan dificultades para la obtención oportuna de terrenos, el Programa se vería en problemas para cumplir con el plazo máximo para licitar y de adjudicar obras, conforme lo establecido en el Contrato de Préstamo.	3 - Medium High	3 - Medium High	High	Scope and planning

Details

Associated Outputs	- P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento	**Source of Risk**	Project	**Type of Impact**	- Time - Scope
Associated Outcomes	- 2. Reducción de comportamientos delictivos de adolescentes y jóvenes vulnerables a la violencia que participan en los CCP.	**Responsible**	Organismo Ejecutor	**Probability Factors**	El aumento en los costos de construccion ha obligado al organismo ejecutor a re evaluar la ubicación y el alcance de las obras de CCPs que estan por construirse. Se mantienen 4 localidades en las cuales no se ha identificado el terreno para el proyecto. Sin embargo el riesgo por ahora se coloca en "impacto bajo" pues estas localidades se están acomodando dentro de los ultimos paquetes de licitación que se estarian lanzando el proximo año.
Description of Impact	Se podrían enfrentar atrasos por no contar con los terrenos a tiempo.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	Se mantiene una coordinación constante con las contrapartes , principalmente el MSP con el fin de monitorear el estado de los terrenos y tomar las desiciones que se requieran de manera oportuna.	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	Inicio de las licitaciones	**Budget**	0	**Responsible**	UCP
Completion Date	9/24/2024	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status	
2	Avanzar con la contratación del diseño de todas las delegaciones policiales que cuentan con terreno a nombre del MSP.	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	2023	**Budget**	0	**Responsible**	UCP
Completion Date	9/24/2024	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status	
3	Utilizar el diseño del prototipo de delegaciones policiales para disminuir los plazos de diseño.	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	2023	**Budget**	0	**Responsible**	UCP
Completion Date	9/24/2024	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status	
4	La Unidad coordinadora contrató un consultor legal que se encargará de dar seguimiento con el Ministerio, municipalidades y todos los entes involucrados para anticipar situaciones que deban atenderse y-o considerarse en el proceso.	AVOID	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	2022	**Budget**	0	**Responsible**	UC
Completion Date	3/23/2022	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
11	Inactive	Debido a la prohibición de realización de eventos masivos producto de la Pandemia COVID-19, podría suceder que el modelo de prevención de los CCP cuente con poco alcance de su población meta, provocando una subutilización de los CCPs y los recursos invertidos en CCPs sin paredes.	2 - Medium Low	4 - High	Medium High	Business and social environment

Details

Associated Outputs	- P.2.1. Modelo de atención de los CCP actualizado, fortalecido, y en funcionamiento en los CCPs de la red - P.2.3. Municipalidades y grupos de sociedad civil capacitados y utilizando las nuevas competencias adquiridas en prevención de violencia	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Scope
Associated Outcomes	- 2. Reducción de comportamientos delictivos de adolescentes y jóvenes vulnerables a la violencia que participan en los CCP.	**Responsible**	UCP del MJP	**Probability Factors**	Las restricciones relacionadas con el COVID se han venido reduciendo en el país, por lo que se estima que la asistencia a eventos de consulta y capacitación vuelva a niveles normales, similares a los esperados con anterioridad a la pandemia.
Description of Impact	a. Se gastan los recursos del empréstito en productos que no llegarán a la ciudadanía. b. La población meta no recibe los servicios previstos a traes del modelo de CCP sin Paredes. C. Sub utilización de los CCP.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	Planificar las actividades de estos productos a partir del 2022 cuando las restricciones se esperán sean menores y atendiendo los protocolos que se establezcan.	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	2024	**Budget**	0	**Responsible**	UCP/MJP
Completion Date	3/24/2023	**Funding Source**	LOANRESO	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
12	Inactive	Si la coordinación interinstitucional no es efectiva, se podrían experimentar problemas para la implementación e institucionalización de los productos.	2 - Medium Low	3 - Medium High	Medium High	Rule of law

Details

Associated Outputs	- P.1.4. Estrategias policiales basadas en evidencia diseñadas e implementadas - P.1.5. Evaluación de impacto de estrategias policiales basadas en evidencia diseñada e implementada - P.1.6. Sistema de procesamiento de quejas ciudadanas y procesos disciplinarios, fortalecido - P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria - P.2.1. Modelo de atención de los CCP actualizado, fortalecido, y en funcionamiento en los CCPs de la red - P.2.2. Modelo de gestión de los CCP homologado, fortalecido y en funcionamiento en los CCPs de la red - P.2.3. Municipalidades y grupos de sociedad civil capacitados y utilizando las nuevas competencias adquiridas en prevención de violencia - P.2.4. Estrategia de comunicación social de los CCP, diseñada e implementada - P.2.5. Sistema de información integrado de los CCP, desarrollado e implementado - P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento - P1.1. Plataformas de datos policiales integradas e interoperables - P1.2. Sistema de información delictual fortalecidos y en funcionamiento	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Quality - Scope
Associated Outcomes	- 1. Reducción de homicidios y asaltos en los distritos priorizados - 2. Reducción de comportamientos delictivos de adolescentes y jóvenes vulnerables a la violencia que participan en los CCP.	**Responsible**	UCP	**Probability Factors**	Muchas Instituciones involucradas en la gestion , diseminación e incorporación de los productos del programa en las diferentes comunidades. Muchas audiencias y publicos que abordar.
Description of Impact	Que los diferentes productos del programa no cumplan el objetivo que persiguen y no lleguen a los diferentes beneficiarios .				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	Desarrollar reuniones de inducción y seguimiento al proyecto con todas las autoridades de la Administración Pública involucrada.	AVOID	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	2023	**Budget**	0	**Responsible**	UCP
Completion Date	9/24/2024	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
13	Inactive	Retrasos en la obtención de productos dentro del Plazo para Desembolsos del Programa como consecuencia de solicitudes de información sobre los requisitos de la obra por parte de los oferentes.	3 - Medium High	3 - Medium High	High	Macroeconomic environment

Details

Associated Outputs	- Centro de Mando y Control Policial (CMCP) diseñado, construido, equipado y en funcionamiento - P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria - P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Time - Cost
Associated Outcomes	- 1. Reducción de homicidios y asaltos en los distritos priorizados - 2. Reducción de comportamientos delictivos de adolescentes y jóvenes vulnerables a la violencia que participan en los CCP.	**Responsible**	UCP	**Probability Factors**	Los procesos de contratación anteriores, han demostrado que los oferentes presentan solicitudes de aclaraciones que demandan de respuestas específicas y técnicas con intervención de varias personas del OE.
Description of Impact	Los procesos de contratación podrían tardar más de lo esperado generando que los productos finalicen fuera del plazo de desembolsos del Programa.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	- Elaboración de diseños y especificaciones técnicas detalladas que le permitan a los oferentes presentar una oferta conforme a los requerimientos solicitados	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	Durante la apertura y evaluación de ofertas así como durante la ejecución de los contratos de obra	**Budget**	0	**Responsible**	UCP
Completion Date	2/28/2025	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status	
2	- Acompañamiento del diseñador en la etapa de contratación para la evacuación de dudas o la elaboración de detalles adicionales para la construcción.	ENHANCE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	Durante la apertura y evaluación de ofertas así como durante la ejecución de los contratos de obra	**Budget**	0	**Responsible**	UCP
Completion Date	10/2/2026	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
14	Materialized	Prórroga en la fecha de terminación de las obras, afectando el Plazo para Desembolsos del Programa.	3 - Medium High	3 - Medium High	High	Macroeconomic environment

Details

Associated Outputs	- Centro de Mando y Control Policial (CMCP) diseñado, construido, equipado y en funcionamiento - P.1.7. Delegaciones diseñadas, construida, equipadas y operando bajo el enfoque de policía comunitaria - P.2.7. CCP diseñados, construidos, equipados y en funcionamiento	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Time
Associated Outcomes	- 1. Reducción de homicidios y asaltos en los distritos priorizados - 2. Reducción de comportamientos delictivos de adolescentes y jóvenes vulnerables a la violencia que participan en los CCP.	**Responsible**	UCP	**Probability Factors**	Hasta la fecha todos los procesos de obra que ha ejecutado el OE, han demandado la firma de adendas de plazo, finalizando las construcciones hasta 2 meses después de lo inicialmente programado.
Description of Impact	Los problemas a los que se enfrentan los contratistas de obras pueden generar que los productos no se obtengan en el plazo para desembolsos del Programa.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status
1	Análisis de las circunstancias por las cuales el avance se desfasa con respecto al programa de trabajo.	AVOID	ACTIVE

Details

Estimated Completion Date	Durante la fase de construcción de las obras	**Budget**	0	**Responsible**	UCP
Completion Date	3/31/2026	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status
2	Solicitud de planes remediales al Contratista en caso de que el desfase no tenga justificación de acuerdo con el Contrato y aplicación de multas de acuerdo con el procedimiento contractual.	TRANSFER	COMPLETE

Details

Estimated Completion Date	Durante la fase de construcción de las obras	**Budget**	0	**Responsible**	UCP
Completion Date	10/2/2026	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status
3	Ampliación de la fecha de terminación de la obra en caso de que el Contratista tenga derecho a plazo compensable de acuerdo con el Contrato.	ACCEPT	ACTIVE

Details

Estimated Completion Date	Durante la fase de construcción de las obras	**Budget**	0	**Responsible**	UCP
Completion Date	3/31/2026	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

MATERIALIZED RISKS

Issue ID	Issue Description
1	Ofertas del primer proceso de contratación (Techados de 2 áreas deportivas CCPs) sensiblemente mayores a los montos presupuestados originalmente, debido a condiciones externas de precios de materiales.

Details

Associated Risk	Si los incrementos en los costos de la construcción se mantienen, se limitará sensiblemente la capacidad del Programa para ejecutar todas las obras planificadas.	**Action**	Agilizar los procesos necesarios para la adjudicación de las obras en el menor tiempo posible. Revisión de parámetros constructivos y especificaciones técnicas Procesos de contratación con ofertas alternativas.	**Expected Completion Date**	3/17/2025
Operation Impact	Alto en los productos de obras principalmente.	**Lesson Learned**	La importancia de considerar el impacto de los factores macroeconómicos, aunque en eventos de fuerza mayor tal como una pandemia, es difícil de cuantificar.	**Completion Date**	3/17/2025

Issue ID	Issue Description					
2	Mediante el oficio MH-DM-OF-1854-2025 y la NOB del Banco con la respuesta O-CID/CCR-619/2025 se tramitó la modificación contractual a la cláusula 4.06 del Contrato de Préstamo N° 4871/OC-CR para extender el plazo de iniciación material de obras del programa, por un período de tres meses adicionales, pasando así del 17 de diciembre 2025 al 17 de marzo 2026 recalcando que dicha modificación en el plazo no altera la fecha límite de desembolsos (modificación contractual a la cláusula 2.04) que se había solicitado mediante el oficio MH-DM-OF-1149-2025 y el cual el Banco dio la NOB a través de la respuesta O-CID/CCR-132/2025.					
	Details					
	Associated Risk	Prórroga en la fecha de terminación de las obras, afectando el Plazo para Desembolsos del Programa.	**Action**		**Expected Completion Date**	
	Operation Impact		**Lesson Learned**		**Completion Date**	

Issue ID	Issue Description					
3	Durante el segundo semestre 2025 se tramitó la prórroga a la Cláusula 2.04 sobre el plazo para desembolsos, el cual se emitió la No Objeción del Banco el 14 de agosto de 2025 mediante oficio O-CID/CCR-417/2025, extendiendo el plazo hasta el 17 de marzo de 2027. En este mismo oficio, se aprobó la extensión del plazo para el inicio material de las obras dejando como fecha el 17 de diciembre 2025. Sin embargo, mediante el oficio O-CID/CCR-619/2025 de fecha 10 de diciembre de 2025 el Banco otorgó la No Objeción a una nueva solicitud para la modificación contractual a la cláusula 4.06 (a) Plazo para la iniciación material de las obras del Programa, por un período de tres meses adicionales, pasando así, del 17 de diciembre 2025 al 17 de marzo 2026, recalcando que dicha modificación en el plazo no altera la fecha límite de desembolsos de la cláusula 2.04 que se había dado la NOB en el oficio O-CID/CCR-417/2025.					
	Details					
	Associated Risk	Prórroga en la fecha de terminación de las obras, afectando el Plazo para Desembolsos del Programa.	**Action**	Esta modificación es requerida para mantener la coherencia contractual frente al avance de los procesos de contratación fundamental para garantizar la conclusión efectiva y cierre técnico-administrativo de los productos previstos, de modo de atender al cumplimiento de los objetivos del Programa.	**Expected Completion Date**	3/17/2027
	Operation Impact	La solicitud de extender el plazo de la cláusula contractual 4.06 (a) Plazo para la iniciación material de las obras del Programa, modificó la fecha límite de desembolsos, el cual se emitió la NOB de Banco al 17 de marzo 2027, mediante el oficio O-CID/CCR-417/2025.	**Lesson Learned**	El atraso en el inicio de ejecución de algunas obras antes de la fecha que se tenía estipulada (17 de marzo de 2025) y por ende en el cumplimiento del cronograma que había previsto para la fecha de último desembolso (17 de marzo de 2026) se debió principalmente por el sobrecosto de obras e incumplimientos por parte de contratistas. Respecto a los sobrecostos, durante los procesos de licitación pública internacional (LPI) realizados para la contratación de los CCP y DP, los precios por metro cuadrado presentados por las empresas constructoras superaron en un 63% o más, los costos estimados. Esta situación retrasó la adjudicación, y, por consiguiente, la orden de inicio de algunas obras de infraestructura, tales como: DP San Ramón, DP Desamparados Norte y DP Batán. Por otra parte, los incumplimientos de contratistas de delegaciones policiales (DP) atrasaron los diseños de obras y, consecuentemente, el inicio de construcción de DP en Alajuelita, Pococí, El Roble, Paquera, Limón y Turrialba. Adicionalmente, debido a una solicitud del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), se realizó una modificación en la estrategia para contar con la infraestructura y equipamiento del Centro de Mando y Control Policial (CMCP), lo cual generó ajustes en el proceso de contratación administrativa. Esto conllevó, que se requiriera la NOB del Banco a la modificación de la cláusula 4.06 (a) Plazo para la iniciación material de las obras del Programa con una nueva fecha para el 17 de marzo de 2026 y por consecuencia se debió modificar la cláusula 2.04 Plazo para Desembolsos con una nueva fecha de termino para el 17 de marzo de 2027.	**Completion Date**	3/17/2027

EVALUATION TRACKING

Evaluación de impacto

Evaluation

Evaluation Methodology as per DEM:	N/A
Current Evaluation Methodology:	Quasi-experimental: Diff-in-Diff
Stage:	Baseline
Main Topic of the Intervention:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE
Other Topics of the Intervention:	SOCIAL PROTECTION AND SOCIAL INVESTMENT
Main Topic of the Evaluation:	SOCIAL PROTECTION AND SOCIAL INVESTMENT
Other Topics of the Evaluation:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE

Definida en el Plan de Monitoreo y Seguimiento	
Status of the evaluation:	Active
Expected Date of Final Evaluation Report:	8/9/2024
Responsible:	External
Information on Responsible:	Jefe de Equipo y OE

Funding

Source of funding:	
Amount in USD (Thousands):	
Code:	
Total amount in USD (Thousands) spent to date in data collection:	0

Comments

3/19/2020	
gmoravargas	

Documents

Stage	Type of document	Name	Document Description	Document Date	Document Number	Document Permissions	Document User

Validation Process


Date	User	Role	Action	Comment	Classification	Workflow
10/02/2026	npena	Team Leader	Completed by Team Leader		Satisfactory	Progress Monitoring Report September Validation Workflow

MONITORING INDICATORS

Stage 2: After Eligibility


		Benchmark Indicator Value			
Indicator (I)	**Project Indicator Value**	**Satisfactory**	**Alert**	**Problem**	**Traffic Light**
Synthetic Indicator (SI)	2.70	2.5 <= I	2<=I<2.5	I<2	SATISFACTORY
Accumulated disbursements to country's historic disbursements	0.82	1 >= I > 0.51	0.51 >= I >=0.44	0.44 > I >= 0	SATISFACTORY
Cost Performance Index (annual - CPI(a)	0.84	0.80 <= I <= 2.00	0.40 <= I < 0.80	0.00 <= I < 0.40	SATISFACTORY
Schedule Performance Index (annual)- SPI(a)	0.74	0.80 <= I <= 2.00	0.40 <= I < 0.80	0.00 <= I < 0.40	ALERT
Environmental and social safeguards performance rating	Unsatisfactory	N/A	N/A	N/A	For tracking purpose only

Accumulated disbursements as proportion of the total amount

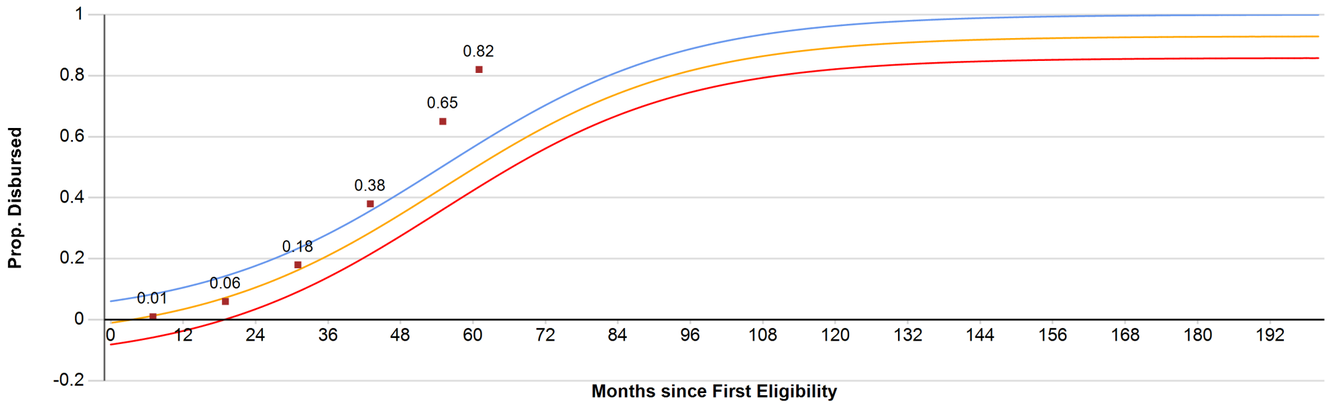


PV, AC, EV, PV(a), EV(a)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PV	0.00	0.00	2,851,808.00	14,034,188.00	41,974,743.00	74,597,892.00	95,500,000.00
AC	0.00	0.00	716,333.25	7,258,955.19	28,913,700.32	56,356,303.24	73,541,091.76
EV	0.00	0.00	1,378,585.24	6,165,927.95	18,739,622.90	28,676,458.60	41,258,690.07
PV(a)	0.00	0.00	2,851,808.00	15,439,547.96	41,035,470.69	55,669,874.16	84,265,871.50
EV(a)	0.00	0.00	1,839,537.62	9,213,910.30	30,195,273.82	41,573,632.68	61,941,158.67

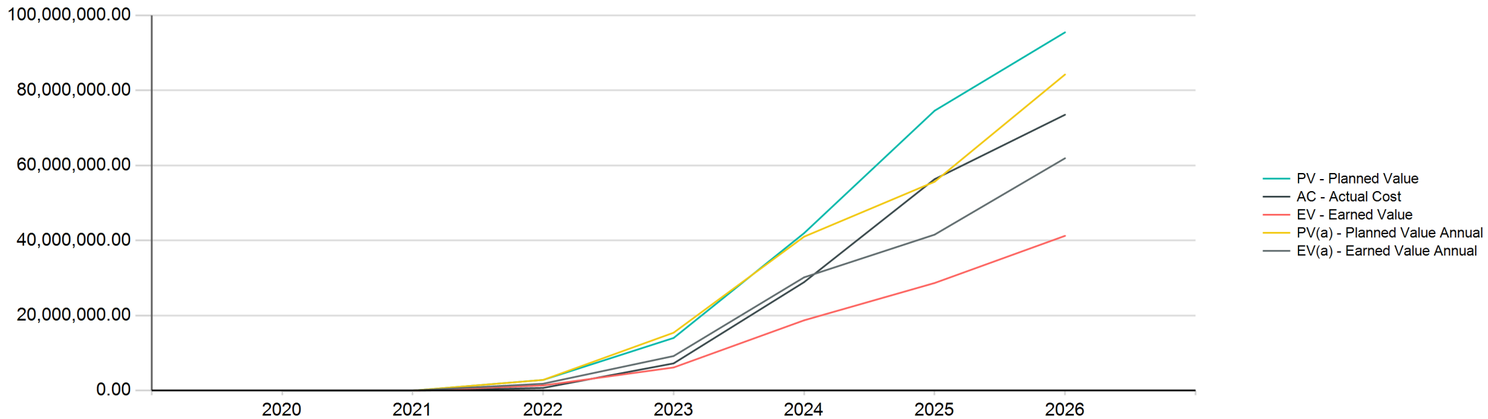

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CPI(a)	1.00	1.00	2.57	1.27	1.04	0.74	0.84
SPI(a)	1.00	1.00	0.65	0.60	0.74	0.75	0.74

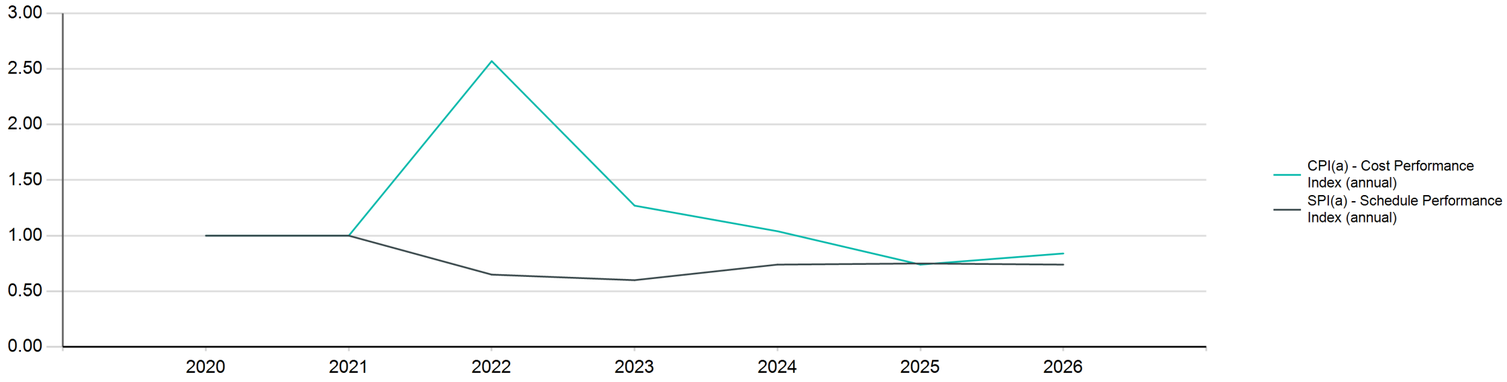
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
CPI(a) - Cost Performance Index (annual)
SPI(a) - Schedule Performance Index (annual)
