PMR Operational Report

Operation Number	CR-J0002	**Chief of Operations Validation Date**	
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2026	**Division Chief Validation Date**	
Last Update	10/01/26	**Country Representative Validation Date**	
PMR Validation Stage	Completed by Team Leader		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Comprehensive Citizen Security and Violence Prevention Program for the Inclusion of Vulnerable Migrant Groups	**Loan Number**	5777/GR-CR
Executing Agency	MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ	**Sector/Subsector**	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Team Leader	POSADAS, ARNALDO ENRIQUE	**Overall Stage**	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Grant Financing Product	**Country**	Costa Rica
Lending Instrument	Investment Loan	**PMR required**	YES
Borrower	REPUBLICA DE COSTA RICA	**Convergence related Operation(s)**	

Events Data

Supervision	
Signature	10/05/23
Ratification	
Legal Effectiveness	10/05/23
Total Eligibility	04/24/24
Partial Eligibility	04/24/24
First Disbursement	05/10/24
Original Disbursement Expiration	04/05/27
Current Disbursement Expiration	04/05/27

Preparation

On pipeline	03/24/21
Start date	
PP Approved	05/17/21
PDD Approved	06/28/23
ERM	04/27/21
DLP Approved by OPC	07/07/23
Negotiation	07/10/23
Operation Approved	08/10/23

Objective

The general development objective of of this operation, as in the associated operation, Citizen Security and Violence Prevention Program (4871/OC-CR), is to contribute to reducing the levels of homicides and assaults in Costa Rica. The specific development objectives of this project is to reduce the vulnerability of the migrant population to violence, marginalization and discrimination

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	**Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?**	NO
Risk	Substantial	**Date of approval**	
Safeguard Performance Rating	Satisfactory		
Safeguard Performance Rating - Rationale	Las obras no han iniciado aún, pero se espera que arranquen en el primer trimestre de 2026. Actualmente el OE cuenta con un especialista socioambiental contratado desde inicios del 2025, quien está actualizando los PGAS y ha iniciado a compartirlos con el Banco..		

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

	Total Cost and Source					Available Funds (US$)			
Operations	**Original IDB**	**Current IDB**	**Local Counterpart**	**Co-Financing / Country**	**Total Original Cost**	**Current IDB**	**Disb. Amount to Date**	**% Disbursed**	**Undisbursed Amount**
CR-J0002	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	7,600,000	38.00%	12,400,000
Aggregated	**20,000,000**	**20,000,000**	**0**	**0**	**20,000,000**	**20,000,000**	**7,600,000**	**38.00%**	**12,400,000**

Development Effectiveness Matrix


Economic Analysis

Undefined	Yes
Cost benefit analysis	No
Cost effectiveness analysis	No
General economic analysis (Economic rate of return)	No

Evaluation

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Undefined	Yes
Random assignment	No
Non-experimental method	No
Ex-post cost benefit analysis	No
Ex-post cost effectiveness analysis	No
Before/after or With/without comparison	No

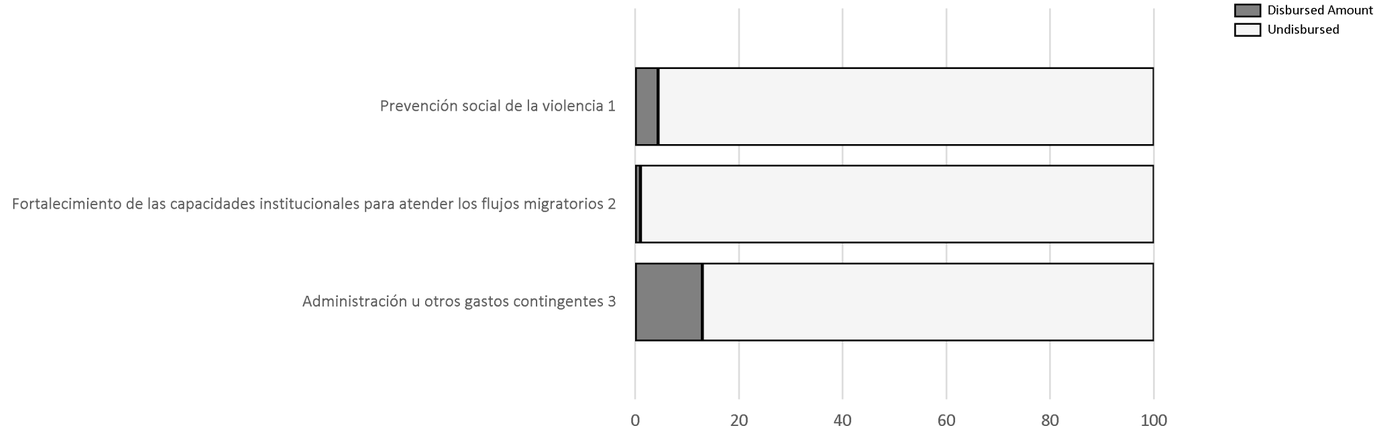

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Reducir los niveles de homicidios y asaltos en Costa Rica

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		EOP 2027
1.0	Tasa promedio de homicidios en distritos priorizados	# por 10.000 habitantes	27.4	2022	2026	P	23.01
						A	-

Details

Means of Verification: Informes de M/E con base en información de Organismo de Investigación Judicial

Observations: Los distritos priorizados son Uruca, Desamparados, Colón, Guayabo, tabarcía, Piedras Negras, Picagres, Jaris y Sixaola http://observatorio.mj.go.cr/recursos/publicaciones

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		EOP 2027
1.3	Tasa promedio de hurtos en distritos priorizados	# por 10.000 habitantes	39.5	2022	2026	P	35.2
						A	-

Details

Means of Verification: Informes de Monitoreo y Evaluación con base en información de Organismo de Investigación Judicial

Observations: Los distritos priorizados son Uruca, Desamparados, Colón, Guayabo, tabarcía, Piedras Negras, Picagres, Jaris y Sixaola http://observatorio.mj.go.cr/recursos/publicaciones

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Contribuir a reducir la vulnerabilidad de la población migrante a la violencia, la marginalidad y la discriminación

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	2025	2026	2027	EOP 2027
1.0	Tiempo promedio entre solicitud y entrevista para el trámite de obtención del status de refugiado	Años	9	2022	P	6	2	1	.5	.5
					A	6	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informes de progreso basados en información de la DGME

Observations: Se espera que la intervención permita descongestionar el sistema de modo que a la DGME pueda ofrecer el servicio en los mismos tiempos en los que lo hacía antes del inicio de la ola migratoria El indicador mide el tiempo promedio (para todas las solicitudes radicadas durante el año calendario) que pasa entre la radicación de los documentos de solicitud y el siguiente paso en el proceso que es la entrevista realizada por los oficiales de la DGME. Es decir, es la sumatoria de tiempos entre la radicación y la entrevista para todas las solicitudes realizadas en el año calendario, sobre el total de solicitudes radicadas en el año calendario

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	2025	2026	2027	EOP 2027
1.1	Porcentaje promedio de reacciones xenófobas a tweets de cuentas migratorias institucionales	%	6.5	2022	P	6.2	5.9	5.7	5.5	5.5
					A	6.2	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Laboratorio de Percepción Ciudadana y Migración del BID

Observations: Como meta se plantea poder llegar a valores cercanos del indicador en el momento de inicio de la ola migratoria. Este indicador es medido por el Banco de manera trimestral y se construye a partir de tomar el total de reacciones xenófobas de los tweets publicados en cuentas migratorias institucionales y dividirlo por el total de reacciones. El valor anual, tomado como indicador, corresponde al promedio de los 4 trimestres de cada año

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	2025	2026	2027	EOP 2027
1.2	Ratio de migrantes que asisten de manera recurrente a los centros de acogida y participan en actividades para la prevención social de la violencia	ratio	1	2022	P	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6
					A	1.1	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informes de progreso basados en información de la MJP

Observations: El indicador mide la ratio de migrantes que asisten en el año al menos durante tres semanas consecutivas a las actividades de prevención social de la violencia Al momento de la construcción de la matriz, se cuenta con información solo para la población que asiste al centro de La Carpio, que asciende a 600 personas. Será actualizada incluyendo la información de los demás centros para el momento del taller de arranque

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2024	2025	2026	2027	EOP 2027
1.3	Porcentaje de solicitudes de protección especial complementaria que son resueltas en un plazo menor a un año	%	0	2022	P	-	35	42	95	95
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informes de progreso basados en información de la DGME

Observations: Se espera que el proyecto fortalezca la capacidad operativa de la DGME y que eso redunde en menores tiempos de resolución de solicitudes. Como meta se espera lograr que el 95% de las solicitudes sean resueltas en menos de un año La fórmula para estimar el valor del indicador es: número de solicitudes radicadas en el año calendario que son resueltas en un plazo menor a un año, dividido entre el total de solicitudes radicadas en el mismo año calendario

Evaluation Methodology: -

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution									

RESULTS MATRIX

OUTPUTS PHYSICAL PROGRESS

Component Nbr. 1: Prevención social de la violencia

	Output	Unit of Measure		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
1.1	Campaña de comunicación contra la xenofobia realizada	Número	P	0	0	1	0	-	1
			P (a)	0	0	0	0	1	1
			A	0	0	0	0	-	0

Details

Means of Verification: Reportes de monitoreo de la UCP

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
1.2	Festivales en las áreas de influencia de los CCP realizados	Número	P	0	0	4	3	-	7
			P (a)	0	0	0	0	0	0
			A	0	0	0	-	-	0

Details

Means of Verification: Reportes de monitoreo de la UCP

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
1.2	Programas de formación para la prevención de la trata de personas y tráfico ilegal de migrantes ejecutados	Número	P	0	0	4	8	-	12
			P (a)	0	0	4	6	0	16
			A	0	0	10	6	-	16

Details

Means of Verification: Reportes de monitoreo de la UCP

Gender-related	Yes	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
1.3	Remodelación Casa de Derechos Humanos “Centro de Formación y Capacitación para personas migrantes” de Desamparados realizada.	Número	P	0	0	1	0	-	1
			P (a)	0	0	0	0	0	0
			A	0	0	0	-	-	0

Details

Means of Verification: Reportes de monitoreo de la UCP

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
1.3	Centro de inclusión Social de Mora construido.	Número	P	0	0	1	0	-	1

Centro de inclusión Social de Mora construido.	Número	P (a)	0	0	0	0	1	1
		A	0	0	0	0	-	0

Details

Means of Verification: Reportes de monitoreo de la UCP

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

	Output	**Unit of Measure**		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
1.4	Procesos formativos para el fortalecimiento de los Centros Cívicos por la Paz y Casas de Justicia	Número	P	-	-	-	-	-	0
			P (a)	-	-	9	16	0	33
			A	-	-	17	0	-	17

Details

Means of Verification:

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

	Output	**Unit of Measure**		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
1.5	Torre Klabë de Sifais construída	Número	P	0	0	1	0	-	1
			P (a)	0	0	0	0	0	0
			A	0	0	0	-	-	0

Details

Means of Verification: Reportes de monitoreo de la UCP

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
1.5	Adquisición de vehículos para facilitar la movilización de Centros Cívicos por la Paz y Casas de Justicia	Número	P	-	-	-	-	-	0
			P (a)	-	-	0	0	32	32
			A	-	-	0	0	-	0

Details

Means of Verification:

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
1.6	Centro comunitario Multicultural Sixaola construido	Número	P	0	0	1	0	-	1
			P (a)	0	0	0	0	0	0
			A	0	0	0	-	-	0
	Centro transitorio para mujeres Casa Paz construida.	Número	P	0	0	1	0	-	1
			P (a)	0	0	0	0	0	0

Centro transitorio para mujeres Casa Paz construida.	Número	A	0	0	0	-	-	0

Details

Means of Verification: Reportes de monitoreo de la UCP

Gender-related	Yes	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
1.6	Centro Cívico de Upala construido, equipado y en funcionamiento	Número	P	-	-	-	-	-	0
			P (a)	-	-	0	0	1	1
			A	0	0	0	0	-	0

Details

Means of Verification:

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

Component Nbr. 2: Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios

	Output	Unit of Measure		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
2.1	Herramienta digital “Ventanilla única para personas migrantes” elaborada	Número	P	0	0	1	0	-	1
			P (a)	0	0	0	0	0	0
			A	0	0	0	-	-	0

Details

Means of Verification: Reportes de monitoreo de la UCP

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
2.1	Unidad de refugio construida, equipada y en funcionamiento	Número	P	0	0	1	0	-	1
			P (a)	0	0	0	0	1	1
			A	0	0	0	0	-	0

Details

Means of Verification: Reportes de monitoreo de la UCP

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
2.2	Actualización de plataforma tecnológica de la DGME	Número	P	0	0	1	0	-	1
			P (a)	0	0	0	0	1	1
			A	0	0	0	0	-	0

Details

Means of Verification: Reportes de monitoreo de la UCP

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
2.3	Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes	Número	P	0	0	90,000	100,000	10,000	200,000
			P (a)	0	0	10,000	60,000	139,059	200,000
			A	0	0	941	27,149	-	28,090

Details

Means of Verification: Reportes de monitoreo de la UCP

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
2.4	Ampliación de Centro de atención temporal para personas migrantes construido y equipado (CATEM Sur)	Número	P	0	0	1	0	-	1
			P (a)	0	0	0	0	1	1
			A	0	0	0	0	-	0

Details

Means of Verification: Reportes de monitoreo de la UCP

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF Contribution					**Strategic Alignment**				

OUTPUTS FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1: Prevención social de la violencia

Component revised cost: 8,970,000

	Output	Unit of Measure		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
1.1	Campaña de comunicación contra la xenofobia realizada	Número	P	0	0	26,216	0	0	26,216
			P (a)	0	0	180,000	-	300,000	300,000
			A	0	0	0	0	-	0

Details

Means of Verification: Reportes de monitoreo de la UCP

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator				**Strategic Alignment**					

	Output	Unit of Measure		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
1.2	Festivales en las áreas de influencia de los CCP realizados	Número	P	0	0	670,251.42	502,689	0	1,172,940.42
			P (a)	0	0	0	0	0	0
			A	0	0	0	-	-	0

Details

Means of Verification: Reportes de monitoreo de la UCP

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator				**Strategic Alignment**					

	Output	Unit of Measure		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
1.2	Programas de formación para la prevención de la trata de personas y tráfico ilegal de migrantes ejecutados	Número	P	0	0	75,000	151,000	0	226,000
			P (a)	0	0	226,000	93,714.6	16,390.5	135,000
			A	0	0	24,894.9	28,914.6	-	53,809.5

Details

Means of Verification: Reportes de monitoreo de la UCP

Gender-related	Yes	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
1.3	Remodelación Casa de Derechos Humanos “Centro de Formación y Capacitación para personas migrantes” de Desamparados realizada.	Número	P	0	0	591,555	0	0	591,555
			P (a)	0	0	0	0	0	0
			A	0	0	0	-	-	0

Details

Means of Verification: Reportes de monitoreo de la UCP

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
1.3	Centro de inclusión Social de Mora construido.	Número	P	0	0	2,188,810	0	0	2,188,810
			P (a)	0	0	64,322.5	2,500	2,542,988.14	2,550,000
			A	0	0	4,511.86	0	-	4,511.86

Details

Means of Verification: Reportes de monitoreo de la UCP

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
1.4	Procesos formativos para el fortalecimiento de los Centros Cívicos por la Paz y Casas de Justicia	Número	P	-	-	-	-	-	0
			P (a)	-	-	323,852	347,372	112,626	712,600
			A	-	-	252,602	203,444.83	-	456,046.83

Details

Means of Verification:

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
1.5	Torre Klabë de Sifais construída	Número	P	0	0	2,313,110	0	0	2,313,110
			P (a)	0	0	0	0	0	0
			A	0	0	0	-	-	0

Details

Means of Verification: Reportes de monitoreo de la UCP

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

1.5

Output	Unit of Measure		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
Adquisición de vehículos para facilitar la movilización de Centros Cívicos por la Paz y Casas de Justicia	Número	P	-	-	-	-	-	0
		P (a)	-	-	7,000	2,500	2,019,350	2,022,400
		A	-	-	550	0	-	550

Details

Means of Verification:

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**			

1.6

Output	Unit of Measure		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
Centro comunitario Multicultural Sixaola construido	Número	P	0	0	619,805	0	0	619,805
		P (a)	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	-	-	0
Centro transitorio para mujeres Casa Paz construida.	Número	P	0	0	1,832,860	0	0	1,832,860
		P (a)	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	-	-	0

Details

Means of Verification: Reportes de monitoreo de la UCP

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**			

	Output	Unit of Measure		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
1.6	Centro Cívico de Upala construido, equipado y en funcionamiento	Número	P	-	-	-	-	-	0
			P (a)	-	-	919,322.5	1,767,098.31	1,386,688.27	3,250,000
			A	-	-	96,213.42	48,752.17	-	144,965.59

Details

Means of Verification:

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

Component Nbr. 2: Fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios

Component revised cost: 10,210,000

	Output	Unit of Measure		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
2.1	Herramienta digital “Ventanilla única para personas migrantes” elaborada	Número	P	0	0	565,000	0	0	565,000
			P (a)	0	0	0	0	0	0
			A	0	0	0	-	-	0

Details

Means of Verification: Reportes de monitoreo de la UCP

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
2.1	Unidad de refugio construida, equipada y en funcionamiento	Número	P	0	0	2,260,000	0	0	2,260,000
			P (a)	0	0	572,498.5	651,814.06	2,758,465.94	3,416,700

	Unidad de refugio construida, equipada y en funcionamiento	Número	A	0	0	6,420	4,800	-	11,220

Details

Means of Verification: Reportes de monitoreo de la UCP

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
2.2	Actualización de plataforma tecnológica de la DGME	Número	P	0	0	1,354,746	0	0	1,354,746
			P (a)	0	0	15,000	33,000	1,282,000	1,315,000
			A	0	0	0	6,443.73	-	6,443.73

Details

Means of Verification: Reportes de monitoreo de la UCP

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
2.3	Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes	Número	P	0	0	653,840	1,458,930	243,280	2,356,050
			P (a)	0	0	123,500	1,567,950.83	1,322,324.17	2,965,000
			A	0	0	74,725	439,878.34	-	514,603.34

Details

Means of Verification: Reportes de monitoreo de la UCP

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

	Output	Unit of Measure		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2027
2.4	Ampliación de Centro de atención temporal para personas migrantes construido y equipado (CATEM Sur)	Número	P	0	0	3,670,268	0	0	3,670,268
			P (a)	0	0	427,538.5	259,245.42	2,232,638.47	2,513,300
			A	0	0	21,416.11	600	-	22,016.11

Details

Means of Verification: Reportes de monitoreo de la UCP

Gender-related	No	**Indigenous people-related**	No	**Afrodescendats-related**	No	**Persons with disabilities-related**	No	**LGBTQ+ individuals-related**	No
IF indicator					**Strategic Alignment**				

Other Costs

		2023	2024	2025	2026	2027	Cost
Administración del Proyecto	P	-	-	179,055.58	134,292	134,292	447,639.58
	P (a)	-	-	136,500	234,900	84,199.67	430,000
	A	-	5,000	105,900.33	77,725	-	188,625.33
Monitoreo y Evaluación	P	-	-	100,000	100,000	100,000	300,000
	P (a)	-	-	38,000	85,500	234,500	320,000
	A	-	-	-	27,500	-	27,500
Auditorías	P	-	-	25,000	-	50,000	75,000
	P (a)	-	-	-	6,000	64,000	70,000
	A	-	-	-	6,000	-	6,000

Total Costs

		2023	2024	2025	2026	2027	Cost
Total Cost	P	-	-	17,125,517	2,346,911	527,572	20,000,000
	P (a)	-	-	3,033,534	5,051,595.22	14,356,171.16	20,000,000
	A	-	5,000	587,233.62	844,058.67	-	1,436,292.29

CORPORATE INDICATORS

IF INDICATORS

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Categories	EOP 2027
1	2.10 Agencies and private sector organizations with strengthened digital capacity	# of agencies	0	2022	P	2
					P (a)	2
					A	-

Details

Means of Verification: Reportes de monitoreo de la UCP

Observations: Este indicador se relaciona con el producto Actualización de plataforma tecnológica de la DGME. Su reporte se relacionará con las instituciones que utilizarán la plataforma para atender a las personas migrantes.

Change Matrix

Section	Name	Reasons	Related Documents	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System	Agreed with Execution Agency
Output	Campaña de comunicación contra la xenofobia realizada	Se ajustan los valores financieros de P(a) para que coincidan con los valores del plan de adquisiciones y que el monto total de la operación sume el monto total de la operación.	N/A	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ALVAROBO	9/24/2026	

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Status of the Implementation

Al 30 de junio de 2026 la ejecución financiera es de USD $1.436.292,34 de los USD $7.600.000,00 desembolsados (18,9%). Componente 1: 1.1. Campaña contra la xenofobia: se elaboró el alcance técnico; se espera la designación de enlaces del MJP para la Comisión de Adquisiciones. 1.2. Programas de formación en prevención de la trata y tráfico de migrantes: en 2026 se ejecutaron 6 programas adicionales a los 10 de 2025, cumpliendo la meta de 16; 277 personas aprobaron el curso. 1.3. Centro de Inclusión Social de Mora: no se desarrollará con recursos del Programa; se prevé que el Comité de Dirección acuerde reasignar el monto a otros productos, sujeto a aprobación del Banco. 1.4. Procesos formativos de los Centros Cívicos por la Paz y Casas de Justicia: a los 17 procesos de 2025 se suman 20 procesos nuevos activados en 2026 en comunidades de la Zona Norte, Los Santos y la GAM. 1.5. Adquisición de vehículos: se mantiene la compra de 16 pick-up y 16 busetas; se gestionan en el presupuesto 2027 del MJP las plazas de choferes y el mantenimiento. 1.6. Centro Cívico de Upala: la fase de diseño inició el 24 de febrero de 2026; el diseño final está en revisión y ajustes. Componente 2: 2.1. Unidad de refugio: se encuentra actualmente en diseño. 2.2. Actualización de plataforma tecnológica de la DGME: el 25 de mayo de 2026 inició la consultoría de diagnóstico de la plataforma; se prevé el informe final en agosto para iniciar la contratación del producto. 2.3. Procesos de regularización: al 30 de junio de 2026 suman 28.090 solicitudes de refugio resueltas y 2.710 personas regularizadas; la categoría especial migratoria se activará en septiembre de 2026. 2.4. Mejoras en el CATEM EMBI SUR: no se desarrollará con recursos del Programa; el monto se reasignará a otros productos, sujeto a aprobación del Banco.

Likelihood of Achieving Development Objectives

Low	De acuerdo con el avance actual de los proyectos y considerando las dificultades enfrentadas en la ejecución derivadas de la ausencia de un marco legal que facilite la incorporación de este tipo de donaciones en el Presupuesto de la República, se estima que existe una baja probabilidad de alcanzar los objetivos de la operación si no se gestiona una prórroga.

Lesson Learned

Category	Lesson Learned	Entered in System

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
1	Active	Si las ofertas de construcción y obra son superiores a lo estimado, podría suceder que el presupuesto establecido no sea suficiente, provocando un impacto en las obras por construir.	3 - Medium High	2 - Medium Low	Medium High	Macroeconomic environment

Details

Associated Outputs	- Centro Cívico de Upala construido, equipado y en funcionamiento	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Cost - Time - Scope - Quality
Associated Outcomes	- Contribuir a reducir la vulnerabilidad de la población migrante a la violencia, la marginalidad y la discriminación	**Responsible**	Organismo Ejecutor	**Probability Factors**	La apertura de ofertas económicas de los procesos de adquisición de obras de la operación CR-L1137 ha revelado cotizaciones que superan el presupuesto estimado durante el diseño.
Description of Impact	Se reduciría el alcance de los productos a financiar y el plazo para concluir las obras debido al replanteamiento de algunos procesos por la necesidad de ejecutar en conjunto con el Organismo Ejecutor, la disminución del alcance de las obras manteniendo la oferta programática inicialmente planteada.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	Adecuar el alcance de las obras para garantizar la ejecución de los productos	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	Durante la apertura de las ofertas	**Budget**	0	**Responsible**	UCP
Completion Date	9/24/2026	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status	
2	Negociar con el oferente que haya presentado la oferta más ventajosa para tratar de obtener un contrato satisfactorio mediante una reducción del alcance del contrato, la reasignación del riesgo y la responsabilidad	SHARE	ACTIVE	

Details

Estimated Completion Date	Durante la apertura de las ofertas	**Budget**	0	**Responsible**	UCP
Completion Date	3/31/2027	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
2	Inactive	Si la unidad coordinadora estuviera ejecutando varias obras simultáneamente en distintas localidades, la supervisión y gestión oportuna de cada contrato puede verse afectada.	1 - Low	1 - Low	Low	Scope and planning

Details

Associated Outputs	- Ampliación de Centro de atención temporal para personas migrantes construido y equipado (CATEM Sur) - Centro comunitario Multicultural Sixaola construido - Centro de inclusión Social de Mora construido. - Centro transitorio para mujeres Casa Paz construida. - Torre Klabë de Sifais construída - Unidad de refugio construida, equipada y en funcionamiento	**Source of Risk**	Project	**Type of Impact**	- Scope - Quality - Cost - Time
Associated Outcomes	- Contribuir a reducir la vulnerabilidad de la población migrante a la violencia, la marginalidad y la discriminación	**Responsible**	Organismo Ejecutor	**Probability Factors**	Los procesos de contratación de obra de la operación 1137 han reflejado la necesidad por fortalecer el equipo de la UCP con personal que ejecute labores en supervisión.
Description of Impact	Se podría enfrentar atrasos por la incapacidad que tiene el OE en ejecutar más de una obra simultáneamente, siendo necesario establecer ajustes financieros para contratar más personas que asuman la supervisión de obras en sitio.				

Response Actions

0

Response Description	Management Strategy	Status	
-	-	-	

Details

Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	-
Completion Date		**Funding Source**	-	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
3	Active	Si los recursos dedicados al mantenimiento son insuficientes, la vida útil de las obras contempladas en el Programa puede verse limitada.	2 - Medium Low	2 - Medium Low	Medium Low	Operation and maintenance capacity

Details

Associated Outputs	- Centro Cívico de Upala construido, equipado y en funcionamiento - Unidad de refugio construida, equipada y en funcionamiento	**Source of Risk**	Institutional capacity	**Type of Impact**	- Cost - Quality
Associated Outcomes	- Contribuir a reducir la vulnerabilidad de la población migrante a la violencia, la marginalidad y la discriminación	**Responsible**	Dirección General de Migración y Extranjería	**Probability Factors**	La inflación ha generado un incremento de los costos en general que pueden afectar las proyecciones sobre los montos requeridos para el mantenimiento de obras y equipos.
Description of Impact	Se podría poner en riesgo la sostenibilidad del proyecto y sus resultados.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status	
1	Convenio específico suscrito para el CCP de Upala, que regula la gestión y mantenimiento de las instalaciones	TRANSFER	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	finalizacion de las obras	**Budget**	0	**Responsible**	UCP y Municipalidad
Completion Date		**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status	
2	Oficio DG-1282-10-2025, mediante el cual la Dirección General de Migración y Extranjería asume los costos de mantenimiento de la Unidad de Refugio	TRANSFER	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	finalizacion de las obras	**Budget**	0	**Responsible**	UCP y DGME
Completion Date	9/25/2026	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

	Response Description	Management Strategy	Status	
3	Acuerdo adoptado por el Comité de Dirección del Programa mediante Acta 001-2026, relativo a los mecanismos institucionales para la sostenibilidad de las obras y equipos financiados	MITIGATE	COMPLETE	

Details

Estimated Completion Date	finalizacion de las obras	**Budget**	0	**Responsible**	UCP, DGME y Municipalidades
Completion Date	9/25/2026	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
4	Inactive	Si el límite de gasto que impone la "Regla fiscal", es superado en cada año de ejecución del proyecto, se podría generar la suspensión de los pagos requeridos por el Programa, afectando el cronograma previsto en la operación	2 - Medium Low	2 - Medium Low	Medium Low	Macroeconomic environment

Details

Associated Outputs	- Actualización de plataforma tecnológica de la DGME - Ampliación de Centro de atención temporal para personas migrantes construido y equipado (CATEM Sur) - Campaña de comunicación contra la xenofobia realizada - Centro comunitario Multicultural Sixaola construido - Centro de inclusión Social de Mora construido. - Centro transitorio para mujeres Casa Paz construida. - Festivales en las áreas de influencia de los CCP realizados - Herramienta digital "Ventanilla única para personas migrantes" elaborada - Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes - Programas de formación para la prevención de la trata de personas y tráfico ilegal de migrantes ejecutados - Remodelación Casa de Derechos Humanos "Centro de Formación y Capacitación para personas migrantes" de Desamparados realizada. - Torre Klabë de Sifais construída - Unidad de refugio construida, equipada y en funcionamiento	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Quality - Scope
Associated Outcomes	- Contribuir a reducir la vulnerabilidad de la población migrante a la violencia, la marginalidad y la discriminación	**Responsible**	Organismo Ejecutor	**Probability Factors**	La regla fiscal es una condición que el OE debe tomar en cuenta en cada solicitud de desembolso y proyección de gastos.
Description of Impact	Se reduciría la capacidad del ejecutor en cumplir con la programación de productos establecida anualmente.				

Response Actions

	Response Description	Management Strategy	Status
0	-	-	-

Details

Estimated Completion Date	-	**Budget**	0	**Responsible**	-
Completion Date		**Funding Source**	-	**Status Description**	-

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy
5	Active	Si los pagos necesarios para ejecutar los productos no se pueden incorporar en el ciclo presupuestario oportunamente, se podrían generar ventanas de inactividad para la operación, generando riesgos a nivel operativo, legal y financiero	4 - High	4 - High	High	Legislation and regulation

Details

Associated Outputs	- Actualización de plataforma tecnológica de la DGME - Adquisición de vehículos para facilitar la movilización de Centros Cívicos por la Paz y Casas de Justicia - Campaña de comunicación contra la xenofobia realizada - Centro Cívico de Upala construido, equipado y en funcionamiento - Procesos de regularización realizados como parte del apoyo al mecanismo de regularización de personas migrantes - Procesos formativos para el fortalecimiento de los Centros Cívicos por la Paz y Casas de Justicia - Unidad de refugio construida, equipada y en funcionamiento	**Source of Risk**	Execution context	**Type of Impact**	- Cost - Scope - Time
Associated Outcomes	- Contribuir a reducir la vulnerabilidad de la población migrante a la violencia, la marginalidad y la discriminación	**Responsible**	UCP	**Probability Factors**	Se han generado reuniones con las autoridades del MH, donde se ha externado la necesidad por incorporar los gastos de la dinación en el ciclo presupuestario, sin tener una opción más eficiente para asegurar la disponibilidad de los recursos.
Description of Impact	El OE podría enfrentarse a una baja disponibilidad de recursos financieros, ocasionándo el atraso en sus procesos de adquisiciones y el cumplimiento de los productos programados anualmente.				

Response Actions

	1	**Response Description**		**Management Strategy**		**Status**	
		Establecer un mecanismo para la presupuestación de los fondos del año 2026 realizando un desembolso anticipado que cubra los gastos de todo el año de ejecución y permitiendo que así se incorporen dichos fondos en el presupuesto.		MITIGATE		COMPLETE	
		Details					
		Estimated Completion Date	Ciclo presupuestario nacional	**Budget**	0	**Responsible**	UCP
		Completion Date	11/1/2025	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-
	2	**Response Description**		**Management Strategy**		**Status**	
		Establecer un mecanismo para la presupuestación de los fondos del año 2026 realizando un desembolso anticipado que cubra los gastos de todo el año de ejecución y permitiendo que así se incorporen dichos fondos en el presupuesto.		SHARE		COMPLETE	
		Details					
		Estimated Completion Date	Ciclo presupuestario nacional	**Budget**	0	**Responsible**	UCP
		Completion Date	11/1/2025	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-
5	3	**Response Description**		**Management Strategy**		**Status**	
		presentar un proyecto de Ley para modificar la Ley 9968 relacionada al Contrato de Préstamo 4871/OC-CR con el fin de incorporar el Convenio de Financiamiento No Reembolsable 5777/GR-CR en dicha Ley y que se permita la incoporación de la totalidad del monto del Programa, así como la revalidación automática de los saldos no ejecutados		AVOID		ACTIVE	
		Details					
		Estimated Completion Date	cierre del periodo presupuestario	**Budget**	0	**Responsible**	Ministerio de la Presidencia y Asamblea Legislativa
		Completion Date	12/31/2026	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-
	4	**Response Description**		**Management Strategy**		**Status**	
		Establecer un adecuado flujo de caja que permita identificar los pagos que se deberán cumplir mensualmente, alineado a la estrategia de adquisiciones y planificación.		MITIGATE		COMPLETE	
		Details					
		Estimated Completion Date	Previo a cada proceso de adquisición	**Budget**	0	**Responsible**	UCP
		Completion Date	9/12/2025	**Funding Source**	N/A	**Status Description**	-

MATERIALIZED RISKS

EVALUATION TRACKING

Evaluación intermedia

Evaluation

Evaluation Methodology as per DEM:	N/A
Current Evaluation Methodology:	Operational
Stage:	Pre-Intervention & Mid-Intervention Data and Analysis
Main Topic of the Intervention:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE
Other Topics of the Intervention:	SOCIAL PROTECTION AND SOCIAL INVESTMENT
Main Topic of the Evaluation:	SOCIAL PROTECTION AND SOCIAL INVESTMENT
Other Topics of the Evaluation:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE

Definida en el convenio.

Status of the evaluation:	Active
Expected Date of Final Evaluation Report:	8/10/2025
Responsible:	External
Information on Responsible:	Jefe de Equipo y OE

Funding

Source of funding:	
Amount in USD (Thousands):	
Code:	
Total amount in USD (Thousands) spent to date in data collection:	0

Comments

9/25/2024	
AARAYAUMANA	

Documents

Stage	Type of document	Name	Document Description	Document Date	Document Number	Document Permissions	Document User

Evaluación Final

Evaluation

Evaluation Methodology as per DEM:	N/A
Current Evaluation Methodology:	Other
Stage:	Concluded
Main Topic of the Intervention:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE
Other Topics of the Intervention:	SOCIAL PROTECTION AND SOCIAL INVESTMENT
Main Topic of the Evaluation:	SOCIAL PROTECTION AND SOCIAL INVESTMENT
Other Topics of the Evaluation:	

Definida en el convenio

Status of the evaluation:	Active
Expected Date of Final Evaluation Report:	8/10/2027
Responsible:	Project Team & External
Information on Responsible:	OE

Funding

Source of funding:	
Amount in USD (Thousands):	
Code:	
Total amount in USD (Thousands) spent to date in data collection:	0

Comments

9/25/2024	
AARAYAUMANA	

Documents

Stage	Type of document	Name	Document Description	Document Date	Document Number	Document Permissions	Document User

Validation Process


Date	User	Role	Action	Comment	Classification	Workflow
10/01/2026	AMSaiz	Team Leader	Completed by Team Leader		Alert	Progress Monitoring Report September Validation Workflow

MONITORING INDICATORS

Stage 2: After Eligibility


		Benchmark Indicator Value			
Indicator (I)	**Project Indicator Value**	**Satisfactory**	**Alert**	**Problem**	**Traffic Light**
Synthetic Indicator (SI)	2.10	2.5 <= I	2<=I<2.5	I<2	ALERT
Accumulated disbursements to country's historic disbursements	0.38	1 >= I > 0.12	0.12 >= I >=0.05	0.05 > I >= 0	SATISFACTORY
Cost Performance Index - CPI	1.00	0.80 <= I <= 2.00	0.40 <= I < 0.80	0.00 <= I < 0.40	SATISFACTORY
Cost Performance Index (annual - CPI(a)	1.13	0.80 <= I <= 2.00	0.40 <= I < 0.80	0.00 <= I < 0.40	SATISFACTORY
Schedule Performance Index - SPI	0.06	0.80 <= I <= 2.00	0.40 <= I < 0.80	0.00 <= I < 0.40	PROBLEM
Schedule Performance Index (annual)- SPI(a)	0.26	0.80 <= I <= 2.00	0.40 <= I < 0.80	0.00 <= I < 0.40	PROBLEM
Expected additional execution duration (months)	524.89	N/A	N/A	N/A	For tracking purpose only
Environmental and social safeguards performance rating	Satisfactory	N/A	N/A	N/A	For tracking purpose only

Accumulated disbursements as proportion of the total amount

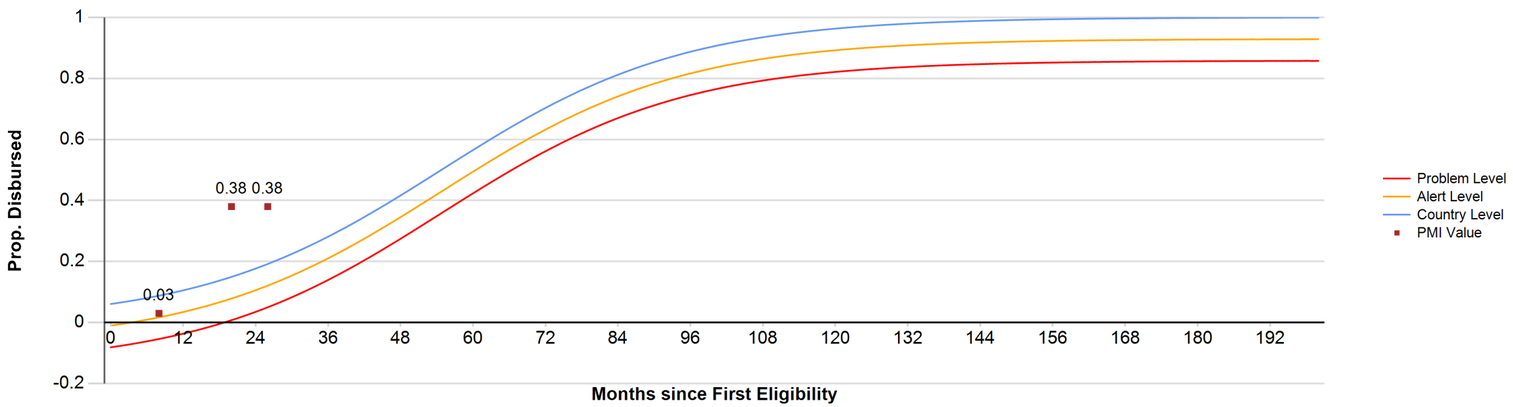

PV, AC, EV, PV(a), EV(a)

	2023	2024	2025	2026
PV	0.00	0.00	16,821,461.42	18,934,080.42
AC	0.00	0.00	481,333.29	1,214,166.96
EV	0.00	0.00	543,701.68	1,215,252.12
PV(a)	0.00	0.00	2,859,034.00	5,386,528.51
EV(a)	0.00	0.00	1,317,453.18	1,374,565.41

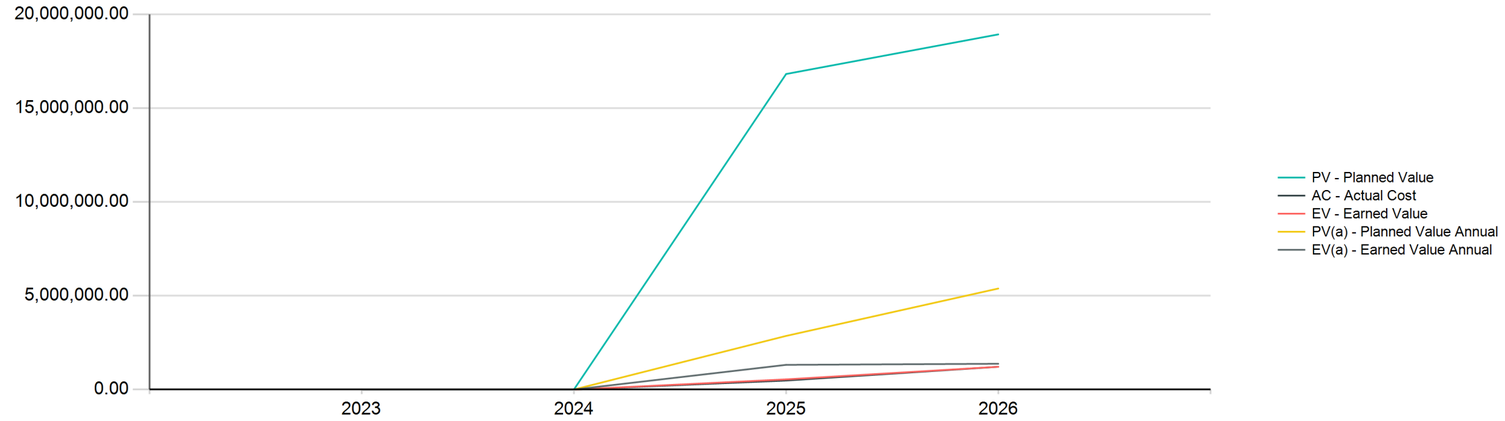

	2023	2024	2025	2026
CPI	1.00	1.00	1.13	1.00
CPI(a)	1.00	1.00	2.74	1.13
SPI	1.00	1.00	0.03	0.06
SPI(a)	1.00	1.00	0.46	0.26

